



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศบค.นทว.๐๔/๒๐๕/๒๕๖๕**

วันที่ **๑๘** พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๓,๙๗๓,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๕ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๐,๗๐๓,๗๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๔๗๐,๐๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๗๙๙,๙๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๔ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.


ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)




เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564



เงินกู้ยืมปี 2564



รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)									
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อัตราจ้าง	ประเภท	เปิดซอง	อนุมัติ	ทำสัญญา	ทำสัญญา	ทำสัญญา	ทำสัญญา
ส่วนบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	0	0	1	0	3	201		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0	10		
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	0	24		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0	5		
ส่วนควบคุมและป้องกัน	8	0	0	0	0	0	8		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41	0	0	0	0	0	41		
ส่วนประมงและประมงน้ำจืด	40	0	0	1	0	2	36		
คอมพิวเตอร์	13	0	0	0	0	0	13		
คอมพิวเตอร์	10	0	0	0	0	1	9		
คอมพิวเตอร์	7	0	0	0	0	0	7		
คอมพิวเตอร์	6	0	0	0	0	0	6		
คอมพิวเตอร์	13	0	0	0	0	0	13		
คอมพิวเตอร์	9	0	0	0	0	0	9		
คอมพิวเตอร์	12	0	0	0	0	0	11		
คอมพิวเตอร์	8	0	0	0	0	0	8		

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลผลและสารสนเทศน้ำ ยกเลิก 1 รายการ
2. คอมพิวเตอร์แบบ ยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	32,308,976	0	32,308,976	0	0	0	263,649	799,976	0	2.46
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	3,715,069	249,000	47.56
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	208,648,283	146,579,576	62,068,707	7	238,521,300	238,521,300	0	45,350,204	35,207,985	10.03
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,803,280	10,174,600	59,628,680	0	0	0	0	11,539,767	2,635,000	16.49
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	3,861,537	0	41.97
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	122,329,524	116,524,924	5,804,600	0	0	0	0	40,521,045	37,594,580	31.29
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	0	10,343,819	467,622	65.81
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	10,637,711	0	60.18
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	9,843,502	0	66.57
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	8,259,156	1,123,500	56.53
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเชิงพื้นที่ตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	8,434,135	0	50.31
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	8,942,267	0	64.86
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	6,737,470	0	59.31
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	5,046,712	0	50.63
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9,430,819	0	53.66
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	510,562	0	51.06
รวมทั้งสิ้น	307	834,311,136	580,368,672	277,206,009	303,162,663	9	238,953,800	238,953,800	263,649	183,973,750	77,277,686	22.05

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน.พจน.2565

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

5. เบิกจ่ายร้อยละ แปดสิบแปด (86%) ของเงินที่ขออนุมัติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.9 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากะประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
สำนักชลประทาน	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	510,562	0	510,562	51.06
	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,466,069	0	3,466,069	45.83
	40	406,161,700	37	162,802,313	100,733,606	62,068,707	7	238,521,300	238,521,300	0	33	13,974,719	3,832,500	10,142,219	3.40
	24	66,951,000	24	66,773,280	7,144,600	59,628,680	0	0	0	0	17	9,894,767	990,000	8,904,767	14.78
	5	9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	3,861,537	0	3,861,537	41.97
	8	77,847,400	8	70,667,317	64,862,717	5,804,600	0	0	0	0	8	12,655,872	9,729,407	2,926,465	16.26
	41	15,504,800	41	15,072,300	356,000	14,716,300	2	432,500	432,500	0	41	10,131,959	255,762	9,876,197	63.35
	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	11	10,637,711	0	10,637,711	60.18
	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	9,843,502	0	9,843,502	66.57
	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	7,135,656	0	7,135,656	52.91
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	13	8,434,135	0	8,434,135	50.31
	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	8,942,267	0	8,942,267	64.86
	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	6,737,470	0	6,737,470	59.31
	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	5,046,712	0	5,046,712	50.63
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9	9,430,819	0	9,430,819	53.66
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	203	445,937,160	175,083,473	270,853,687	9	238,953,800	238,953,800	0	190	120,703,757	14,807,669	105,896,088	17.25

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สบป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สบป.9 (โครงการสร้างและบำรุงรักษาประตูน้ำ) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมด้าน ส่งเสริมการเกษตร - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รายการงบประมาณ : เงินก้อนเลื่อนปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	ทำเอง	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970		0	0	0	0	31,375,485	31,375,485	0	68.44
ศูนย์อุทกวิทยาและกักตุนน้ำ	1	1,123,500	1,123,500		0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนควบคุมและป้องกันน้ำท่วม	3	51,662,207	51,662,207		0	0	0	0	27,865,172	27,865,172	0	53.94
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000		0	0	0	0	1,645,000	1,645,000	0	54.29
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860		0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000		0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	62,470,017	62,470,017	0	61.17

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน		จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900		65	31,228,976	0	31,228,976	0	0	0	0	799,976	2.54
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900		65	0	0	31,228,976	0	0	0	0	799,976	2.54


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน		จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000		2	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000		2	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	23,136,300	23,136,300	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	23,136,300	23,136,300	0
1	(52) คอมพิวเตอร์ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักเกาะระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2565) สำหรับบริหารจัดการ^๙และหอศึกษา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

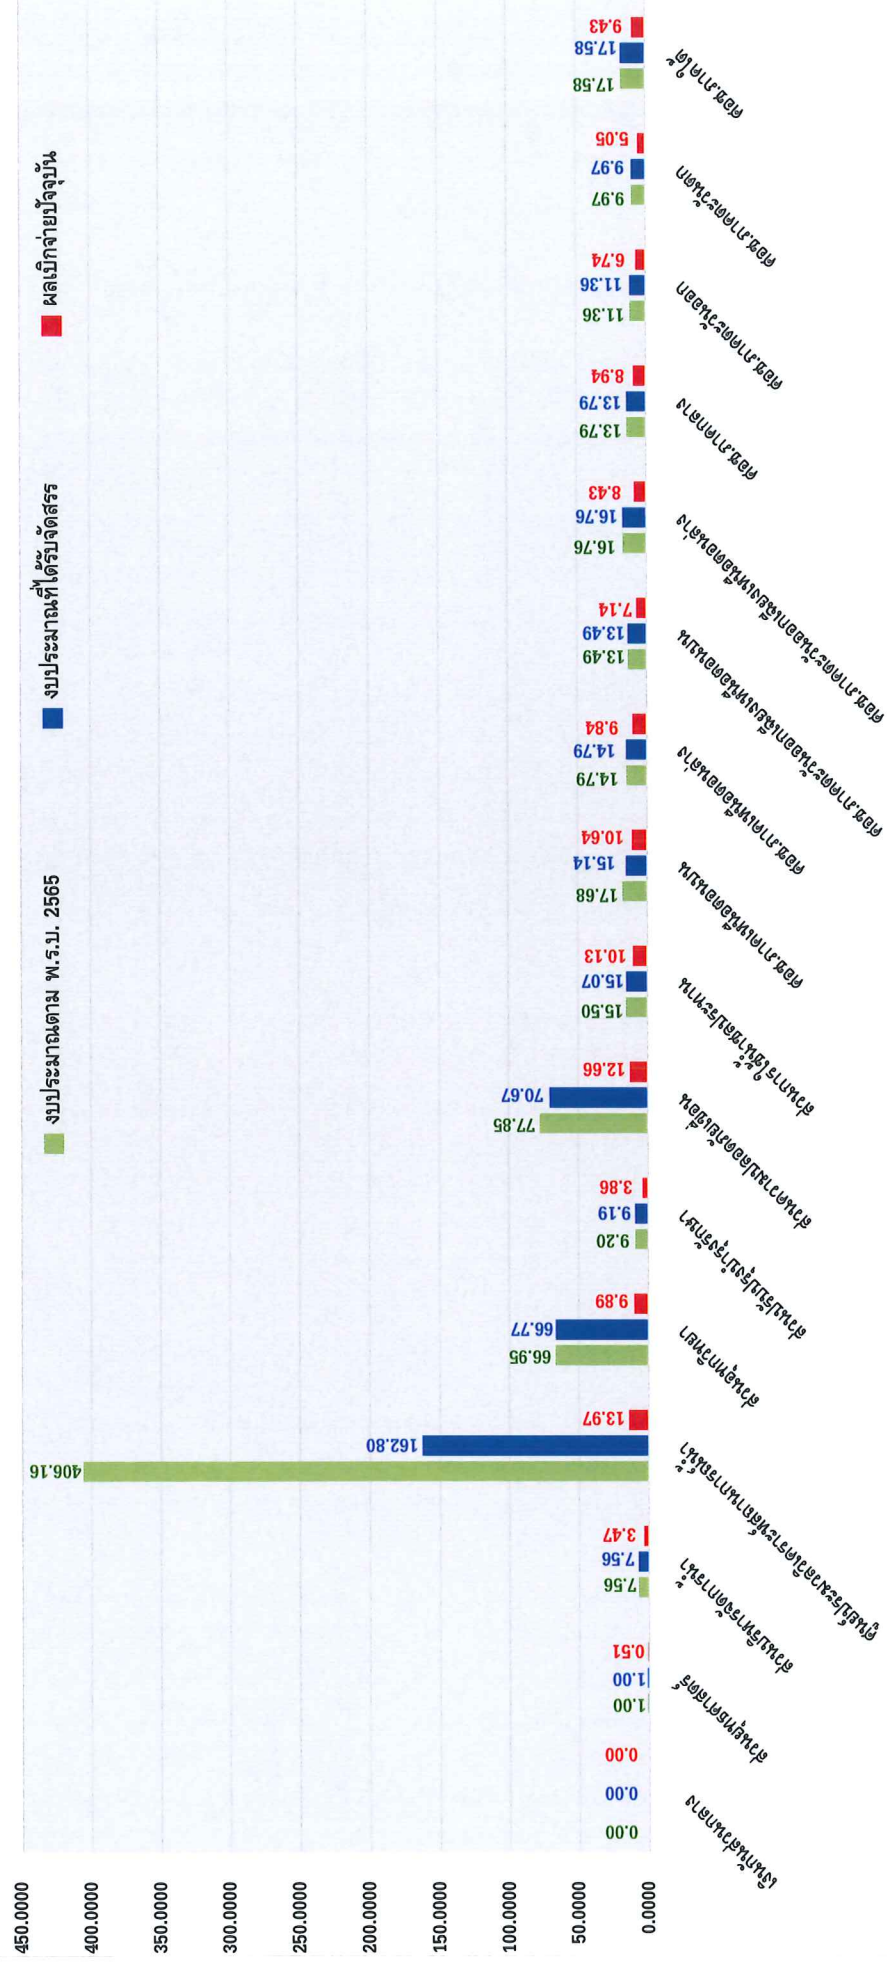

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

