



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๔๕๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๖๖5363  
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๗๘๕.๑๖๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๗ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๗๓๑.๐๘๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๑๖๖.๑๖๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘ คงเหลือที่ต้อง ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๕๒๗.๓๘๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป



(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผดป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๐๐๖ ๒๕๖๔

โดย ผอ.ส่วน, ผอ.กท., ทน.๑-๙ มอ.  
และ ผอ.ท. มอ. (จ.ม.มอ., ผอ.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔

๕๓

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,785.1646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.37 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 731.0817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.52 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 166.1690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 1,527.3876 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.63

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,305 รายการ งบประมาณ 6,307.2031 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,202.3689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 46.2190 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 52.7989 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 5.8164 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 247 รายการ งบประมาณ 4,848.0953 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,582.6510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.27 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 684.8621 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 59.0109 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1,521.5713 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 0.0007 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54.3592 ล้านบาท

| สถานะการดำเนินงาน               | จำนวนรายการ | งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) |            |        |                                    |                                  | คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท) |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |             | งบประมาณ                                          | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น | นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน) |                                      |
| รวมทั้งสิ้น                     | 1,557       | 11,209.8030                                       | 8,785.1646 | 78.37  | 731.0817                           | 166.1690                         | 1,527.3876                           |
| 1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ           | 1,305       | 6,307.2031                                        | 6,202.3689 | 98.34  | 46.2190                            | 52.7989                          | 5.8164                               |
| 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย | 247         | 4,848.0953                                        | 2,582.6510 | 53.27  | 684.8621                           | 59.0109                          | 1,521.5713                           |
| 3. ยกเลิกรายการ                 | 5           | 54.5047                                           | 0.1447     | 0.27   | 0.0007                             | 54.3592                          | -                                    |



2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 510.7125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.04 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 24.6001 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 16.2517 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 245.9813 ล้านบาท

2.2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,054.7473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.11 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 132.8880 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 4.3044 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 193.9504 ล้านบาท

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,027.7765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.77 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 152.0533 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 1.5909 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 193.1923 ล้านบาท

| สำนัก/กอง   | จำนวนรายการ | สถานะการดำเนินงาน  |                     |        |  | งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) |            |        |                                    |                                  |                            |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------|--|---------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|             |             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | ยกเลิก |  | งบประมาณ                                          | ผลเบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น | นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแบบ) | คงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ |
| รวมทั้งสิ้น | 1,557       | 1,305              | 247                 | 5      |  | 11,209.8030                                       | 8,785.1646 | 78.37  | 731.0817                           | 166.1690                         | 1,527.3876                 |
| สขป.1       | 31          | 28                 | 3                   |        |  | 134.5601                                          | 133.6661   | 99.34  | 0.0649                             | 0.6980                           | 0.1311                     |
| สขป.2       | 44          | 40                 | 4                   |        |  | 179.7421                                          | 144.2878   | 80.27  | 15.1731                            | 3.1639                           | 17.1173                    |
| สขป.3       | 69          | 68                 | 1                   |        |  | 179.6780                                          | 171.7996   | 95.62  | 0.4570                             | 2.2955                           | 5.1260                     |
| สขป.4       | 86          | 77                 | 9                   |        |  | 317.4933                                          | 287.2492   | 90.47  | 5.7460                             | 3.0572                           | 21.4408                    |
| สขป.5       | 86          | 62                 | 24                  |        |  | 119.4179                                          | 65.6388    | 54.97  | 19.0162                            | 0.1316                           | 34.6313                    |
| สขป.6       | 37          | 34                 | 3                   |        |  | 205.2031                                          | 159.7767   | 77.86  | 1.2760                             | 0.8676                           | 43.2828                    |
| สขป.7       | 90          | 85                 | 5                   |        |  | 210.3273                                          | 198.9211   | 94.58  | 4.4684                             | 0.7807                           | 6.1571                     |
| สขป.8       | 141         | 106                | 35                  |        |  | 797.5455                                          | 510.7125   | 64.04  | 24.6001                            | 16.2517                          | 245.9813                   |
| สขป.9       | 125         | 114                | 11                  |        |  | 693.8230                                          | 498.3713   | 71.83  | 32.4614                            | 44.3890                          | 118.6013                   |
| สขป.10      | 21          | 18                 | 3                   |        |  | 203.4039                                          | 194.3824   | 95.56  | 5.5673                             | 0.1665                           | 3.2878                     |
| สขป.11      | 40          | 30                 | 9                   | 1      |  | 862.6260                                          | 452.8888   | 52.50  | 267.6304                           | 41.4032                          | 100.7037                   |
| สขป.12      | 49          | 47                 | 2                   |        |  | 456.5281                                          | 449.8913   | 98.55  | 1.9356                             | 4.0385                           | 0.6628                     |
| สขป.13      | 45          | 45                 |                     |        |  | 28.0318                                           | 27.4605    | 97.96  | 0.1074                             | -                                | 0.4639                     |
| สขป.14      | 44          | 33                 | 11                  |        |  | 764.5037                                          | 656.4181   | 85.86  | 36.6261                            | 18.4388                          | 53.0207                    |
| สขป.15      | 88          | 72                 | 15                  | 1      |  | 631.3294                                          | 481.2992   | 76.24  | 4.3083                             | 19.3113                          | 126.4106                   |
| สขป.16      | 74          | 72                 | 2                   |        |  | 653.4017                                          | 645.1710   | 98.74  | 7.3983                             | 0.0880                           | 0.7444                     |
| สขป.17      | 78          | 66                 | 12                  |        |  | 408.9660                                          | 339.9188   | 83.12  | 2.2675                             | 1.0616                           | 65.7181                    |
| สขอ.        | 42          | 39                 | 3                   |        |  | 188.4644                                          | 159.8256   | 84.80  | 0.1780                             | 0.1747                           | 28.2861                    |
| สคก.        | 53          | 46                 | 7                   |        |  | 904.2724                                          | 779.1792   | 86.17  | 4.8015                             | -                                | 120.2918                   |
| สพญ.        | 102         | 69                 | 33                  |        |  | 1,385.8901                                        | 1,054.7473 | 76.11  | 132.8880                           | 4.3044                           | 193.9504                   |
| กพท.        | 132         | 98                 | 34                  |        |  | 1,374.6129                                        | 1,027.7765 | 74.77  | 152.0533                           | 1.5909                           | 193.1923                   |
| ศทล.        | 3           | 2                  | 1                   |        |  | 48.2801                                           | 35.6608    | 73.86  | 0.1321                             | 0.7172                           | 11.7700                    |
| สมล.        | 7           | 2                  | 2                   | 3      |  | 10.7290                                           | 1.0360     | 9.66   | 1.5003                             | 3.2389                           | 4.9538                     |
| สจล.        | 6           | 5                  | 1                   |        |  | 33.2263                                           | 24.2182    | 72.89  | 0.0811                             | -                                | 8.9270                     |
| สคก.        | 5           | 4                  | 1                   |        |  | 17.1602                                           | 14.8667    | 86.63  | 1.6935                             | -                                | 0.6000                     |
| สบก.        | 35          | 19                 | 16                  |        |  | 263.8590                                          | 133.2914   | 50.52  | 8.63231                            | -                                | 121.9353                   |
| สวท.        | 3           | 3                  |                     |        |  | 0.3348                                            | 0.3348     | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |
| สธส.        | 7           | 7                  |                     |        |  | 73.7515                                           | 73.7515    | 100.00 | 0.00001                            | -                                | -                          |
| สอส.        | 7           | 7                  |                     |        |  | 44.9224                                           | 44.9224    | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |
| กสท.        | 2           | 2                  |                     |        |  | 0.7480                                            | 0.7480     | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |
| สบค.        | 1           | 1                  |                     |        |  | 0.0022                                            | -          | -      | 0.0022                             | -                                | -                          |
| กพท.        | 1           | 1                  |                     |        |  | 0.0180                                            | 0.0180     | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |
| กพร.        | 1           | 1                  |                     |        |  | 4.3360                                            | 4.3360     | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |
| กผ.         | 1           | 1                  |                     |        |  | 0.0154                                            | -          | -      | 0.0154                             | -                                | -                          |
| LUMP SUM    | 1           | 1                  |                     |        |  | 12.5994                                           | 12.5994    | 100.00 | -                                  | -                                | -                          |

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน


1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป
4. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย

\*\*\*\*\*







# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาพรวม  
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

| สถานะการดำเนินงาน    |
|----------------------|
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   |
| 1,305 รายการ         |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 247 รายการ           |
| ยกเลิกรายการ         |
| 5 รายการ             |

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564

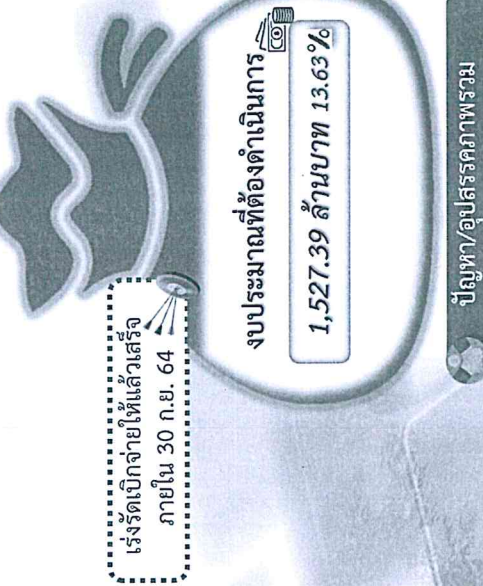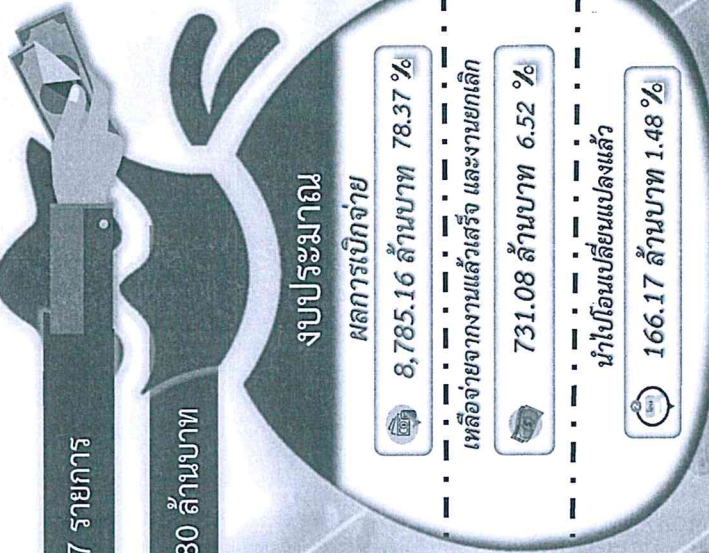

## ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎร เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเช่าที่เกษตรกรในพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้หน่วยงานพื้นที่ยกเลิกสร้าง



## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

| แผน    | 991.29 | 1,863.30 | 2,360.42 | 1,717.71 | 1,307.88 | 1,236.59 | 444.95 | 271.98  | 282.29 | 117.58 | 97.23  | 518.57 |
|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ผล     | 991.29 | 1,636.07 | 1,956.40 | 929.49   | 796.62   | 988.60   | 535.38 | 320.05  | 461.61 | 169.65 |        |        |
| ผลต่าง | -      | -227.23  | -404.02  | -788.22  | -511.26  | -247.99  | 90.43  | 48.07   | 179.32 | 52.07  |        |        |
| ด.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63   | ม.ค.64   | ก.พ.64   | มี.ค.64  | เม.ย.64  | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |        |

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

กองแผนงาน

เบิกจ่าย  
100%
