



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ กผง ๐๖/ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบ พ.ร.บ.)
เรียน ผอ.ผง. พม 192

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง และอัปโหลด บนเว็บไซต์กองแผนงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเสนอกรมเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำนักฯ เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

- ทงท

- เรือง ผอ.สอ.น., ผอ.ช.ทอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายประสิทธิ์ เบ้าใจ) ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ผจน.บอ. รักษาการฯแทน ผส บอ



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปิงปประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

สายงาน/สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน																	
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562			จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำสัญญาทัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
						จำนวนรายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)										
รวมทั้งสิ้น	61,089.89	1,932.51	719.65	37.24	8,349	5,685	3,984	32,079.89	4,270	23,751.64	95	5,258.36	86	1	4	1	1	2
บริหาร	4,476.86	-	-	-	244	224	219	816.66	25	3,660.20	-	-	-	-	-	-	-	-
สมด.	3,626.50	-	-	-	20	-	-	-	20	3,626.50	-	-	-	-	-	-	-	-
สคก.	850.36	-	-	-	224	224	219	816.66	5	33.70	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	34,265.89	76.64	10.20	13.31	7,615	5,135	3,462	19,087.94	4,148	14,982.71	5	195.25	5	-	-	-	-	-
สขป.1	1,299.26	-	-	-	316	313	147	561.27	169	737.99	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.2	1,234.20	-	-	-	331	211	181	1,046.33	150	187.87	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.3	1,147.71	-	-	-	323	217	192	972.60	131	175.11	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.4	1,564.35	2.10	0.61	29.28	412	208	100	755.03	311	767.42	1	41.91	1	-	-	-	-	-
สขป.5	2,271.84	15.00	9.59	63.92	424	287	213	1,074.84	210	1,177.00	1	20.00	1	-	-	-	-	-
สขป.6	3,358.87	-	-	-	438	75	50	924.91	388	2,433.96	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.7	2,847.12	-	-	-	570	173	108	640.21	462	2,206.91	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.8	2,990.06	-	-	-	528	325	299	2,452.17	229	537.89	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.9	2,990.16	59.54	-	-	634	352	196	1,112.01	435	1,744.81	3	133.34	3	-	-	-	-	-
สขป.10	1,127.16	-	-	-	467	436	371	1,025.41	96	101.75	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.11	1,858.80	-	-	-	487	402	242	1,605.93	245	252.87	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.12	2,898.83	-	-	-	663	663	321	1,786.43	342	1,112.40	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.13	1,095.22	-	-	-	509	343	195	662.59	314	432.63	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.14	2,527.77	-	-	-	255	243	123	1,872.80	132	654.97	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.15	1,598.24	-	-	-	445	222	157	536.22	288	1,062.02	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.16	1,986.72	-	-	-	422	365	293	965.52	129	1,021.20	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.17	1,005.84	-	-	-	216	151	135	695.08	81	310.76	-	-	-	-	-	-	-	-
สบอ.	463.74	-	-	-	175	149	139	398.59	36	65.15	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้าง	21,112.64	1,805.27	699.53	38.75	375	234	222	11,169.99	86	5,025.21	67	4,917.45	58	1	4	1	1	2
กพก.	12,123.70	740.82	381.20	51.46	189	113	104	5,774.72	54	4,186.90	31	2,162.08	28	-	1	1	1	-
สพญ.	8,987.88	1,064.46	318.33	29.91	184	119	116	5,394.20	32	838.31	36	2,755.36	30	1	3	-	-	2
สจด.	1.06	-	-	-	2	2	2	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิชาการ	1,081.53	50.60	9.91	19.59	74	62	51	852.35	11	83.52	12	145.66	12	-	-	-	-	-
สบก.	456.33	45.20	8.53	18.87	29	20	20	341.00	-	-	9	115.33	9	-	-	-	-	-
สธธ.	475.27	-	-	-	38	38	27	391.75	11	83.52	-	-	-	-	-	-	-	-
สอธ.	149.93	5.40	1.38	25.65	7	4	4	119.60	-	-	3	30.33	3	-	-	-	-	-
หมายเหตุ : งบลำน้ำ	152.96	-	-	-	41	30	30	152.96	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-


2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน																	
	งบประมาณ (ล้านบาท)					จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	จำนวนผูกพัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%		
รวม	61,089.89	1,932.51	719.65	37.24	8,349	3,984	32,079.89	4,270	23,751.64	95	5,258.36	86	1	4	1	1	2	
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	2,082.81	27.00	-	-	1,601	817	1,076.75	782	915.31	2	90.75	2	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000.12	-	-	-	463	247	1,334.55	216	665.56	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ	2,179.54	-	-	-	215	73	983.16	142	1,196.38	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	6,190.83	-	-	-	4,634	2,042	3,302.01	2,592	2,888.82	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,306.07	2.10	0.61	29.28	31	24	878.07	7	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	91.50	-	-	-	4	4	91.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	700.39	-	-	-	12	4	230.39	8	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,431.22	-	-	-	24	11	968.92	13	462.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่	3,022.91	-	-	-	98	31	937.05	67	2,085.87	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อม	1,101.52	-	-	-	26	17	627.52	9	474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด	537.64	236.56	62.83	26.56	14	6	195.00	2	0.40	6	342.24	5	1	-	-	-	-	
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	407.68	15.00	-	-	8	4	44.35	2	82.64	2	280.69	2	-	-	-	-	-	
โครงการเขื่อนทด่น้ำมาจุก จังหวัดอุดรติดต์	437.29	70.00	11.41	16.30	11	8	294.88	1	2.45	2	139.96	1	-	1	-	-	-	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	223.81	-	-	-	8	6	169.81	1	54.00	1	0.00	1	-	-	-	-	-	
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	265.74	74.00	18.75	25.34	12	8	94.46	-	-	4	171.28	4	-	-	-	-	-	
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรติดต์	737.92	303.96	142.35	46.83	9	-	-	6	42.42	3	695.50	-	-	2	-	-	1	
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	193.48	-	-	-	5	3	159.50	1	0.50	1	33.48	1	-	-	-	-	-	
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก	42.76	20.00	-	-	4	1	0.74	-	-	3	42.03	3	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,231.39	12.95	-	-	355	237	4,467.61	117	1,750.83	1	12.95	1	-	-	-	-	-	
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,663.33	535.10	279.28	52.19	422	241	7,813.34	144	9,148.37	37	1,701.62	34	-	1	1	-	1	
ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,279.98	478.66	193.17	40.36	225	119	4,402.25	78	2,625.95	28	1,251.78	27	-	-	-	1	-	
ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ	158.43	15.00	-	-	110	34	103.41	75	32.92	1	22.10	1	-	-	-	-	-	
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปั้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	103.59	-	-	-	8	6	103.59	-	-	2	0.00	2	-	-	-	-	-	
โครงการประดูละบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเข็ญคาน จังหวัดเลย	134.92	-	-	-	6	-	-	5	134.92	1	0.00	1	-	-	-	-	-	
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,056.64	142.19	11.25	7.91	12	11	582.67	-	-	1	473.97	1	-	-	-	-	-	
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,866.23	-	-	-	8	6	1,576.23	2	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	630.00	-	-	-	2	2	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการประดูละบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	108.40	-	-	-	5	5	108.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	286.90	-	-	-	5	5	286.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	387.60	-	-	-	6	6	387.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการประดูละบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	159.24	-	-	-	5	5	159.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	70.00	-	-	-	1	1	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

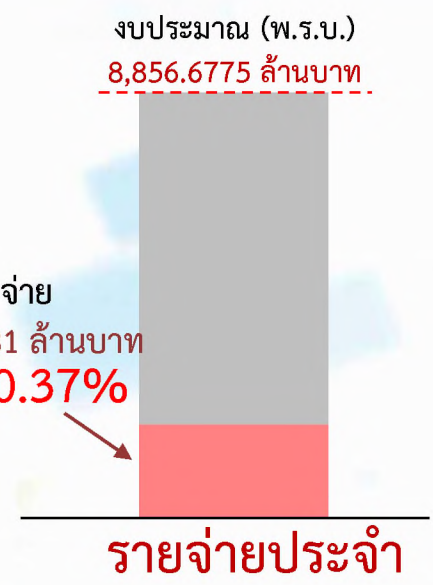

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น 95 รายการ งบประมาณ 5,258.36 ล้านบาท
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณ 4,161.68 ล้านบาท

โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (14.58%)
งบประมาณ 625.60 ล้านบาท (15.03%) และยังไม่ดำเนินการ จำนวน 41 รายการ (85.42%) งบประมาณ 3,536.08 ล้านบาท (84.97%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 8,206 รายการ งบประมาณ 50,900.85 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4,263 รายการ (51.95%) งบประมาณ 22,357.04 ล้านบาท (43.92%) และยังไม่ดำเนินการ 3,943 รายการ (48.05%) งบประมาณ 28,543.81 ล้านบาท (56.08%)




หมายเหตุ : ร้อยละต่องบประมาณ (พ.ร.บ.)

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

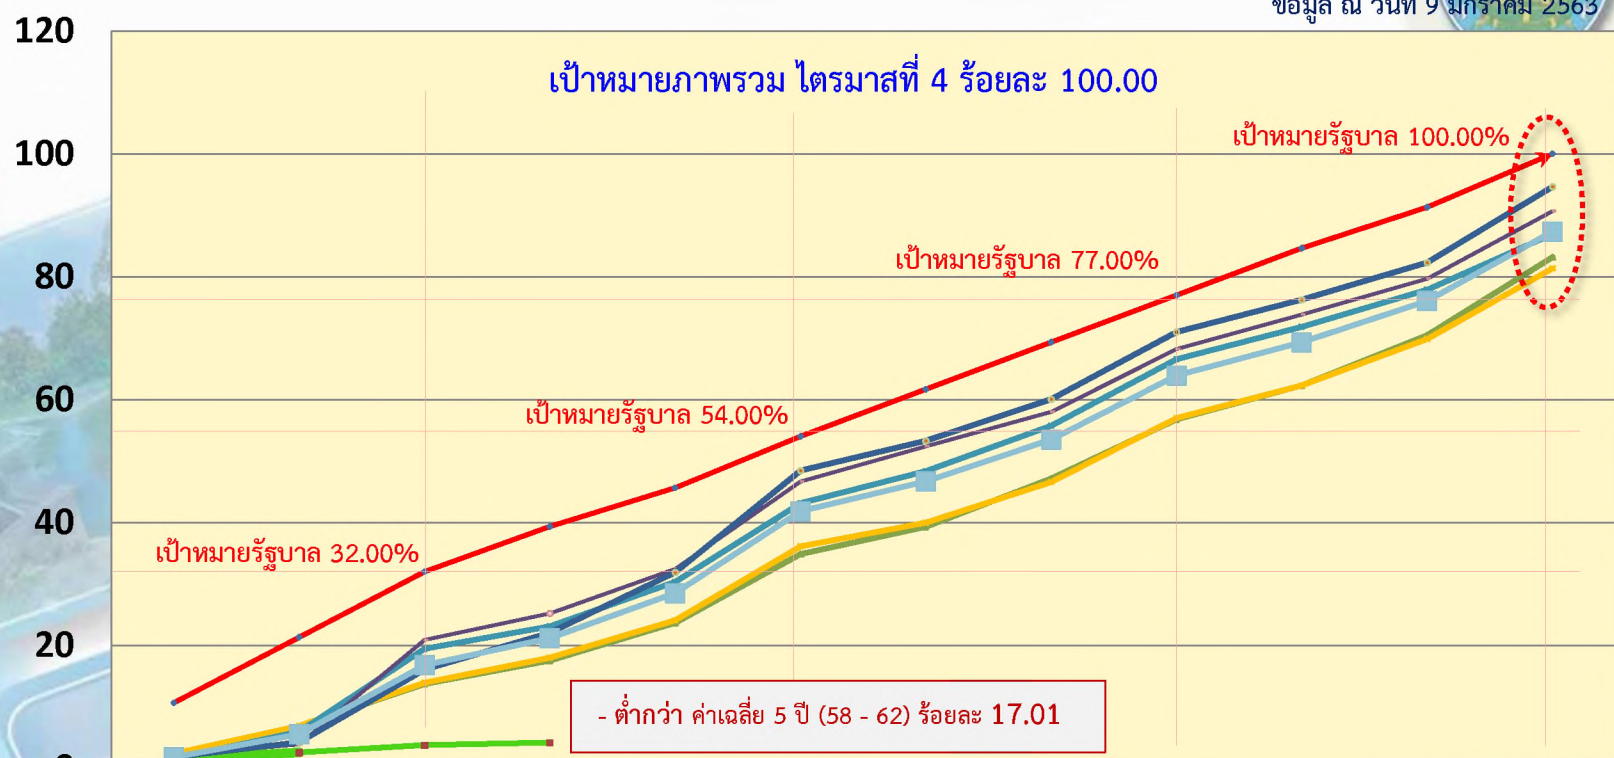


	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➡ เป้าหมายรัฐบาล ปี 62	10.66	21.33	32.00	39.33	45.66	54.00	61.66	69.32	77.00	84.66	91.32	100.00
ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	4.16								
ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
เฉลี่ย 5 ปี (58-62)	1.80	5.55	16.81	21.17	28.48	41.84	46.66	53.50	63.91	69.32	76.04	87.37

หมายเหตุ : เป้าหมายรัฐบาล เป็นเป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

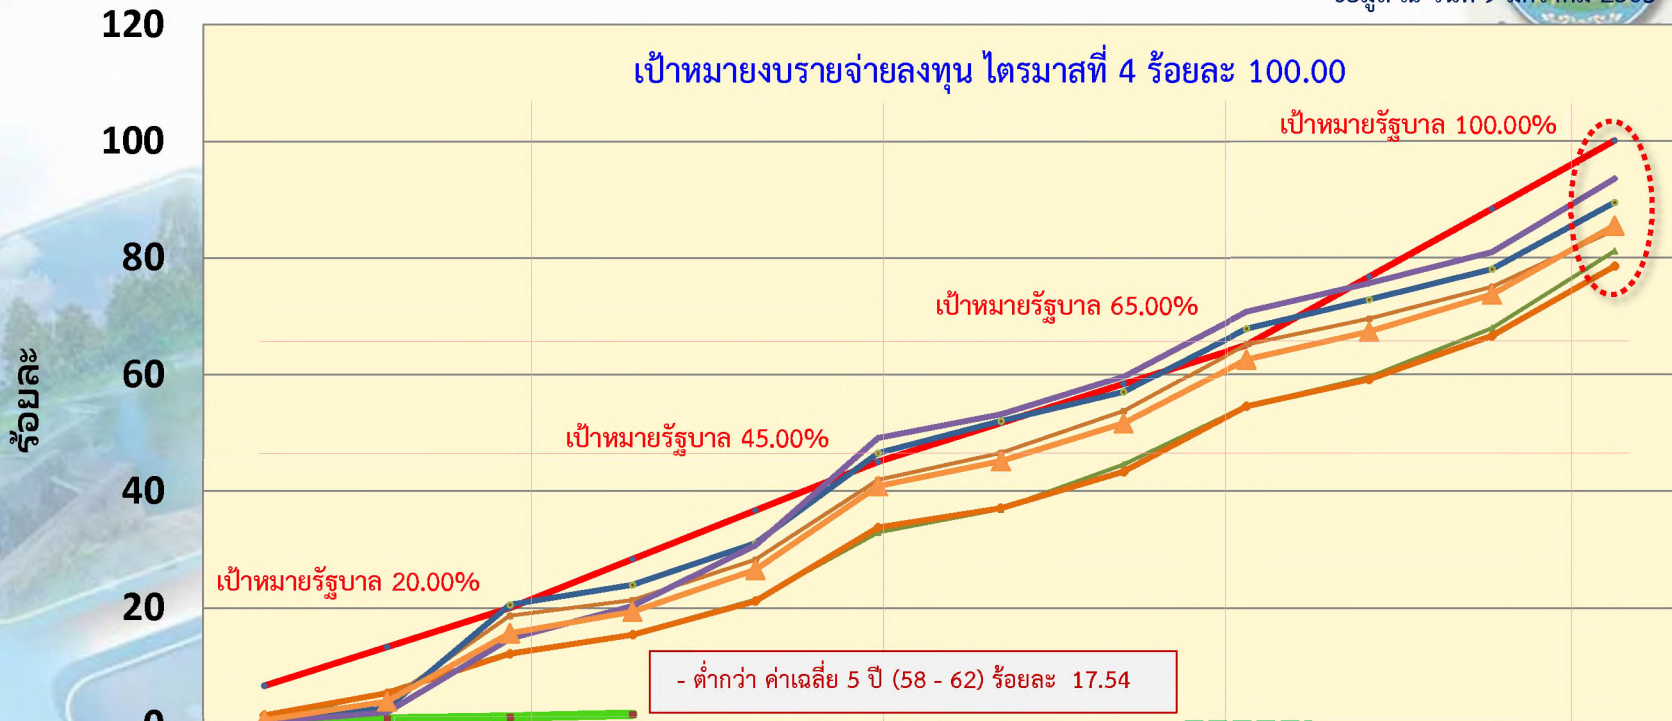

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายรัฐบาล ปี 62	6.66	13.32	20.00	28.33	36.66	45.00	51.66	58.33	65.00	76.66	88.32	100.00
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	1.78								
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
ผลปี 59 (39,089.71)	0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
ผล ปี 58 (35,529.45)	0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
เฉลี่ย 5 ปี (58 - 62)	0.78	4.01	15.68	19.32	26.52	40.83	45.13	51.62	62.52	67.29	73.66	85.42

หมายเหตุ : เป้าหมายรัฐบาล เป็นเป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

ร้อยละ

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

สายงาน	งบประมาณปี 2563 (ล้านบาท)	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
รวม	60,936.92	1,932.51	719.65	37.24
ก่อสร้าง	21,112.64	1,805.27	699.53	38.75
วิชาการ	1,081.53	50.60	9.91	19.59
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	34,265.89	76.64	10.20	13.31
บริหาร	4,476.86	-	-	-

ก่อสร้าง

วิชาการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษา

บริหาร

ผลเบิกจ่าย
งบลงทุนของกรม
ณ วันที่ 9 ม.ค. 63
ร้อยละ 1.78

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ยังไม่รวมงบล่าช้า จำนวน 41 รายการ งบประมาณ 152.96 ล้านบาท

กองแผนงาน


7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)




เป้าหมาย
ณ สิ้นไตรมาส 4
ร้อยละ 100.00

หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา				สายงานวิชาการ			
สขบ.1	0.00	0.00	0.00	สขบ.11	0.00	0.00	0.00
สขบ.2	0.00	0.00	0.00	สขบ.12	0.00	0.00	0.00
สขบ.3	0.00	0.00	0.00	สขบ.13	0.00	0.00	0.00
สขบ.4	2.10	0.61	29.28	สขบ.14	0.00	0.00	0.00
สขบ.5	15.00	9.59	63.92	สขบ.15	0.00	0.00	0.00
สขบ.6	0.00	0.00	0.00	สขบ.16	0.00	0.00	0.00
สขบ.7	0.00	0.00	0.00	สขบ.17	0.00	0.00	0.00
สขบ.8	0.00	0.00	0.00	สบอ.	0.00	0.00	0.00
สขบ.9	59.54	0.00	0.00	รวม	76.64	10.20	13.31
สขบ.10	0.00	0.00	0.00	สายงานบริหาร			
สายงานก่อสร้าง				สสธ.	0.00	0.00	0.00
สพญ.	1,064.46	318.33	29.91	สบก.	45.20	8.53	18.87
กพท.	740.82	381.20	51.46	สอธ.	5.40	1.38	25.65
สจต.	0.00	0.00	0.00	รวม	50.60	9.91	19.59
รวม	1,805.27	699.53	38.75	รวม			
				สขบ.	0.00	0.00	0.00
				สคก.	0.00	0.00	0.00
				รวม	0.00	0.00	0.00

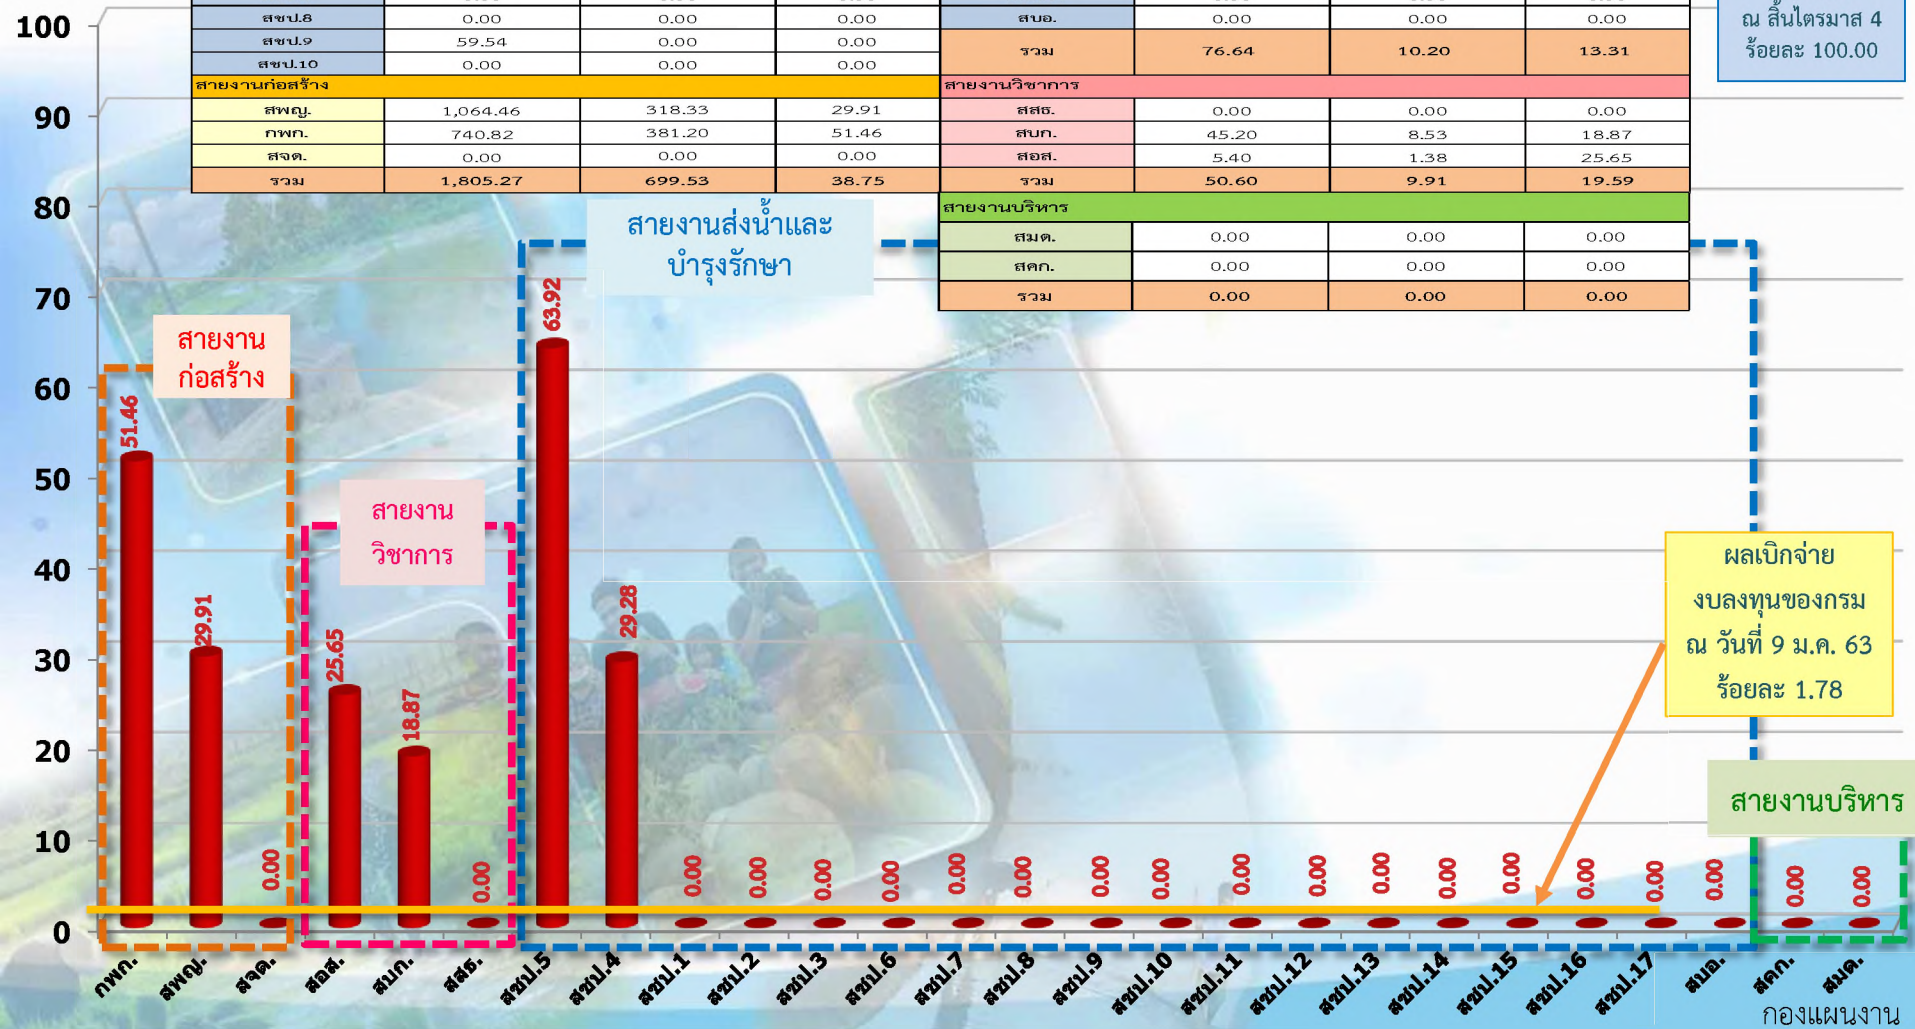

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

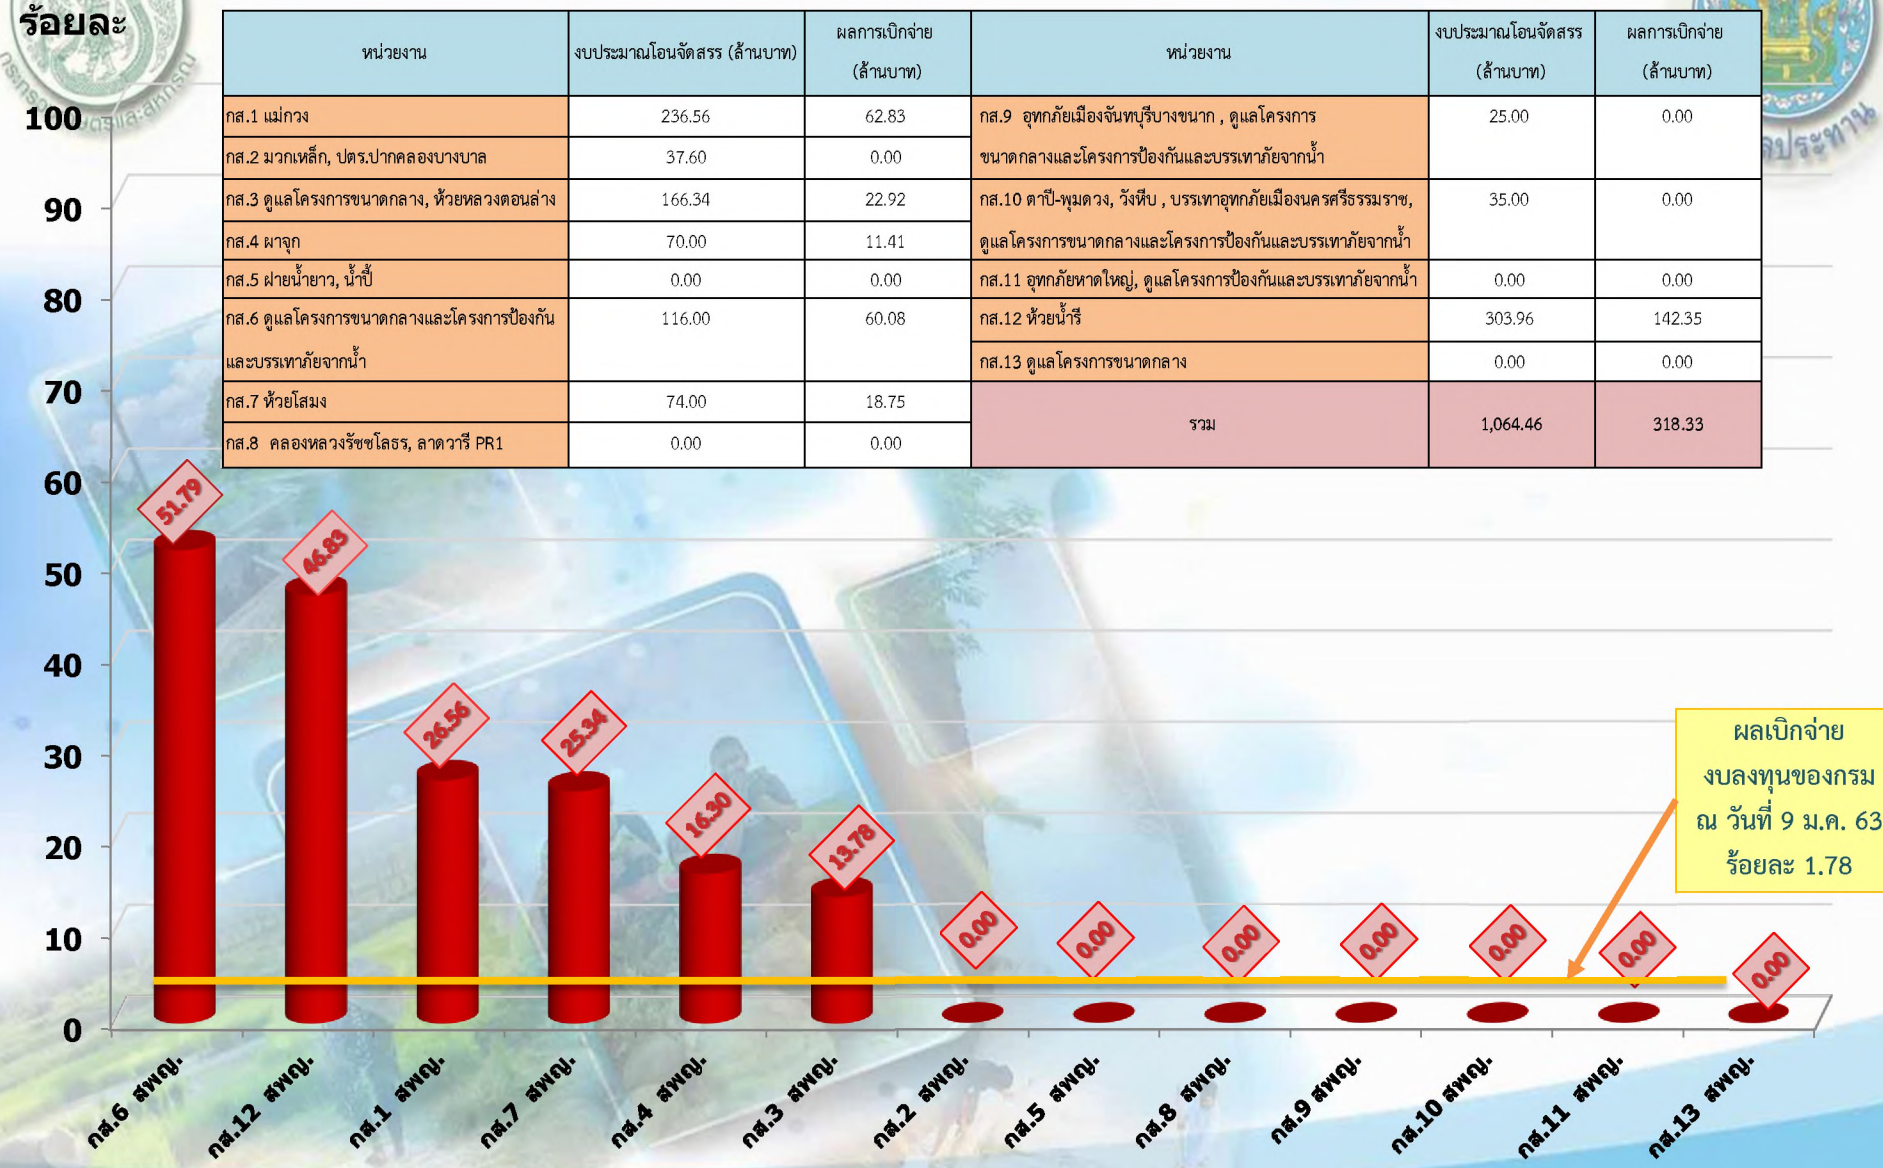

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 9 มกราคม 2563)

