



เลขที่เอกสารในระบบ E.....๓๘๐๖/๒๘/๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๘/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผอ.ผง. ๖๒๒๓๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

โยน ผอ.ธช., ผอ.๖.๓๓., ทน.๑-๙.ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายประยูร เย็นใจ)

ผชช.จช.3 รักษาการแทน ผส.บอ.

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 98,998.27 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 21,267.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.48 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,834 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 189 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.36 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,493 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.02 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10,011 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.37 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,050 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.59 และยกเลิก จำนวน 91 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 12,723.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,118.69 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,749.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,024.74 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 10,973.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 168 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.76 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 952 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.96 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,224 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.08 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.28 และยกเลิก จำนวน 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,075.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว จำนวน 83.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 8,124.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.00 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,067 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 744 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.73 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 323 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.27

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,851.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.20 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 910 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.60 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 278 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.40

4. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,497.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.06 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 327 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.16 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 119.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.80 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.00 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.00



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

บทหลังงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย


ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

รายละเอียดข้อมูล

- 1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)
 - 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
 - 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
 - 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
 - 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565
- 3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น									
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรมบัญชีกลาง)	98,998.27	21,267.23	21.48	13,834	189	2,493	10,011	1,050	ยกเลิก 91 รายการ
1.1 งบรายจ่ายประจำ	77,143.43	12,723.30	16.49	9,554	168	952	8,224	122	
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	7,118.69	1,749.89	24.58						ยกเลิก 88 รายการ
2. งบเงินกู้ไม่เบิกหลัอมปี พ.ศ. 2563	70,024.74	10,973.41	15.67	9,554	168	952	8,224	122	- ตัดไม่ขยายและสลาย PO จำนวน 83.09 ล้านบาท
	11,283.76	3,075.52	27.26	1,067			744	323	- คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 8,124.34 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564									
	4,605.14	1,851.33	40.20	1,188			910	278	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	1,157.52	33.85	1,117			862	255	
- โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	313.50	26.49	44			38	6	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	839.54	53.74	1,046			797	249	
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	94.70	0.07	0.07	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	0.65	0.79	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท้ายแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	3.76	5.37	1			1		
3.2 โครงการอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	693.81	58.54	71			48	23	
4. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,497.43	82.78	384			54	327	ยกเลิก 3 รายการ
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12			1,541		1,541			
6. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	119.65	12.80	100	21		79		



2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

หน่วยงาน	งบลงทุน พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำสัญญา						
					จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	69,168.12	10,879.37	15.73	9,466	168	2,059.79	952	9,305.27	8,346	57,803.05	5,805	1,111	594	378	336	122
สปร. 1	1,608.42	337.90	21.01	364	11	83.84	8	23.86	345	1,500.72	102	117	73	31	17	5
สปร. 2	1,890.25	185.45	9.81	450	1	1.00	11	29.90	438	1,859.35	341	48	29	15	4	1
สปร. 3	2,334.81	147.63	6.32	342	2	3.00	14	123.01	326	2,208.81	264	11	22	8	20	1
สปร. 4	1,082.89	135.08	12.47	495	13	69.66	20	116.22	462	897.01	396	36	18	2	8	2
สปร. 5	2,677.70	426.71	15.94	607	13	45.77	34	124.53	560	2,507.40	323	115	55	36	30	1
สปร. 6	2,646.30	596.63	22.55	514			13	39.18	501	2,607.12	179	67	53	83	74	45
สปร. 7	2,404.07	865.63	36.01	506			4	16.10	502	2,387.97	176	92	104	43	82	5
สปร. 8	4,047.67	241.13	5.96	580	2	17.55	27	378.81	551	3,651.32	380	86	36	23	18	8
สปร. 9	2,464.74	348.31	14.13	691	15	91.61	20	128.37	656	2,244.77	451	103	55	25	13	9
สปร. 10	1,343.45	109.37	8.14	594	19	70.47	91	336.89	484	936.08	445	21	5	3	6	4
สปร. 11	1,582.28	107.65	6.80	576	3	35.84	72	613.49	501	932.94	417	56	9	14	4	1
สปร. 12	2,418.02	242.90	10.05	646	3	1.04	89	673.74	554	1,743.25	376	98	32	34	11	3
สปร. 13	2,130.91	197.40	9.26	634	6	63.60	25	192.79	603	1,874.52	460	94	12	10	16	11
สปร. 14	3,261.18	340.88	10.45	296	24	487.26	56	549.63	216	2,224.28	134	26	24	13	13	6
สปร. 15	1,900.69	103.29	5.43	452	23	130.86	124	904.74	305	865.09	280	17	5	2	1	8
สปร. 16	3,057.93	45.33	1.48	591	2	25.50	214	1,765.18	375	1,267.25	303	17	32	13	2	4
สปร. 17	682.65	42.47	6.22	227	1	5.00	12	103.80	214	573.85	179	24	1	3	3	4
กทท.	12,449.50	2,182.51	17.53	176	10	188.04	8	821.89	158	11,439.58	141	6	5	4	2	2
สทท.	12,268.92	2,312.02	18.84	168	4	285.39	20	1,480.47	144	10,503.07	132	7	1	1	2	1
สทอ.	699.63	29.61	4.23	207	8	165.19	46	240.07	153	294.38	100	41	7	2	3	3
สทค.	727.00	175.83	24.19	175	2	4.20	5	28.33	168	694.47	138	14	7	4	2	3
สทส.	531.51	58.73	11.05	42			10	91.62	32	439.89	32					
สทบ.	549.48	45.56	8.29	33			10	97.00	23	452.48	23					
สทธ.	376.65	33.04	8.77	10			3	54.00	7	322.65	7					
สทธ.	158.22	38.07	24.06	39	1	20.00	2	2.70	36	135.52	10	12	4	6	3	1
สทค.	82.68	0.10	0.12	4	2	47.58			2	35.10	2					
สทพ.	4.71	0.08	1.74	3	1	1.40			2	3.31	2					
รวม	3,536.83	1,529.94	43.26	41			14	368.96	27	3,167.88	11	3	5	3	4	1
Lump Sum	249.00	0.10	0.04	3	2	216.00			1	33.00	1					

หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 88 รายการ งบประมาณ 967.51 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น รถจักรยานยนต์ เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	การติดตาม					
					จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	69,168.12	10,879.37	15.73	9,466	168	2,059.79	952	9,305.27	8,346	57,803.05	5,805	1,111	594	378	336	122
โครงการเขื่อนทดน้ำจาก จังหวัดอุดรดิต์	809.00	163.00	20.15	10			1	8.00	9	801.00	8	1				
โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	575.71	22.47	14			4	763.20	10	1,798.43	10					
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ที่ชลประทาน	27,517.83	4,573.27	16.62	621	15	308.30	62	2,143.92	544	25,065.61	492	28	11	6	4	3
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	79.70	15.95	9	1	79.78			8	419.96	8					
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	789.37	213.98	27.11	13			5	7.83	8	781.53	8					
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06			1					1	141.06	1					
โครงการประติรูปถนนบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดฉะชลนคร	99.56	18.52	18.60	3					3	99.56	2			1		
โครงการประติรูปถนนลำน้ำพุง-น้ำแก้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะชลนคร	312.00	6.82	2.19	4					4	312.00	4					
โครงการประติรูปถนนศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	8.30	11.53	4					4	72.00	3				1	
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	0.50	0.18	6			1	1.00	5	274.66	5					
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,441.96	384.35	5.97	373	15	461.46	76	1,585.19	282	4,395.31	235	37	5	1	4	
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	10,918.65	1,184.67	10.85	295	8	456.96	54	1,974.13	233	8,487.56	215	11	3	4		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งามอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่	1,033.27	2.96	0.29	14			1	228.00	13	805.27	10	3				
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,298.06	290.30	22.36	12			2	4.52	10	1,293.54	9	1				
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,195.90	312.54	14.23	746	9	21.86	65	536.48	672	1,637.56	386	137	70	32	39	8
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,635.02	2,111.56	19.85	6,749	101	534.12	619	1,854.97	6,029	8,245.93	4,092	816	461	304	255	101
โครงการทำฝายโสมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.77	1.63	0.97	5	1	105.00			4	62.77	4					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสระยอง	108.00			2	1	8.00	1	100.00								
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	24.95	23.95	6					6	104.14	6					
โครงการอ่างเก็บน้ำแก้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.02	18.41	5.29	7					7	348.02	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	449.27	70.46	5					5	637.62	4					1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	11.32	2.92	3	1	3.00			2	385.00	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกอกเคียน จังหวัดยะลา	525.00	84.90	16.17	3					3	525.00	2	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	313.78	166.12	52.94	6					6	313.78	4	1				1
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	975.08	196.60	20.16	555	16	81.32	61	98.03	478	795.73	288	75	43	31	32	9

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 88 รายการ งบประมาณ 967.51 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น


2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

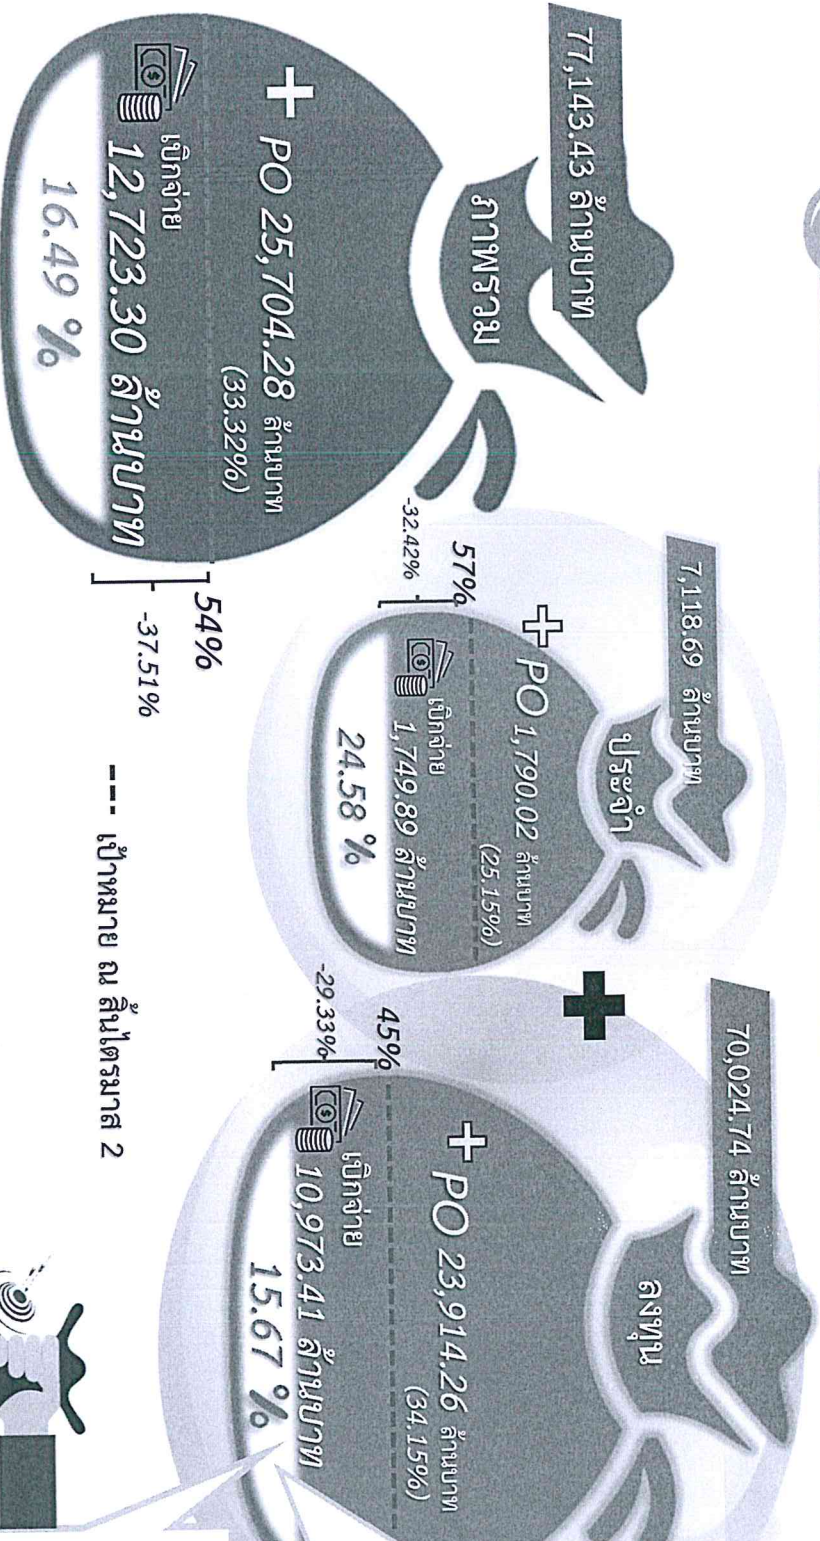

--- เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2



รายจ่ายประจำ	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
รายจ่ายลงทุน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ



- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 112 รายการ งบประมาณ 11,311.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,517.85 ล้านบาท (22.26%) โดยทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 110 รายการ (98.21%) งบประมาณ 11,222.98 ล้านบาท (99.22%) และแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ (1.79%) งบประมาณ 88.49 ล้านบาท (0.78%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบประมาณ 2,178.07 ล้านบาท โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ (4.00%) งบประมาณ 46.74 ล้านบาท (2.15%) และอยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 24 รายการ (96.00%) งบประมาณ 2,131.33 ล้านบาท (97.85%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,417 รายการ งบประมาณ 56,535.20 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,455.56 ล้านบาท (14.96%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 167 รายการ (1.77%) งบประมาณ 2,013.05 ล้านบาท (3.56%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 928 รายการ (9.86%) งบประมาณ 7,173.94 ล้านบาท (12.69%) ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน 8,114 รายการ (86.16%) งบประมาณ 45,893.96 ล้านบาท (81.18%) แล้วเสร็จ จำนวน 120 รายการ (1.27%) งบประมาณ 486.74 ล้านบาท (0.86%) และยกเลิก จำนวน 88 รายการ (0.94%) งบประมาณ 967.51 ล้านบาท (1.71%)

2.6


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

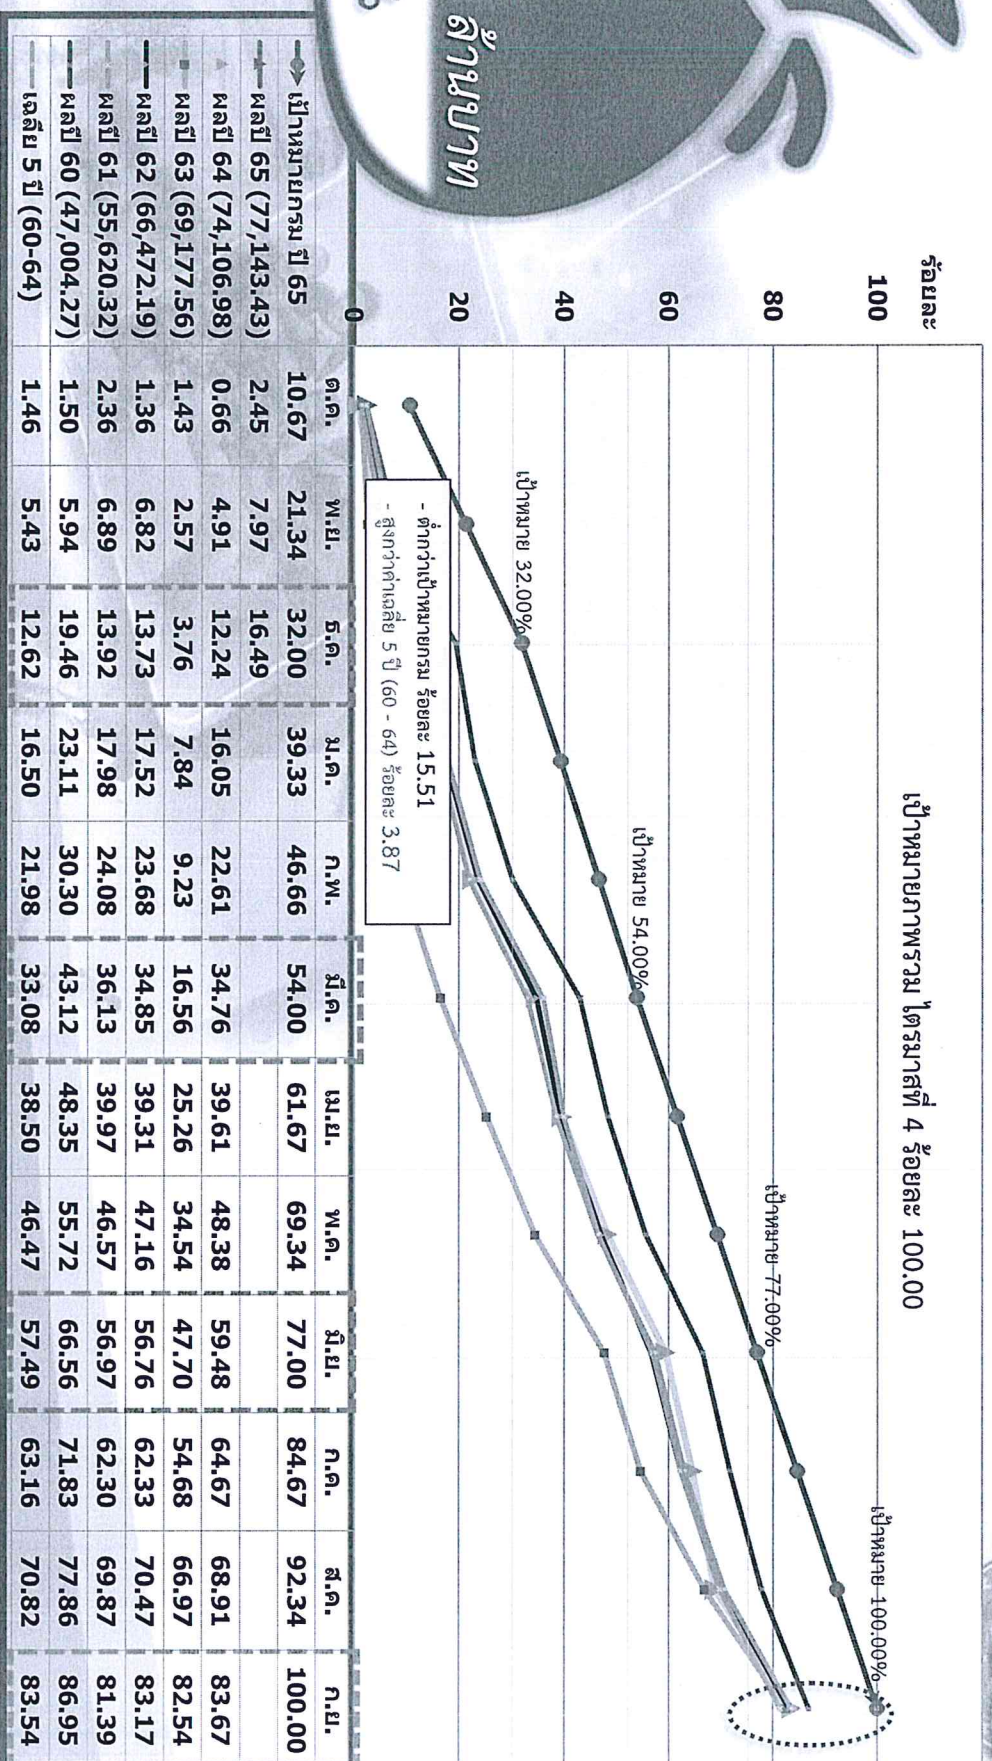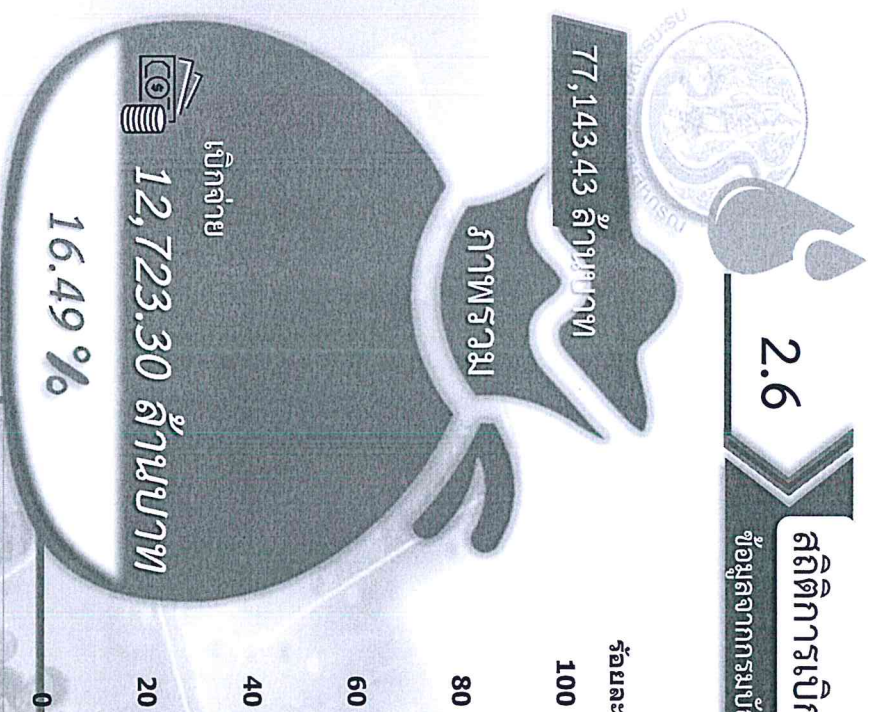

2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

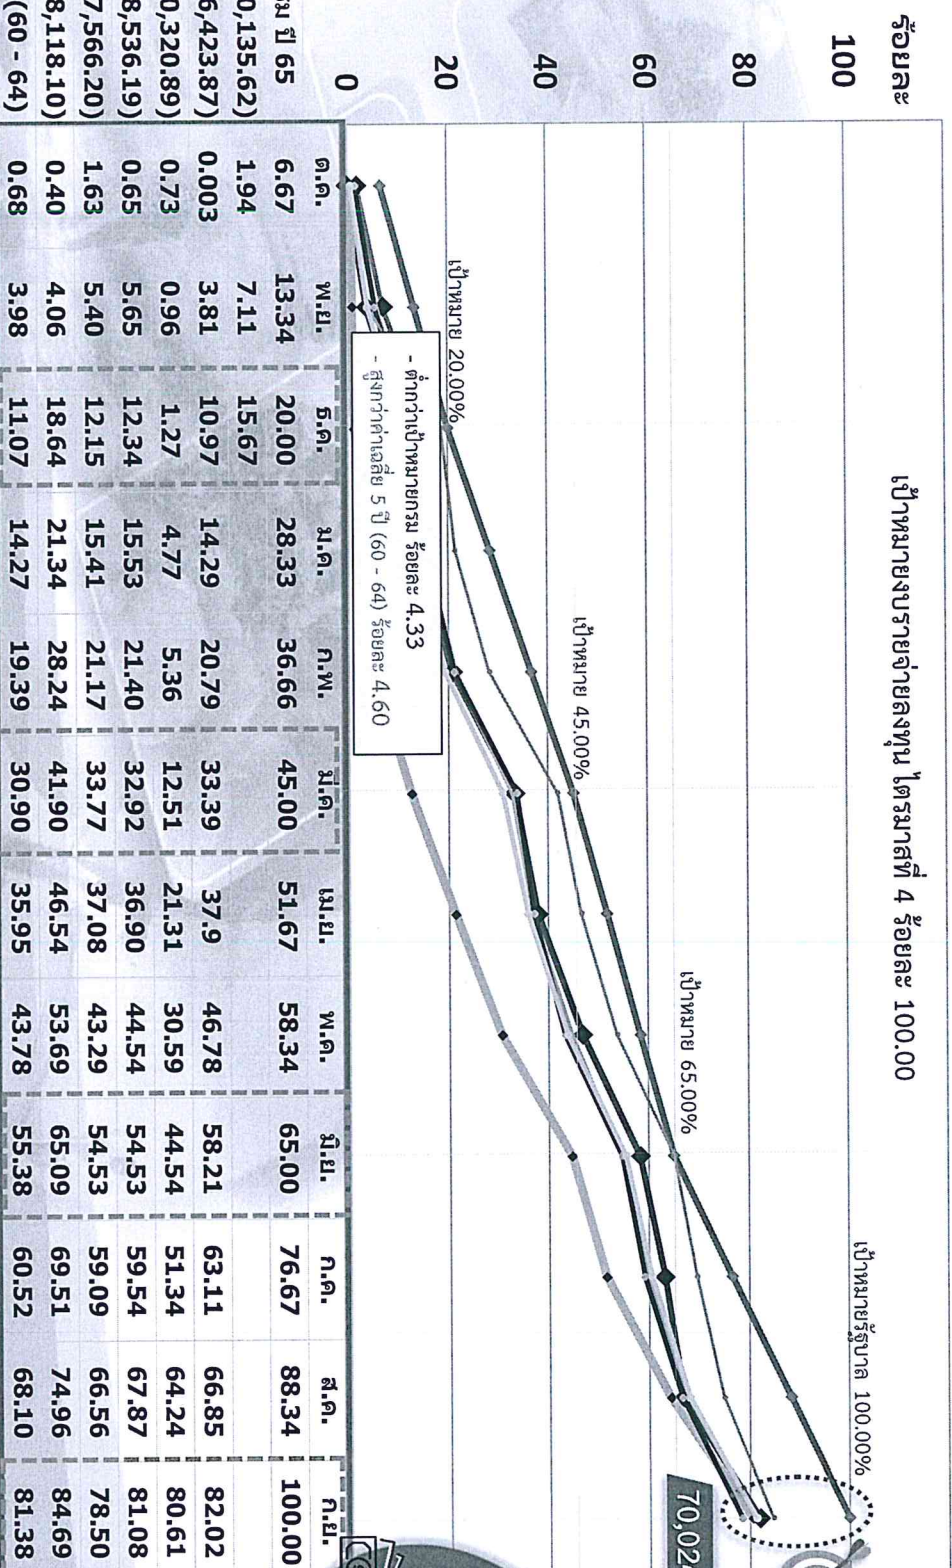


เบิกจ่าย
10,973.41 ล้านบาท
15.67%

ลงทุน

70,024.74 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังและการตลาดรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

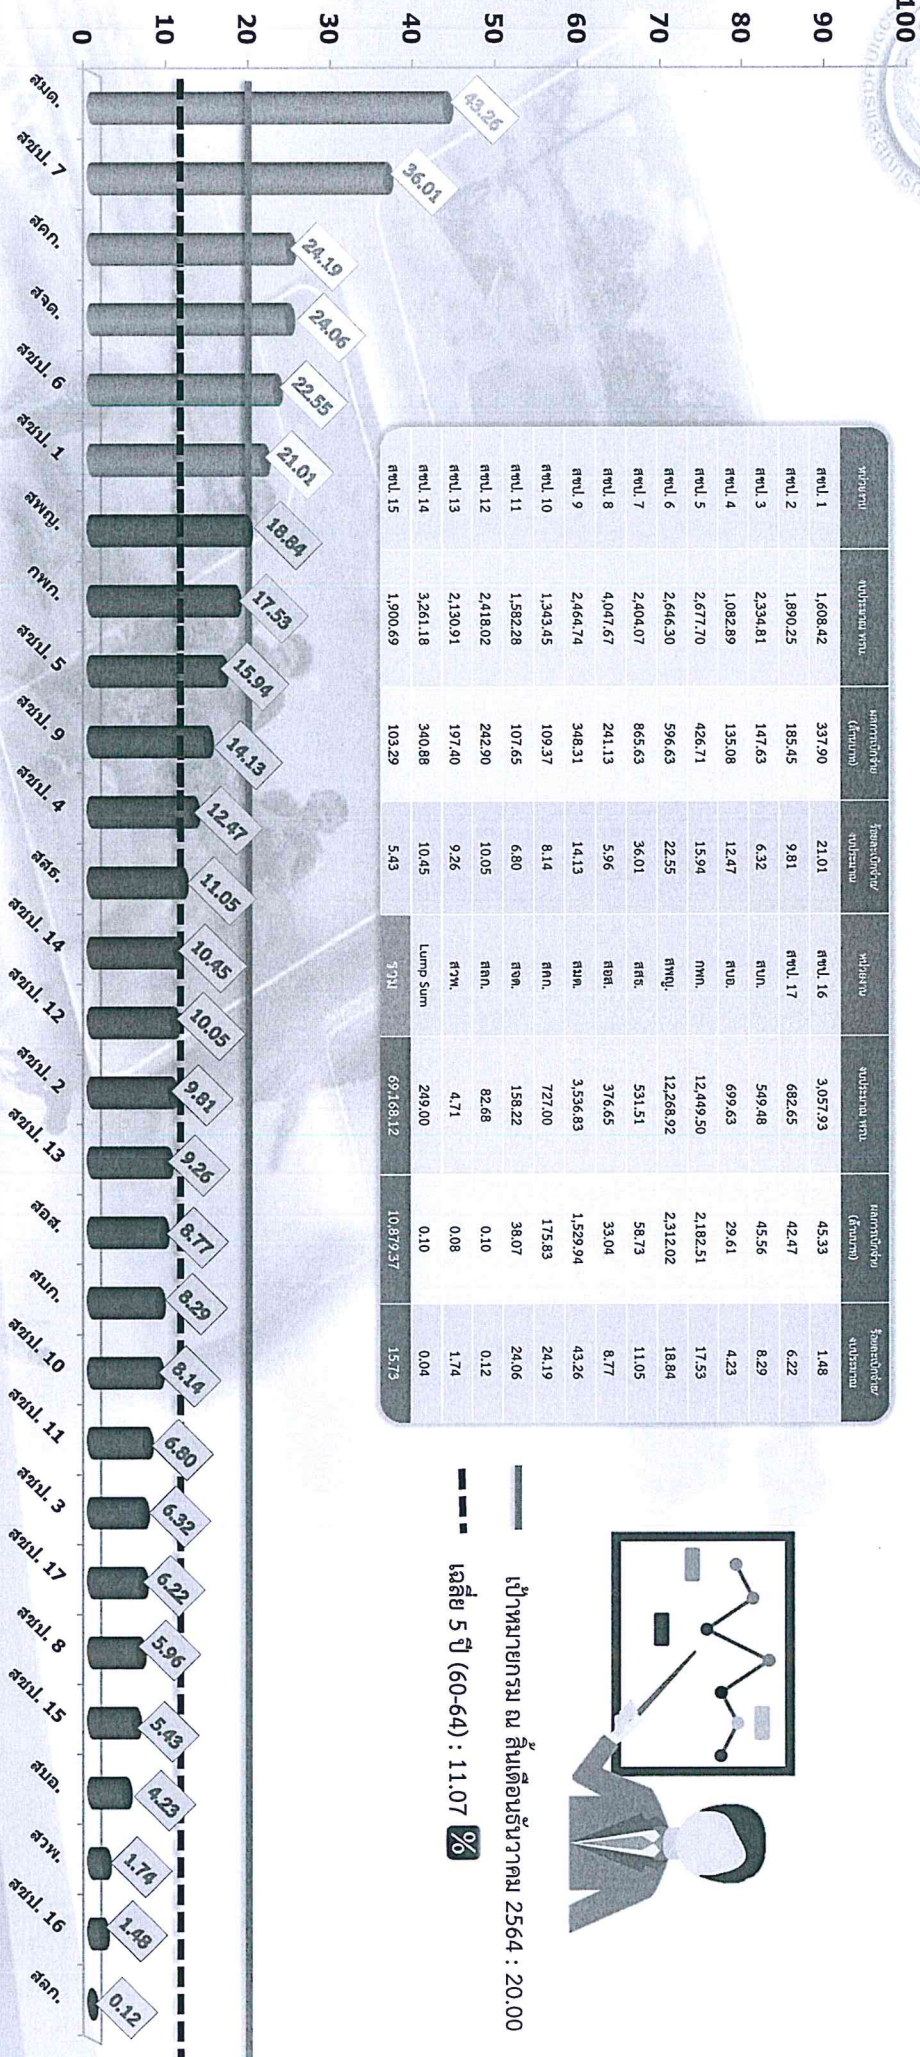[illegible]

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 69,168.12 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก จำนวน 88 รายการ งบประมาณ 967.51 ล้านบาท

- ☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,448.66	11,355.61	15.05	72,632.14	5,219.04	7.19	7.86
2	กระทรวงคมนาคม	161,585.87	18,492.06	11.44	177,618.79	9,772.67	5.50	5.94
3	กระทรวงมหาดไทย	75,933.84	6,729.15	8.86	80,699.64	6,200.55	7.68	1.18
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมชลประทาน	70,024.74	10,973.41	15.67	66,541.42	4,930.32	7.41	8.26
2	กรมพัฒนาที่ดิน	1,957.74	82.03	4.19	2,175.36	50.39	2.32	1.87
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,279.24	17.87	1.40	1,184.81	26.31	2.22	-0.82
	ระดับกรม (ผู้เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.22	5,263.24	17.64	27,512.17	5,477.98	19.91	-2.27
2	กรมชลประทาน	70,024.74	10,973.41	15.67	66,537.16	7,302.41	10.97	4.70
3	กรมทางหลวง	107,990.22	16,093.18	14.90	120,258.39	11,068.38	9.20	5.70
4	กรมทางหลวงชนบท	44,326.09	1,760.62	3.97	47,202.12	1,205.28	2.55	1.42

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 16.69%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 14.76%





ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

3,075.52 ล้านบาท 27.26 %

ตัด/ไม่ขยาย + สล่าย PO

83.90 ล้านบาท 0.74 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

8,124.34 ล้านบาท

72.00 %

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

323 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

744 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98									
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49									

ต.ค.64 พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%

ผลการดำเนินงาน

มติ ครม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 64 รว
7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
เบิก 1,851.33 ล้านบาท 40.20%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ
278 รายการ 23.40%

ดำเนินการ
910 รายการ 76.60%

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่สหประชา 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

พื้นที่สหประชา 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 151,400 ไร่ 15.26%

ปริมาณน้ำ 16,74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 1.27 ล้าน ลบ.ม. 7.59%

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 32,092 ครัวเรือน 22.75%

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564



มติ ครม.
8 ม.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
15 มิ.ย.
64

มติ ครม.
14 ก.ย.
64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย.
64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย.
64

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย.
64

กปร.
ปี 2564

24 รายการ

426.47 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 รายการ
(ส่งมอบ) - %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 16 ก.ย. 64

44 รายการ

1,183.31 ล้านบาท

เบิกจ่าย 313.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.49

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
38 รายการ
• แล้วเสร็จ 6 รายการ
24.94 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 16 ก.ย. 64

1,046 รายการ

1,562.30 ล้านบาท

เบิกจ่าย 839.54 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 53.74

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
797 รายการ
• แล้วเสร็จ 249 รายการ
43.25 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 23 ก.ย. 64

1 รายการ

94.70 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.07 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.07

• อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง 1 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 29 ก.ย. 64

1 รายการ

83.09 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.65 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.79

• อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง 5 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 29 ก.ย. 64

1 รายการ

70.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.37

• อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง 10.00 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 29 ก.ย. 64

71 รายการ

1,185.27 ล้านบาท

เบิกจ่าย 693.81 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 58.54

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
48 รายการ
• แล้วเสร็จ 23 รายการ
36.65 %

ให้กองโอบงการชลประทานฯ ลงมือวันที่ 29 ก.ย. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาทุกข์ภายใน
ฤดูฝนปี 2564

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาทุกข์ภายใน
ฤดูฝนปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันกาเกิด
อุทกภัย และปัญหายั่งยืน ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการสนับสนุนวิชาการส่งเสริมและ
ขยายผล กองส่งเสริมเทคโนโลยีการ
ประมง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำคลองส่งน้ำชลประทาน
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,497.43 ล้านบาท 82.78%
คงเหลือ 544.54 ล้านบาท 12.89%
เหลือจ่าย 182.84 ล้านบาท 4.33%

สถานะการดำเนินงาน


ดำเนินการ 54 รายการ = 14.06%
แล้วเสร็จ 327 รายการ = 85.16%
ยกเลิก 3 รายการ = 0.85%
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลืออื่นเพื่อดำเนินการแล้ว

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 19,667 ไร่ = 11,607 ไร่ 59.02%
ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 6.56 ล้าน ลบ.ม. 24.31%
พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 143,369 ไร่ 68.38%
ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน = 46,004 ครัวเรือน 70.83%
การจ้างแรงงาน 9,716 คน = 9,716 คน 100.00%

จำนวน
รายการ

ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง

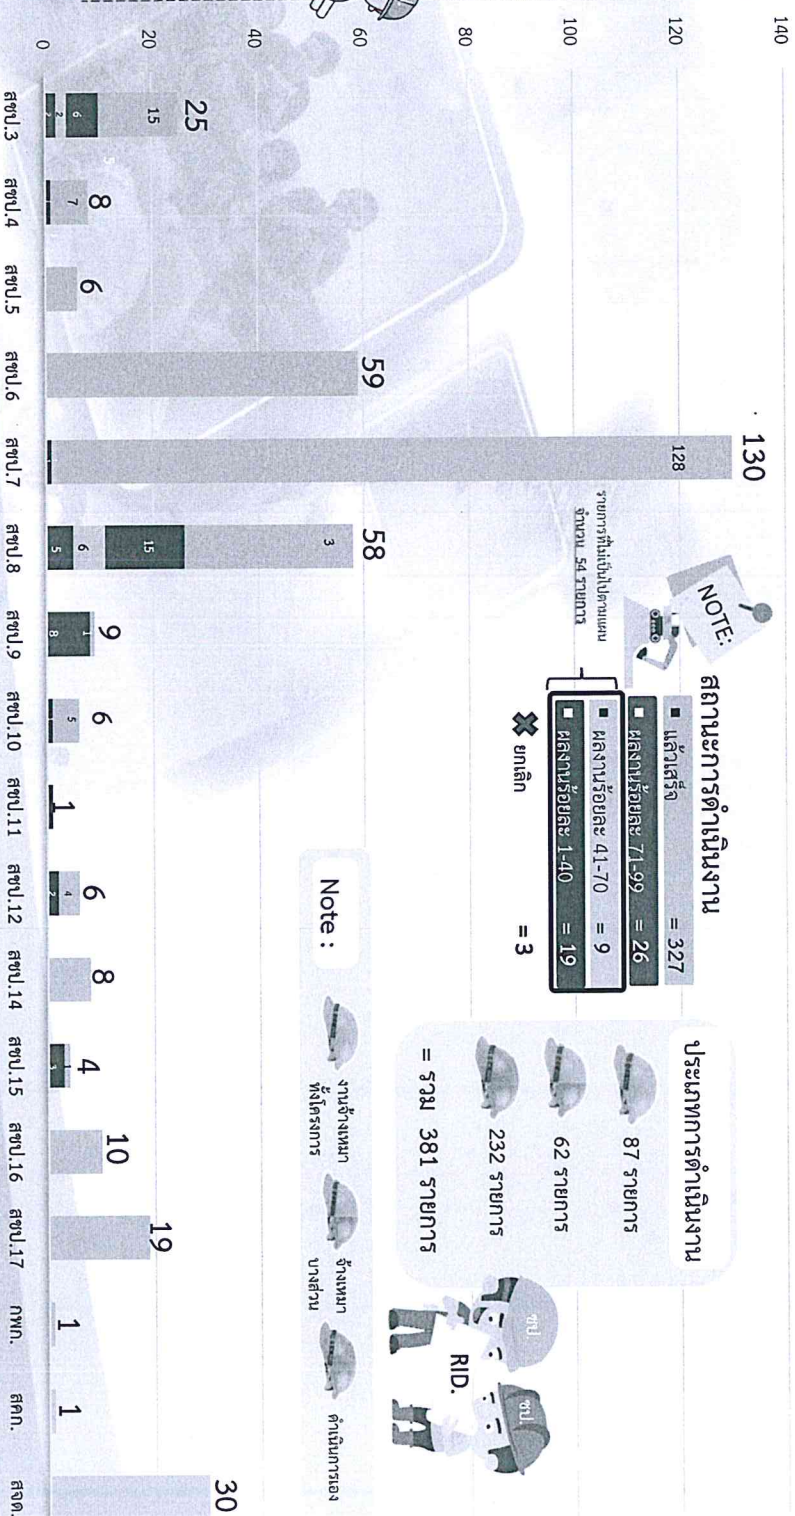

สถานะการดำเนินงาน

■ แล้วเสร็จ = 327

■ ผลงานร้อยละ 71-99 = 26

■ ผลงานร้อยละ 41-70 = 9

■ ผลงานร้อยละ 1-40 = 19

✗ ยกเลิก = 3

ประเภทการดำเนินงาน

87 รายการ

62 รายการ

232 รายการ

= รวม 381 รายการ

Note :

งานจ้างเหมา
ทั้งโครงการ

จ้างเหมา
บางส่วน

ดำเนินการเอง

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สชป.6 = 2 รายการ และสชป.7 = 1 รายการ

2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 182.84 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว



สำนัก/กอง

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564)

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

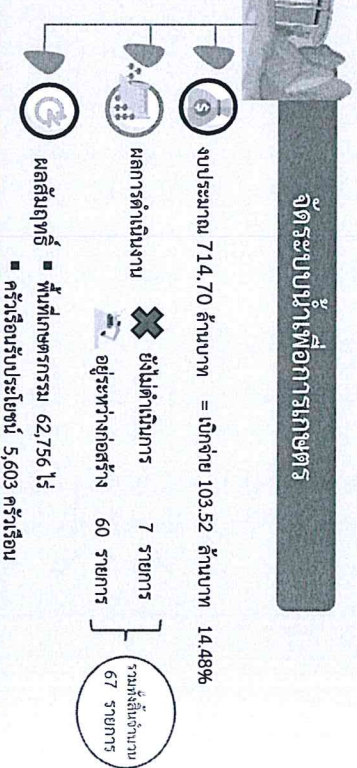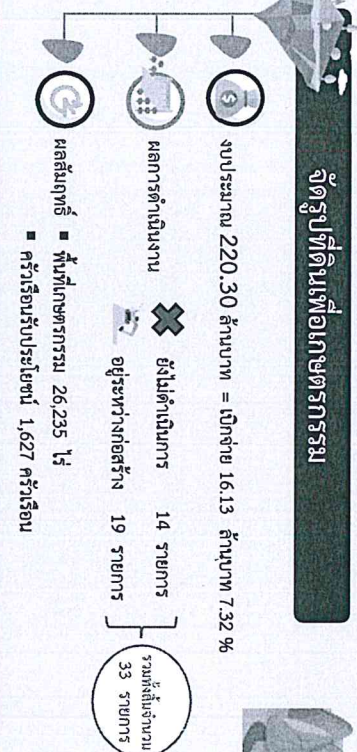

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน



ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 119.65 ล้านบาท 12.80%



ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ

ยังไม่ดำเนินการ 21 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 79 รายการ

ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,230 ครัวเรือน

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ




งบประมาณ 806.12 ล้านบาท
งบจัดสรร 221.49 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
1,541 รายการ



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	งบ พ.ร.บ. ปี 65 (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	168	2,059.7935
สชป. 1	11	83.8369
สชป. 2	1	1.0000
สชป. 3	2	3.0000
สชป. 4	13	69.6620
สชป. 5	13	45.7710
สชป. 8	2	17.5460
สชป. 9	15	91.6095
สชป. 10	19	70.4708
สชป. 11	3	35.8441
สชป. 12	3	1.0350
สชป. 13	6	63.6000
สชป. 14	24	487.2649
สชป. 15	23	130.8590
สชป. 16	2	25.4990
สชป. 17	1	5.0000
สบอ.	8	165.1892
สพญ.	4	285.3856
กพก.	10	188.0363
สลก.	2	47.5842
สวพ.	1	1.4000
สดก.	2	4.2000
สจด.	1	20.0000
Lump Sum	2	216.0000

รายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 168 รายการ)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 168 รายการ			2,059,793,500.00
1	สขป. 1	(1.1648) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะกอกอุดมธรา จังหวัดเชียงใหม่ - [3840]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
2	สขป. 1	(1.1537) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [3729]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
3	สขป. 1	(1.1434) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำโอง่าง โครงการชลประทานลำพูน ปริมาณดิน 35,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [3626]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,035,000
4	สขป. 1	(1.1210) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ปริมาณดิน 29,907 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ - [3402]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	488,500
5	สขป. 1	(1.1209) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ปริมาณดิน 26,168 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ - [3401]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	427,300
6	สขป. 1	(1.1208) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ปริมาณดิน 26,791 ลูกบาศก์เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [3400]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	437,500
7	สขป. 1	(1.1207) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ปริมาณดิน 20,037 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่แดง อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ - [3399]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	457,800
8	สขป. 1	(4) ถนนทางเข้าห้วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ตำบลแม่แดงอำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กม. - [2133]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,787,500
9	สขป. 1	(3) ถนนพาราเอสพีลหัดรอบแก้มลิงฝ่ายแม่แดง แห่งที่ 1 , 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ตำบลแม่แดง อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.150 กม. - [2132]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,525,000
10	สขป. 1	(1.671) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน - [1611]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	1,500,000
11	สขป. 1	(1.1464) ค่าควคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ - [3656]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	178,300
12	สขป. 2	(1.1808) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง จังหวัดลำปาง - [4000]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
13	สขป. 3	(1.2032) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC.2)โครงการน้ำริดช่วง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ - [4224]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
14	สขป. 3	(1.1884) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ - [4076]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
15	สขป. 4	(139) ปรับปรุงคลองยมเก่าปากน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2ตำบลปากน้ำ อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย - [9399]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,000,000
16	สขป. 4	(1.2077) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตคดคลอง LMC กม.56+000 ถึง 57+492 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่แดง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [4269]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
17	สขป. 4	(1.2067) ซ่อมแซมตลิ่งและฝายแม่คำมี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - [4259]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
18	สขป. 4	(1.2064) ขุดลอกตะกอนคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 16 สาย ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [4256]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,550,000
19	สขป. 4	(1.1122) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 252,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - [3314]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
20	สขป. 4	(1.1121) ขุดลอกตะกอนทราย โดยรถขุดดำเนินการเอง หน้า ปตร.หินชะโก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปริมาณดิน 252,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [3313]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
21	สขป. 4	(1.1120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC หนองขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัวขี้ยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [3312]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,570,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
22	สขป. 4	(1.1119) ขุดลอกคลองโดยรถดูดน้ำดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หองงขวัญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบล ตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - [3311]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,400,000
23	สขป. 4	(1.87) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม พื้นที่ชลประทาน 196,000 ไร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - [2279]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,142,000
24	สขป. 4	(8) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC-วังบัว กม.0+813 ถึง กม.5+783โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังบัว ระยะทาง 4.970 กิโลเมตร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [2137]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	14,000,000
25	สขป. 4	(1.10) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณหัวงาน ระยะทาง 1.200 กม. โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - [2071]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
26	สขป. 4	(1.34) ปรับปรุง ทบ.ปากคลอง กม.4+793 (เกษตรแปลงใหญ่มหาชัย) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาห้วยทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - [602]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
27	สขป. 4	(1.33) ปรับปรุง ทบ.ปากคลอง กม.4+004 (เกษตรแปลงใหญ่มหาชัย) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาห้วยทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - [601]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
28	สขป. 5	(1.2468) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [4660]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
29	สขป. 5	(1.2410) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมกาวปี จังหวัดอุดรธานี - [4602]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
30	สขป. 5	(1.1493) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย - [3685]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	876,000
31	สขป. 5	(1.1443) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชำโดยรถดูดดำเนินการเอง โครงการชลประทานบึงกาฬ ปริมาณดิน 250,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโซ อำเภอน้ำโสม จังหวัดบึงกาฬ - [3635]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
32	สขป. 5	(1.1442) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินสั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย - [3634]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
33	สขป. 5	(1.13) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 2 คัน จังหวัดอุดรธานี - [1719]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	930,000
34	สขป. 5	(1.388) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปริมาณดินขุด 11,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [1328]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	500,000
35	สขป. 5	(1.382) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [1322]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	480,000
36	สขป. 5	(1.379) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [1319]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	460,000
37	สขป. 5	(1.377) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายดอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลพัง ขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [1317]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	475,000
38	สขป. 5	(1.373) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [1313]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	450,000
39	สขป. 5	(18) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองปะโคพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบล ปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [734]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
40	สขป. 5	(1.67) ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบล แชล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [155]	ผลผลิตการจัดกรงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000
41	สขป. 8	(1.1485) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ - [3677]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	546,000
42	สขป. 8	(106) แก้มลิงห้วยคล้า บ้านคลองสุดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 250,000.00 ลบ. ม. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุนยี่ จังหวัดศรีสะเกษ - [9170]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	งานปีเดียว	17,000,000
43	สขป. 9	(258) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [8904]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	งานปีเดียว	25,000,000
44	สขป. 9	(224) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ Spillway อ่างเก็บน้ำดอกกราย พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [8870]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
45	สขป. 9	(1.3879) ซ่อมแซมบานระบายน้ำบ้านช้าง ขนาด 1.20x1.50 ม. พร้อมหินเรียงด้านท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลองหลวง รัชโชไพร ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ - [6071]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,250,000
46	สขป. 9	(1.3789) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.38+235 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากลองสิริ ตำบลคูยาดใหม่ อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [5981]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	420,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
47	สขป. 9	(1.3754) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล จังหวัดนครนายก - [5946]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
48	สขป. 9	(1.3742) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.2+500 ถึง กม.3+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก - [5934]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
49	สขป. 9	(1.3741) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [5933]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
50	สขป. 9	(1.3701) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง - [5893]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
51	สขป. 9	(1.3506) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำบางพระ สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี - [5698]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
52	สขป. 9	(1.1258) จัดเหมาขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+500 ถึง กม.22+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [3450]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	470,000
53	สขป. 9	(1.1257) จัดเหมาขุดลอกคลองระบาย ฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ระยะทาง 3,300 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [3449]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	489,000
54	สขป. 9	(1.841) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน พื้นที่ 157 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - [3033]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	507,800
55	สขป. 9	(28) ซ่อมสร้างฝั้วทางเข้าห้วงงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชู่นด้านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000
56	สขป. 9	(1.1483) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดระยอง - [3675]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,245,000
57	สขป. 9	(1.1473) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปราจีนบุรี - [3665]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	227,700
58	สขป. 10	(60) แก้มลิงลำบางชัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านแปง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [9124]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
59	สขป. 10	(58) แก้มลิงคลองบางเขม ปริมาตรเก็บกัก 0.28 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [9122]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
60	สขป. 10	(1.4260) ซ่อมแซมโครงการชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [6452]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
61	สขป. 10	(1.4254) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6446]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
62	สขป. 10	(1.4252) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หลังทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแหม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี - [6444]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
63	สขป. 10	(1.4218) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [6410]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
64	สขป. 10	(1.4097) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี - [6289]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
65	สขป. 10	(1.4094) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.3+000 ถึง กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลหนองขนก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6286]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
66	สขป. 10	(1.4093) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตูคลองห้วยป่าฝ้าย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [6285]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000
67	สขป. 10	(1.4088) ซ่อมแซมแผ่นคาคอนกรีตคลองส่งน้ำ 7 ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ 1,000 ตร.ม. ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี - [6280]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	600,000
68	สขป. 10	(1.4085) ซ่อมแซมคันคลองทวกสาวยาน ฝั่งขวา กม.7+000 ถึง กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดสระบุรี - [6277]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	940,000
69	สขป. 10	(1.4065) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [6257]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
70	สขป. 10	(1.4063) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ผังขวา กม.2+335 ผังขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [6255]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000
71	สขป. 10	(1.4062) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.21+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - [6254]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000
72	สขป. 10	(1.4053) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [6245]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000
73	สขป. 10	(1.4005) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [6197]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
74	สขป. 10	(1.3883) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท - [6075]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
75	สขป. 10	(1.1259) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำสาย 5 กม.0+000-กม. - 1+500 ปริมาณดิน 7,300 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - [3451]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	360,000
76	สขป. 10	(1.1484) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลพบุรี - [3676]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	460,800
77	สขป. 11	(122) ปรับปรุงคันกันน้ำจากอาคารปลายคลองถึงคลองพระยาบรรลือตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9382]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,082,500
78	สขป. 11	(1.4370) ซ่อมแซมคันกันน้ำพระยาบรรลือฝั่งเหนือ กม.0+000-2+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [6562]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	650,000
79	สขป. 11	(1.1471) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี - [3663]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	111,600
80	สขป. 12	(1.1461) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชัยนาท - [3653]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	150,000
81	สขป. 12	(1.1497) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุทัยธานี - [3689]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	585,000
82	สขป. 12	(1.1492) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี - [3684]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	300,000
83	สขป. 13	(1.171) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง ค-ส-ร. 11ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.2+400 ขนาด 6.00 x 27.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม - [1927]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,500,000
84	สขป. 13	(88) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 6อาว-สองพี่น้อง กม.0+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [804]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
85	สขป. 13	(1.94) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [662]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
86	สขป. 13	(1.93) ปรับปรุงท่อลอดถนน ค-ส-ร.1ขวา-นครชัยศรี กม.5+500 ของคันกันน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี - [661]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
87	สขป. 13	(1.92) ปรับปรุงท่อน้ำฝั้งซ้าย คลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลา กม.8+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม - [660]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
88	สขป. 13	(1.238) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่าวทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [326]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000
89	สขป. 14	(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งชุมชนบ้านเขาน้อยฝั่งตะวันออก อ.ปราณบุรีตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [9352]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	35,000,000
90	สขป. 14	(232) อาคารบังคับน้ำคลองบางไทรพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - [8878]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	16,529,000
91	สขป. 14	(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำปราณบุรี ปริมาณ 501,000ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จุดที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [8471]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
92	สขป. 14	(1.5549) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [7741]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
93	สขป. 14	(1.5529) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี - [7721]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
94	สขป. 14	(1.5460) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [7652]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	970,000
95	สขป. 14	(1.1332) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 46ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 27,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [3524]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,007,000
96	สขป. 14	(1.1315) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 34 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [3507]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
97	สขป. 14	(1.525) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2717]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	400,000
98	สขป. 14	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2172]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
99	สขป. 14	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [2117]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,860,000
100	สขป. 14	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [2116]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,100,000
101	สขป. 14	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [2115]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,270,000
102	สขป. 14	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2114]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,080,000
103	สขป. 14	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [2113]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000
104	สขป. 14	(1.51) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-5ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [2112]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,500,000
105	สขป. 14	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2111]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,540,000
106	สขป. 14	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [2110]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,850,000
107	สขป. 14	(1.20) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 3 คัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1726]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	714,000
108	สขป. 14	(45) ปรับปรุงอาคารรับน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1672]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	15,000,000
109	สขป. 14	(100) โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [816]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	260,000,000
110	สขป. 14	(97) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำมรสุม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [813]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	65,000,000
111	สขป. 14	(1.99) ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้า โครงการอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [667]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,560,000
112	สขป. 14	(1.1472) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [3664]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,434,900
113	สขป. 15	(162) อ่างเก็บน้ำสำนักสงฆ์หมื่นไพร ปริมาตรเก็บกัก 0.020 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลประสัค อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8808]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	18,000,000
114	สขป. 15	(1.5694) ซ่อมแซมเครื่องกวนบานระบายน้ำฝายไม้เสียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7886]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	300,000
115	สขป. 15	(1.5690) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายปลัด ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7882]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000
116	สขป. 15	(1.5682) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.10+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7874]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	750,000
117	สขป. 15	(1.5681) ปรับปรุงท่อลอดท่อส่งน้ำบ้านควนมีชัย กม.1+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7873]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	850,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
118	สขป. 15	(1.5634) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายคลองท่าดี ช่วง กม.3+500 - 6+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7826]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	480,000
119	สขป. 15	(1.5555) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช - [7747]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
120	สขป. 15	(1.1194) โครงการขุดลอกคลอง 3R-MD3 (คลองวัดลาว) ด้วยรถขุดดำเนินการเอง ปริมาณดินขุด 68,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [3386]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
121	สขป. 15	(1.555) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ จังหวัดกระบี่ - [2747]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
122	สขป. 15	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายคลองไม้เลี้ยวระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ อำเภอลำปลายงู จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2174]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	50,000,000
123	สขป. 15	(1.177) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองชักน้ำสาย 3L-MD8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [1933]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
124	สขป. 15	(1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 18.586 กิโลเมตร ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ - [1869]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,978,000
125	สขป. 15	(1.595) ขุดลอกตะกอนดินแก้มลิง ปริมาณดิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยรถขุดดำเนินการเอง อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหุบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [1535]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	2,500,000
126	สขป. 15	(113) ประตูปรับน้ำบ้านห้วยลึก ขนาดบาน 4.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอลำปลายงู จังหวัดนครศรีธรรมราช - [829]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000
127	สขป. 15	(1.127) อาคารป้องกันกีดขวางน้ำ ปตร.คลองชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [695]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,200,000
128	สขป. 15	(1.125) ปรับปรุงท่อลอดถนน MD1 กม.6+120 - กม. 6+840 ไม้เสียบขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลนาหลวง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [693]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
129	สขป. 15	(1.124) อาคารบังคับน้ำเหมืองนายทั้ง ขนาด 2.00x2.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [692]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,200,000
130	สขป. 15	(1.320) อาคารสำนักงานขนาดกลาง จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้าง สขป.15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [408]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,900,000
131	สขป. 15	(1.306) ซ่อมแซมคันลัดน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหลุมพอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [394]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	815,000
132	สขป. 15	(1.304) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [392]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
133	สขป. 15	(1.288) อาคารที่ทำการส่วนแผนงาน ภายในที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [376]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
134	สขป. 15	(1.1459) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดกระบี่ - [3651]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,371,000
135	สขป. 15	(1.1468) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [3660]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	315,000
136	สขป. 16	(197) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองภูมิ โครงการชลประทานสงขลาตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา - [9457]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	25,000,000
137	สขป. 16	(1.636) ซ่อมแซมทางเข้าห้วงงาน ฝ่ายบ้านไร่เหนือ พรต. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [1576]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	499,000
138	สขป. 17	(1.73) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณห้วงงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [76]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
139	สกค.	(1.752) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย ปริมาณ 34,297 ต้น ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [2944]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
140	สกค.	(1.77) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ UNIT SUBSTATION ภายในกรมชลประทาน สามเสน ตำบลแขวงถนนนครไชยศรี อำเภอเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [80]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,200,000

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
141	สลก.	(10) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [557]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานผูกพันใหม่	46,742,000
142	สลก.	(1.460) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [548]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	842,200
143	สบอ.	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	160,193,000
144	สบอ.	(1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,534,400
145	สบอ.	(1.17) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [1968]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	242,400
146	สบอ.	(1.441) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [529]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000
147	สบอ.	(1.432) ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [520]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
148	สบอ.	(1.370) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ. 2565 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [458]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	117,000
149	สบอ.	(1.369) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ จำนวน 1 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2565 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [457]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	64,800
150	สบอ.	(1.367) ค่าจัดทำเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - [455]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	37,600
151	สพญ.	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [9566]	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโหล่ จังหวัดระยอง	งานปีเดียว	8,000,000
152	สพญ.	(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 1+260 โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - [9265]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	129,385,600
153	สพญ.	(65) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - [8711]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	43,000,000
154	สพญ.	(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน - [8523]	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	งานปีเดียว	105,000,000
155	สวพ.	(1.451) ซ่อมแซมอาคารดินวิศวกรรม 1 พร้อมซ่อมเครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ห้องทดลอง สำนักวิจัยและพัฒนา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [539]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000
156	กพก.	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9550]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	79,780,000
157	กพก.	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [9533]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	3,000,000
158	กพก.	(202) อาคารประกอบคลองระบายน้ำ โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง(ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง - [9462]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	15,900,000
159	กพก.	(1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา - [9232]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	1,588,900
160	กพก.	(1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมอไค้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - [9063]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	9,000,000
161	กพก.	(54) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคม อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา - [8700]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	70,000,000
162	กพก.	(1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด - [8628]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,575,000
163	กพก.	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด - [8626]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,521,700
164	กพก.	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [8625]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	1,695,700

ลำดับ	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบ พ.ร.บ. ปี 65
165	กพก.	(1.12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ - [8619]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	2,975,000
166	สจด.	(150) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 06 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อสาย 002) ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลตะโหมด อำเภอดะโหมด จังหวัดพัทลุง - [866]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
167	Lump Sum	(199) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร - [9459]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	200,000,000
168	Lump Sum	(3) ค่าปีดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [9067]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	16,000,000
