



บันทึกข้อความ

ผ.บ. ๐. 415

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กผง ๐๖/ ๔๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online กองแผนงาน พ. 469

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามบันทึกที่ กผง ๐๖/๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบ พ.ร.บ.) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเสนอผู้บริหาร เป็นประจำทุก ๑๕ วันพบว่า ผลเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน สืบเนื่องจากผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม Online วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗๒๐.๙๐ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของกองการเงินและบัญชีตามบันทึกที่ E ผคก. ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๗๗.๐๓ ล้านบาท ซึ่งผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม Online น้อยกว่า เป็นเงิน ๓๕๖.๑๓ ล้านบาท โดยมีบางสำนัก/กอง บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online น้อยกว่า GFMIS เช่น สอส.บันทึกในระบบติดตาม Online น้อยกว่า GFMIS จำนวน ๓.๓๑ ล้านบาท สพญ.บันทึกในระบบติดตาม Online น้อยกว่า GFMIS จำนวน ๒๔๒.๕๕ ล้าน และ กพก. บันทึกในระบบติดตาม Online น้อยกว่า GFMIS จำนวน ๑๐๖.๗๓ ล้านบาท เป็นต้น (รายละเอียดตามที่แนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้หน่วยงานของท่านบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อกองแผนงานจะนำข้อมูลในระบบติดตาม online ทุก ๑๕ วันมาสรุปจัดทำรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)

ผวน. ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

เรียน ผอ.สอช., ผอ.ส.ค., ทน๑ - ส.ผอ.

และ ผอ.ท.ผอ. (งม.ผอ.)

เพื่อมีมติพิจารณาการดำเนินการ

(นายธีระพล สังสมบุญ)

ผส.บอ

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓

เปรียบเทียบผลเบิกจ่ายระหว่างระบบติดตาม Online กับ GFMIS

สำนัก/กอง	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
	Online	GFMIS	ผลต่าง
รวม	720.90	1,077.03	-356.13
สบก.	9.78	8.53	1.25
สอส.	1.38	4.69	-3.31
สพญ.	318.33	560.88	-242.55
กพก.	381.20	487.93	-106.73
สขป.1	0.00		0.00
สขป.2	0.00		0.00
สขป.3	0.00		0.00
สขป.4	0.61		0.61
สขป.5	9.59	15.00	-5.41
สขป.6	0.00		0.00
สขป.7	0.00		0.00
สขป.8	0.00		0.00
สขป.9	0.00		0.00
สขป.10	0.00		0.00
สขป.11	0.00		0.00
สขป.12	0.00		0.00
สขป.13	0.00		0.00
สขป.14	0.00		0.00
สขป.15	0.00		0.00
สขป.16	0.00		0.00
สขป.17	0.00		0.00

ข้อมูลจากระบบติดตาม Online วันที่ 15 มกราคม 2563

ข้อมูลจาก GFMIS วันที่ 13 มกราคม 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๔๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบ พ.ร.บ.)

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนจากระบบติดตาม Online ต่ำกว่าจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จำนวน ๓๗๘.๑๖ ล้านบาท นั้น

ในการนี้ ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าว และอัปโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มีบันทึกข้อความเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บันทึกข้อความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online กองแผนงาน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเสนอกรมเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา เพ็งคำ)

ผวน.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

สายงาน/สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน																		
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน รายการ ทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)				อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562		ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562		จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำข้อมูลกัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
						จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ ลดลง 30.70%	งบประมาณ(ล้านบาท) ลดลง 23.80%										
รวมทั้งสิ้น	60,309.85	1,932.51	720.90	37.30	8,302	3,984	32,079.89	1,435	17,723.53	6,772	37,369.87	95	5,216.45	83	1	5	1	3	2
บริหาร	4,621.63	-	-	-	248	219	816.66	-	-	248	4,621.63	-	-	-	-	-	-	-	-
สมด.	3,626.50	-	-	-	20	-	-	-	-	20	3,626.50	-	-	-	-	-	-	-	-
สคก.	995.13	-	-	-	228	219	816.66	-	-	228	995.13	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	33,145.65	76.64	10.20	13.31	7,566	3,462	19,087.94	1,157	6,599.59	6,404	26,392.72	5	153.34	5	-	-	-	-	-
สขป.1	1,209.86	-	-	-	313	147	561.27	7	62.16	306	1,147.70	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.2	1,213.20	-	-	-	331	181	1,046.33	131	516.54	200	696.66	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.3	1,140.13	-	-	-	323	192	972.60	47	197.08	276	943.04	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.4	1,483.48	2.10	0.61	29.28	402	100	755.03	16	109.46	385	1,374.02	1	-	1	-	-	-	-	-
สขป.5	2,260.70	15.00	9.59	63.92	424	213	1,074.84	19	141.12	404	2,099.58	1	20.00	1	-	-	-	-	-
สขป.6	3,321.74	-	-	-	440	50	924.91	10	135.46	430	3,186.29	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.7	2,842.12	-	-	-	570	108	640.21	23	152.73	547	2,689.38	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.8	2,902.88	-	-	-	528	299	2,452.17	91	790.90	437	2,111.98	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.9	2,855.36	59.54	-	-	634	196	1,112.01	89	384.83	542	2,337.19	3	133.34	3	-	-	-	-	-
สขป.10	1,120.65	-	-	-	467	371	1,025.41	269	866.50	198	254.15	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.11	1,857.61	-	-	-	487	242	1,605.93	44	132.90	443	1,724.71	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.12	2,644.67	-	-	-	652	321	1,786.43	5	89.77	647	2,554.90	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.13	1,062.16	-	-	-	505	195	662.59	2	2.05	503	1,060.12	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.14	2,481.97	-	-	-	246	123	1,872.80	112	1,817.00	134	664.97	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.15	1,421.47	-	-	-	442	157	536.22	38	158.95	404	1,262.52	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.16	1,907.96	-	-	-	414	293	965.52	45	226.37	369	1,681.59	-	-	-	-	-	-	-	-
สขป.17	956.24	-	-	-	213	135	695.08	127	634.07	86	322.17	-	-	-	-	-	-	-	-
สบอ.	463.44	-	-	-	175	139	398.59	82	181.70	93	281.74	-	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้าง	21,312.94	1,805.27	699.53	38.75	377	222	11,169.99	202	10,131.99	108	6,263.50	67	4,917.45	55	1	5	1	3	2
กพก.	12,324.00	740.82	381.20	51.46	191	104	5,774.72	96	5,361.42	64	4,800.50	31	2,162.08	25	-	2	1	3	-
สพญ.	8,987.88	1,064.46	318.33	29.91	184	116	5,394.20	104	4,769.51	44	1,463.00	36	2,755.36	30	1	3	-	-	2
สจค.	1.06	-	-	-	2	2	1.06	2	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิชาการ	1,077.53	50.60	11.17	22.07	74	51	852.35	50	839.85	12	92.02	12	145.66	12	-	-	-	-	-
สบก.	452.33	45.20	9.78	21.64	29	20	341.00	20	337.00	-	-	9	115.33	9	-	-	-	-	-
สสร.	475.27	-	-	-	38	27	391.75	26	383.25	12	92.02	-	-	-	-	-	-	-	-
สอส.	149.93	5.40	1.38	25.65	7	4	119.60	4	119.60	-	-	3	30.33	3	-	-	-	-	-
หมายเหตุ : งบล่าช้า	152.10	-	-	-	37	30	152.96	26	152.10	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน																
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำซื้อผูกพัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	60,309.85	1,932.51	720.90	37.30	8,302	1,435	17,723.53	6,772	37,369.87	95	5,216.45	83	1	5	1	3	2
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	2,078.91	27.00	-	-	1,596	226	275.74	1,368	1,712.43	2	90.75	2	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,956.69	-	-	-	460	58	389.82	402	1,566.87	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ	2,119.81	-	-	-	208	18	144.02	190	1,975.79	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	6,108.99	-	-	-	4,616	688	1,100.74	3,928	5,008.25	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,248.07	2.10	0.61	29.28	30	6	163.20	24	1,084.88	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	66.50	-	-	-	3	3	66.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	685.39	-	-	-	12	3	60.60	9	624.79	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาติ	1,402.22	-	-	-	23	7	870.92	16	531.30	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,022.91	-	-	-	98	6	232.52	92	2,790.39	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม	1,066.52	-	-	-	25	10	468.90	15	597.62	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงดุมธราฯ จังหวัด	537.64	236.56	62.83	26.56	14	4	22.30	4	173.10	6	342.24	5	1	-	-	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	407.68	15.00	-	-	8	4	44.35	2	82.64	2	280.69	2	-	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	437.29	70.00	11.41	16.30	11	8	294.88	1	2.45	2	139.96	1	-	1	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	223.81	-	-	-	8	6	169.81	1	54.00	1	-	1	-	-	-	-	-
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	265.74	74.00	18.75	25.34	12	7	91.97	1	2.50	4	171.28	4	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	737.92	303.96	142.35	46.83	9	-	-	6	42.42	3	695.50	-	-	2	-	-	1
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	193.48	-	-	-	5	-	-	4	160.00	1	33.48	1	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	42.76	20.00	-	-	4	1	0.74	-	-	3	42.03	3	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,086.89	12.95	-	-	352	91	1,620.01	260	4,453.94	1	12.95	1	-	-	-	-	-
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,493.82	535.10	280.53	52.43	417	164	5,222.52	216	11,569.68	37	1,701.62	32	-	2	1	1	1
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,164.96	478.66	193.17	40.36	223	71	2,512.09	124	4,442.99	28	1,209.88	26	-	-	-	2	-
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	158.32	15.00	-	-	110	7	67.30	102	68.92	1	22.10	1	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	103.59	-	-	-	8	6	103.59	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
โครงการประจวบคายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	134.92	-	-	-	6	-	-	5	134.92	1	-	1	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,056.64	142.19	11.25	7.91	12	11	582.67	-	-	1	473.97	1	-	-	-	-	-
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,866.23	-	-	-	8	6	1,576.23	2	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำคำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	630.00	-	-	-	2	2	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประจวบคายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	108.40	-	-	-	5	5	108.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	286.90	-	-	-	5	5	286.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	387.60	-	-	-	6	6	387.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประจวบคายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	159.24	-	-	-	5	5	159.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงคลองยม-ป่าน จังหวัดสุโขทัย	70.00	-	-	-	1	1	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)



รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น 95 รายการ งบประมาณ 5,258.36 ล้านบาท
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณ 4,161.68 ล้านบาท

โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ (20.83%)
งบประมาณ 957.20 ล้านบาท (23.00%) และยังไม่ดำเนินการ จำนวน 38 รายการ (79.17%) งบประมาณ 3,204.48 ล้านบาท (77.00%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 8,159 รายการ งบประมาณ 50,900.85 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6,762 รายการ (82.88%) งบประมาณ 36,381.80 ล้านบาท (71.48%) และยังไม่ดำเนินการ 1,397 รายการ (17.12%) งบประมาณ 14,519.05 ล้านบาท (28.52%)




หมายเหตุ : ร้อยละต่องบประมาณ (พ.ร.บ.)

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

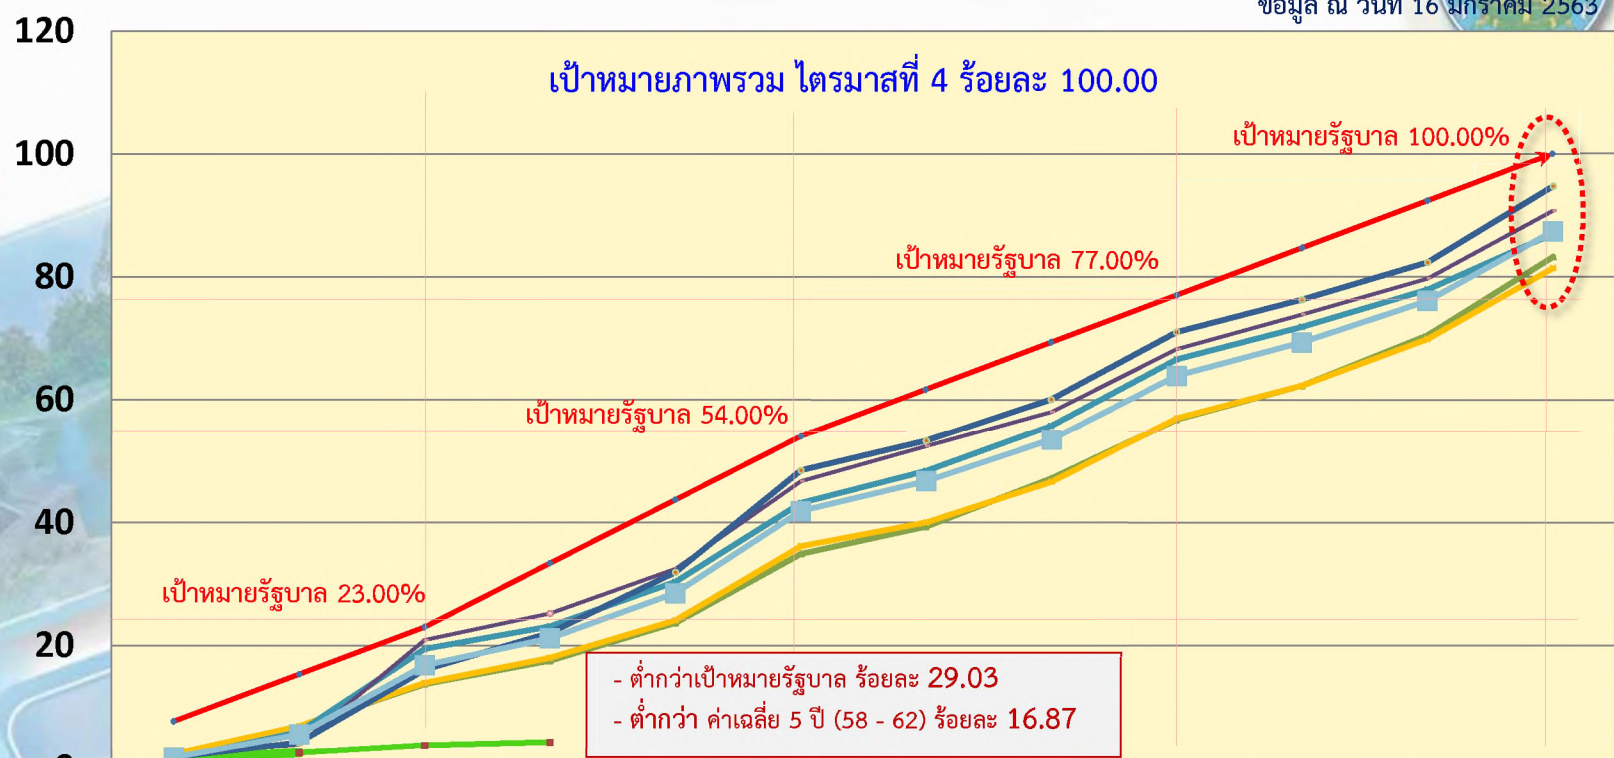


	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➡ เป้าหมายรัฐบาล ปี 63	7.66	15.33	23.00	33.33	43.66	54.00	61.66	69.33	77.00	84.66	92.33	100.00
ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	4.30								
ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
เฉลี่ย 5 ปี (58-62)	1.80	5.55	16.81	21.17	28.48	41.84	46.66	53.50	63.91	69.32	76.04	87.37

5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563



ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

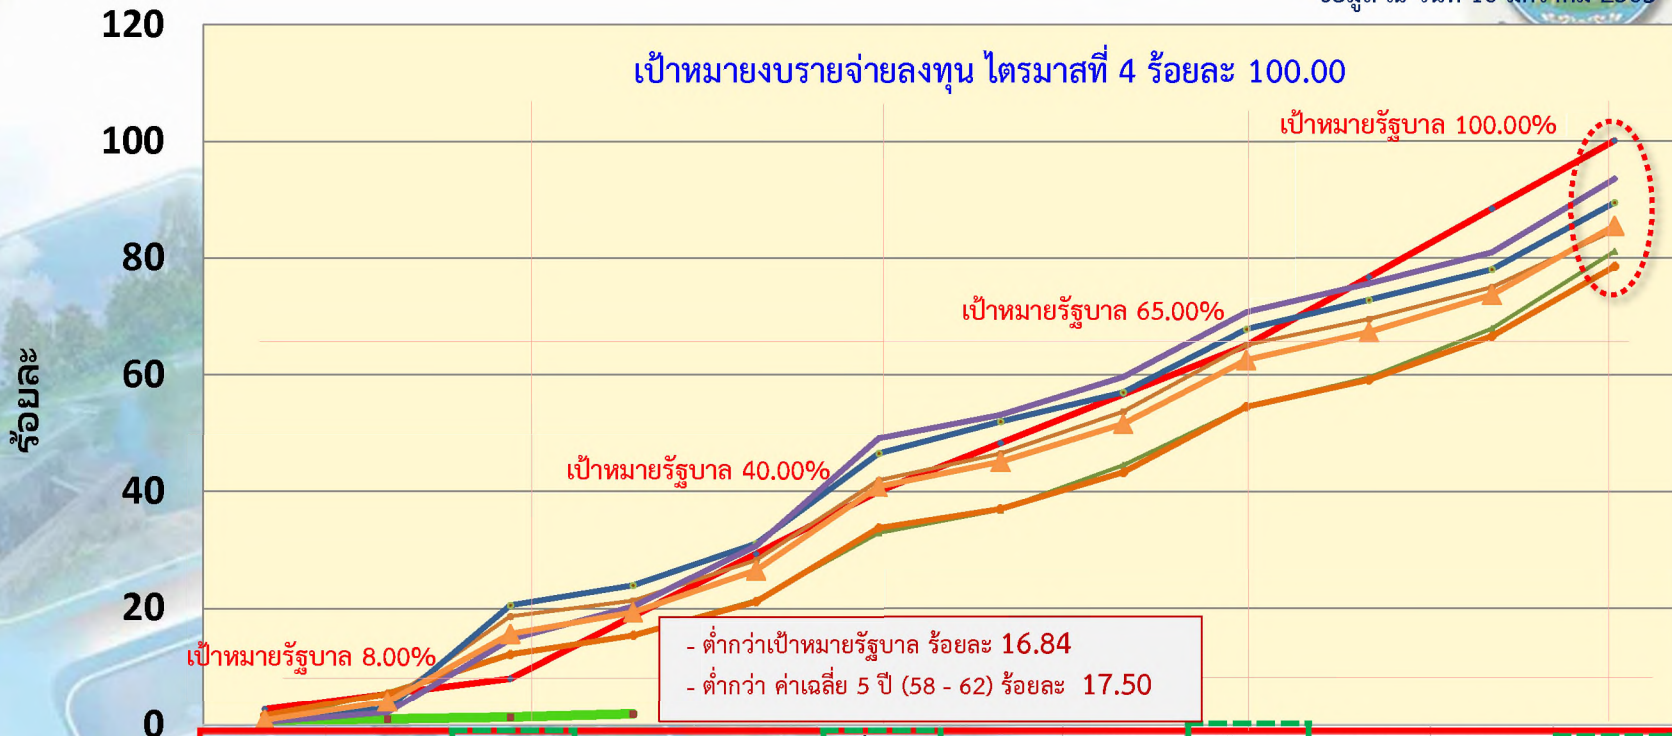

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายรัฐบาล ปี 63	2.66	5.33	8.00	18.66	29.33	40.00	48.33	56.66	65.00	76.66	88.33	100.00
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	1.82								
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
ผลปี 59 (39,089.71)	0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
ผล ปี 58 (35,529.45)	0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
เฉลี่ย 5 ปี (58 - 62)	0.78	4.01	15.68	19.32	26.52	40.83	45.13	51.62	62.52	67.29	73.66	85.42

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

ร้อยละ

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

สายงาน	งบประมาณปี 2563 (ล้านบาท)	งบประมาณ โอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
รวม	60,157.75	1,932.51	720.90	37.30
ก่อสร้าง	21,312.94	1,805.27	699.53	38.75
วิชาการ	1,077.53	50.60	11.17	22.07
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	33,145.65	76.64	10.20	13.31
บริหาร	4,621.63	-	-	-

ก่อสร้าง

วิชาการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษา

บริหาร

เป้าหมาย
เดือน ม.ค. 63
ร้อยละ 18.66


ผลเบิกจ่าย
งบลงทุนของกรม
ณ วันที่ 16 ม.ค. 63
ร้อยละ 1.82

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ยังไม่รวมงบล่าช้า จำนวน 37 รายการ งบประมาณ 152.10 ล้านบาท

กองแผนงาน



7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.63) ของสำนัก/กอง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

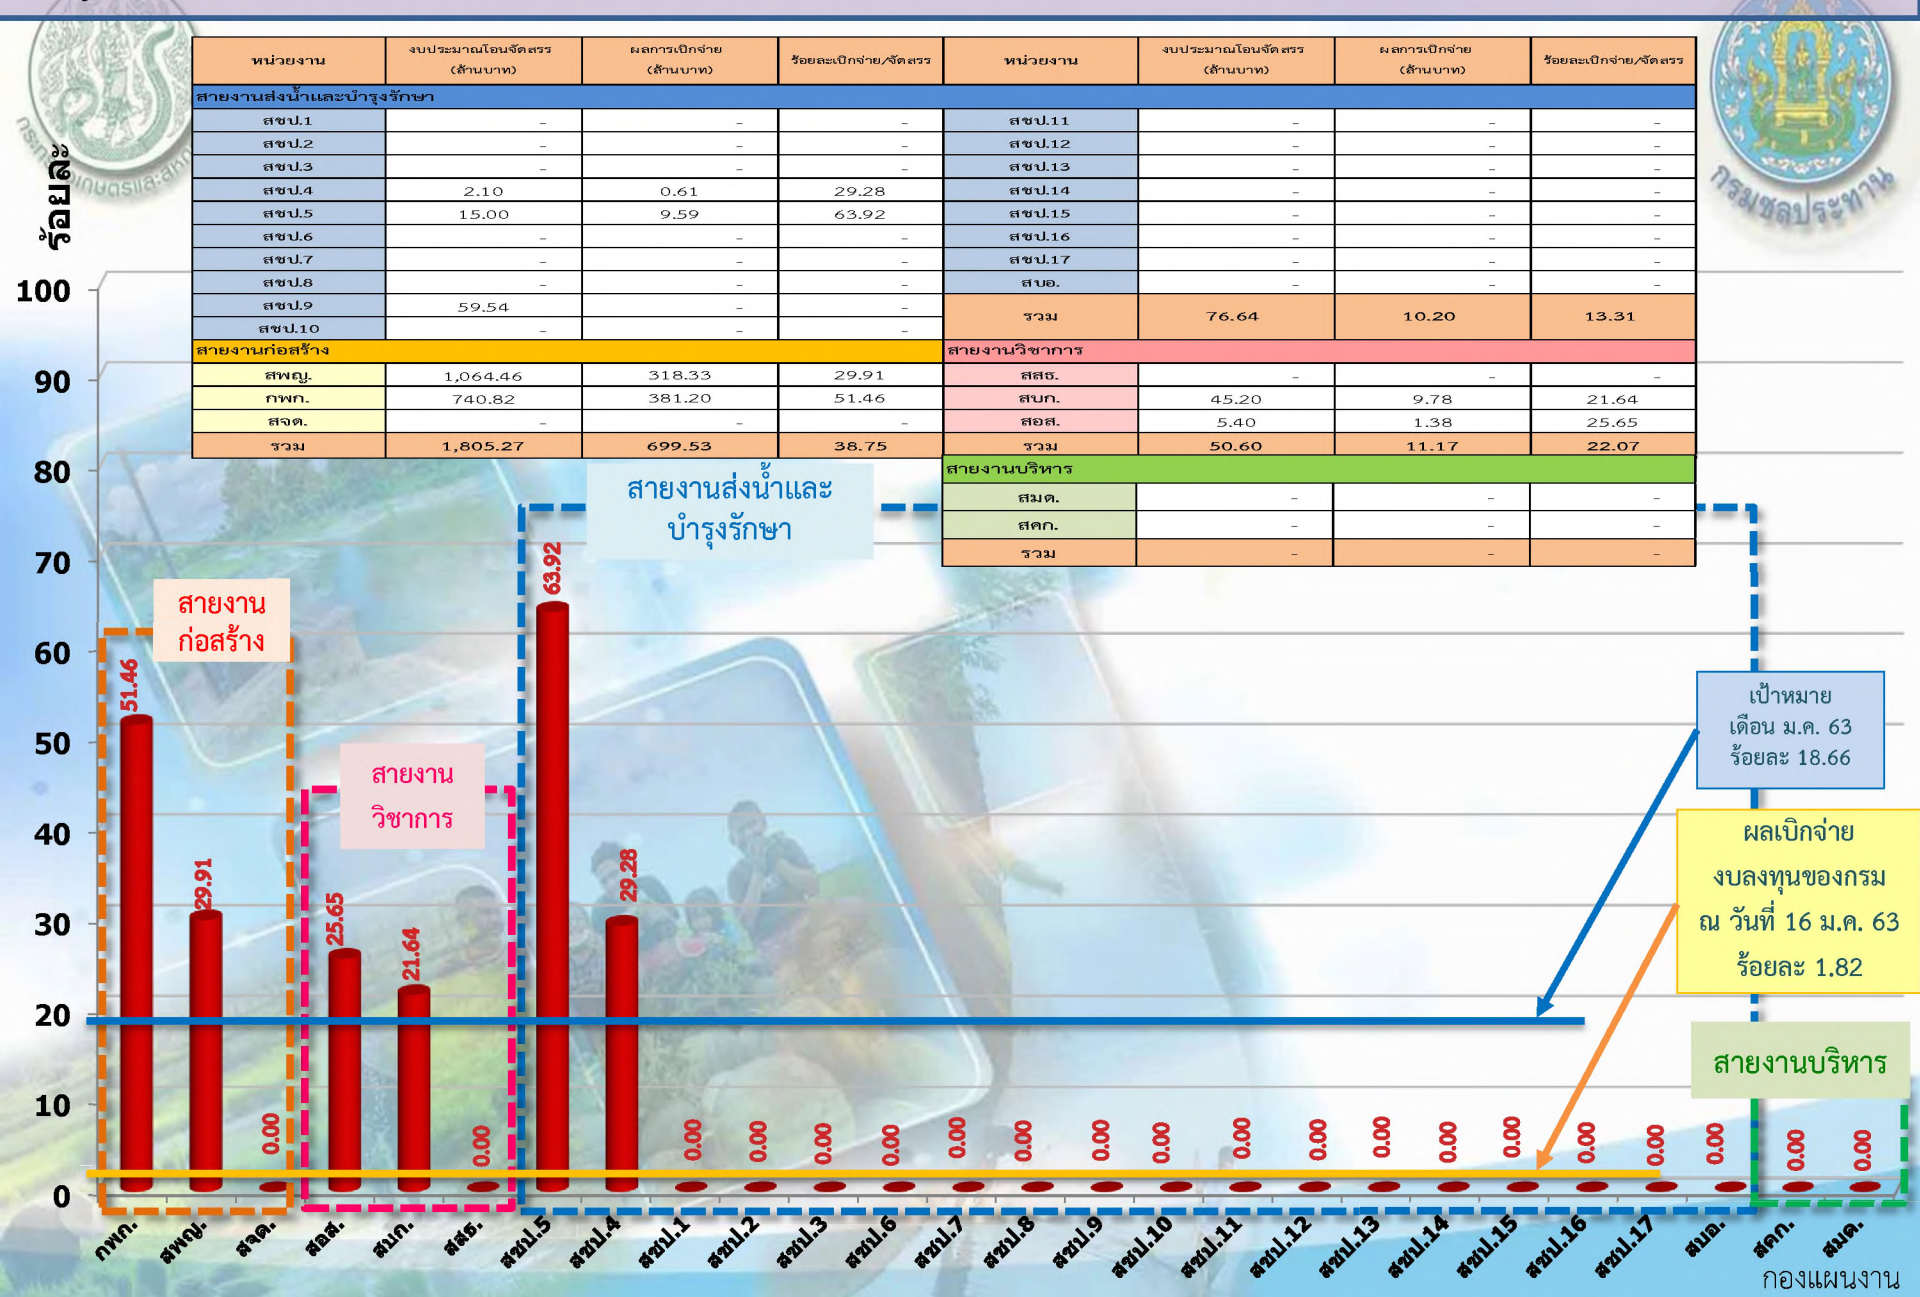


8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)

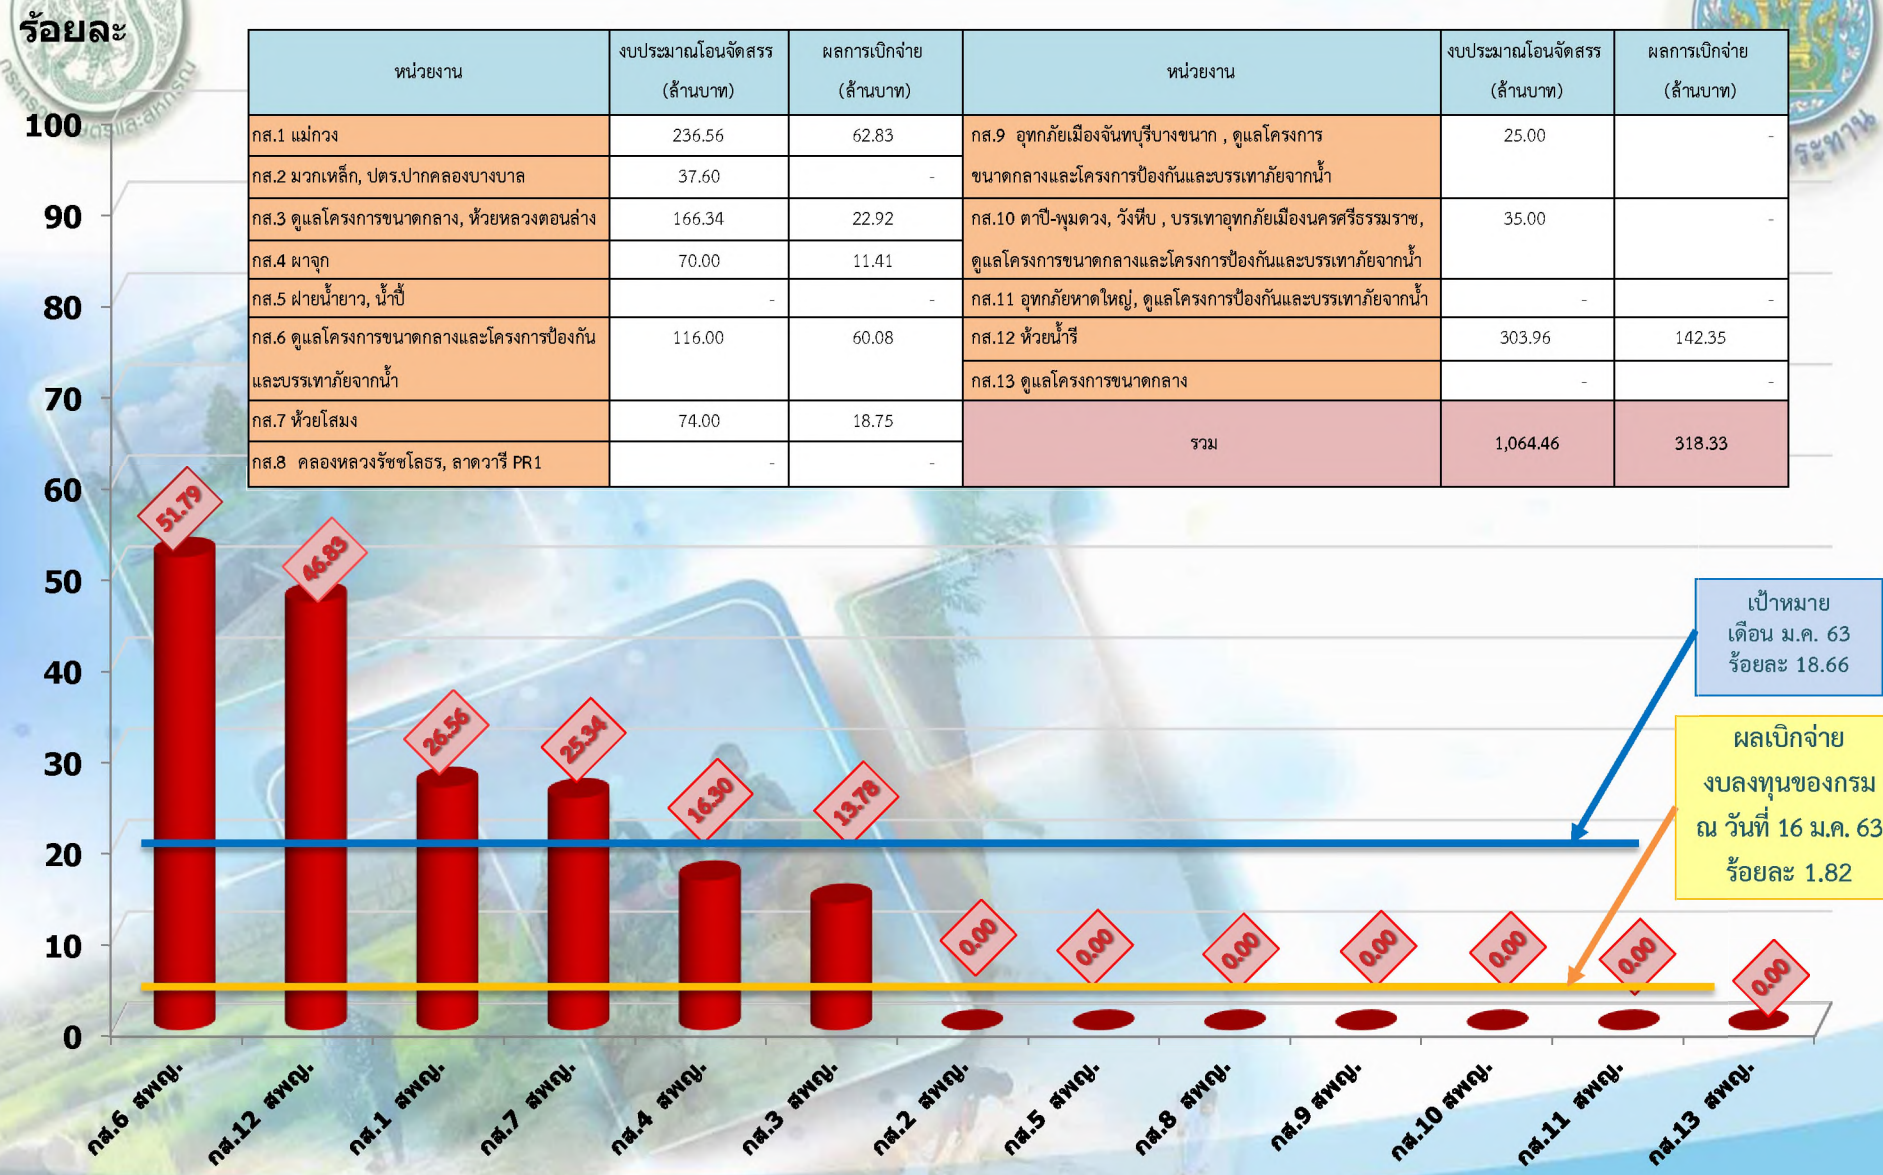

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)





บันทึกข้อความ

๑ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓ 507

กฉ.๖๗1

E ผดง. 9 / 2563

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี โทร. ๒๒๘๑

ที่ E ผดง. ๗ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.งบ.

ส่วนควบคุมงบประมาณ ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน ผอ.ผง. ทราบ

(นางสุดสงวน ศรีอนันต์) 152463

ผดง.งบ.

เรียน ผอ.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสุนทรี ใหญ่สว่าง)

ผอ.งบ.

๑ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓

- ทราบ
- เรียน ผอ.งบ. ผอ.ผง.
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑ ๖ ม.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวพิมพ์พันธ์ คำเชื่อน)

งป.๔ งบ.

๓



รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

เวลา 08.13 น.

จัดทำโดย

ส่วนควบคุมงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี

เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เงินงบประมาณ		เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)		ผูกพัน	คงเหลือ				หมายเหตุ
	เงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เงินงบประมาณ (ที่ได้รับจัดสรร)		เงิน งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เงิน งบประมาณ (ที่ได้รับ จัดสรร)		เงิน งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เงิน งบประมาณ (ที่ได้รับ จัดสรร)		เงินงบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	เงิน งบประมาณ (ที่ได้รับ จัดสรร)	ร้อยละ	
ภาพรวม	66,472.19	5,902.59	2,899.94	4.36	49.13	54.00	-49.64	-4.87	895.61	62,676.64	94.29	2,107.04	56.15	
รายจ่ายประจำ	7,936.00	3,939.60	1,822.91	22.97	46.27	57.00	-34.03	-10.73	113.86	5,999.22	-0.83	2,002.83	50.84	เอกสารแนบ 1
รายจ่ายลงทุน	58,536.19	1,962.99	1,077.03	1.84	54.87	45.00	-43.16	9.87	781.75	56,677.42	96.82	104.22	5.31	เอกสารแนบ 2

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมชลประทาน (งบประมาณ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา 08.13 น.

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	พ.ร.บ. หลังโอนเปลี่ยนแปลง (พลาถก่อน)			เงินจัดสรร			เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)		ผูกพัน	คงเหลือ	
	พ.ร.บ. หลังโอนเปลี่ยนแปลง (พลาถก่อน)	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		พ.ร.บ. หลังโอนเปลี่ยนแปลง (พลาถก่อน)	เงินจัดสรร		พ.ร.บ. หลังโอนเปลี่ยนแปลง (พลาถก่อน)	เงินจัดสรร
ภาพรวม	66,472.19	2,899.94	4.36	5,902.59	2,899.94	49.13	54.00	-49.64	-4.87	895.61	62,676.64	2,107.04
รายจ่ายประจำ	7,936.00	1,822.91	22.97	3,939.60	1,822.91	46.27	57.00	-34.03	-10.73	113.86	5,999.22	2,002.83
งบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร)	4,758.34	287.10	6.03	761.95	287.10	37.68	57.00	-50.97	-19.32	113.86	4,357.39	360.99
งบบุคลากร	3,176.71	1,535.31	48.33	3,176.71	1,535.31	48.33	57.00	-8.67	-8.67	-	1,641.40	1,641.40
เบิกแทน	0.94	0.50	53.19	0.94	0.50	53.19	57.00	-3.81	-3.81	-	0.44	0.44
รายจ่ายลงทุน	58,536.19	1,077.03	1.84	1,962.99	1,077.03	54.87	45.00	-43.16	9.87	781.75	56,677.42	104.22
งบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร)	58,536.19	1,077.03	1.84	1,962.99	1,077.03	54.87	45.00	-43.16	9.87	781.75	56,677.42	104.22
เบิกแทน	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ผลต่างร้อยละมีค่า + แสดงว่ารายการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย
: ผลต่างร้อยละมีค่า - แสดงว่ารายการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล : จากระบบ GFMS ส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

กรมชลประทาน
ผลเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งวดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	เบิกจ่ายส่วนกลาง					เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค					รวมทั้งสิ้น					
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ผูกพัน		เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ผูกพัน		เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ผูกพัน		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	2,549.33	588.54	23.09	49.20	1.93	1,390.27	1,234.36	88.79	64.67	4.65	3,939.60	1,822.91	46.27	113.86	2.89	2,002.83
ส่วนกลาง	2,433.18	473.48	19.46	48.74	2.00	-	-	-	-	-	2,433.18	473.48	19.46	48.74	2.00	1,910.97
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	55.43	54.68	98.66	0.46	0.83	11.13	8.37	75.21	1.59	14.31	66.56	63.06	94.73	2.06	3.09	1.45
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	60.72	60.39	99.45	-	-	7.06	4.57	-	0.88	12.40	67.78	64.96	95.84	0.88	1.29	1.95
สขป. 1						64.83	55.65	85.84	2.94	4.54	64.83	55.65	85.84	2.94	4.54	6.24
สขป. 2						56.81	52.74	92.84	1.32	2.32	56.81	52.74	92.84	1.32	2.32	2.75
สขป. 3						76.28	69.34	90.91	2.70	3.54	76.28	69.34	90.91	2.70	3.54	4.23
สขป. 4						57.74	53.98	93.48	0.93	1.60	57.74	53.98	93.48	0.93	1.60	2.84
สขป. 5						79.74	67.17	84.24	3.78	4.74	79.74	67.17	84.24	3.78	4.74	8.79
สขป. 6						93.13	83.61	89.78	3.17	3.40	93.13	83.61	89.78	3.17	3.40	6.35
สขป. 7						60.52	55.84	92.26	0.78	1.28	60.52	55.84	92.26	0.78	1.28	3.91
สขป. 8						93.32	83.92	89.93	3.52	3.77	93.32	83.92	89.93	3.52	3.77	5.88
สขป. 9						110.54	92.97	84.11	10.35	9.36	110.54	92.97	84.11	10.35	9.36	7.22
สขป. 10						126.22	107.64	85.28	6.25	4.96	126.22	107.64	85.28	6.25	4.96	12.33
สขป. 11						116.95	109.02	93.22	4.26	3.64	116.95	109.02	93.22	4.26	3.64	3.67
สขป. 12						135.12	122.23	90.46	5.50	4.07	135.12	122.23	90.46	5.50	4.07	7.39
สขป. 13						100.62	90.64	90.08	4.21	4.19	100.62	90.64	90.08	4.21	4.19	5.77
สขป. 14						47.20	42.42	89.89	1.51	3.20	47.20	42.42	89.89	1.51	3.20	3.26
สขป. 15						59.41	52.24	87.94	3.79	6.38	59.41	52.24	87.94	3.79	6.38	3.37
สขป. 16						49.09	42.21	85.97	4.05	8.24	49.09	42.21	85.97	4.05	8.24	2.84
สขป. 17						44.55	39.78	89.31	3.15	7.07	44.55	39.78	89.31	3.15	7.07	1.61

กรมชลประทาน
ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งวดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	เบิกจ่ายส่วนกลาง					เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค				รวมทั้งสิ้น					
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ผูกพัน		เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ผูกพัน		เงินจัดสรร	เบิกจ่าย		ผูกพัน		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	64.17	13.22	20.60	50.28	78.36	1,898.82	1,063.81	731.46	38.52	1,962.99	1,077.03	54.87	781.75	39.82	104.22
ส่วนกลาง	64.17	13.22	20.60	50.28	78.36	-	-	-	-	64.17	13.22	20.60	50.28	78.36	0.67
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	-	-	-	-	-	1,064.46	560.88	478.58	44.96	1,064.46	560.88	52.69	478.58	44.96	25.00
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	-	-	-	-	-	740.82	487.93	252.88	34.14	740.82	487.93	65.86	252.88	34.14	-
สขป. 1						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 2						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 3						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 4						19.00	-	-	-	19.00	-	-	-	-	19.00
สขป. 5						15.00	15.00	-	-	15.00	15.00	100.00	-	-	-
สขป. 6						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 7						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 8						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 9						59.54	-	-		59.54	-	-	-	-	59.54
สขป. 10						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 11						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 12						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 13						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 14						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 15						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 16						-	-	-		-	-	-	-	-	-
สขป. 17						-	-	-		-	-	-	-	-	-
