



เลขที่เอกสารในระบบ E-Proc ๐๖/๕๒๘/๒๕๖๔

บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๕๒๘/๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผอ.ผง. ๔๒๖๔๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๖ ส.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

๕๒๘ ผอ.ส.ม., ผอ.บ.กค., ทน.๑-๙ มอ.

11๙ ผอ.ท.มอ. (งม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๙ ส.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,919.82 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 64,317.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.73 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,267 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 70 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.49 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ จำนวน 5,765 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.41 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8,155 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.16 และยกเลิก จำนวน 216 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.51 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 74,106.98 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 47,924.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.67 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,943.32 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,170.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.68 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 66,163.66 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 41,753.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.11 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,644 รายการ เป็นรายการ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,399 รายการ และรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 371 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.05 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.13 เนื่องจากส่วนใหญ่รายการโอนเปลี่ยนแปลง งานผูกพันใหม่ และติดปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เป็นป่ากร้าง ไม่มีเจ้าของ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาตแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ เป็นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,074 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.94 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,474 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.79 และยกเลิก จำนวน 204 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.09 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,819.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.68 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 446.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 510.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 1,432.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.78 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,557 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 215 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,337 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.87 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง/แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และติดปัญหาที่ดิน เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรเปลี่ยนใจ ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น

3. งบกลาง พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,652.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.08 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.01 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 674 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.56 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน งบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว

4. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 2,653.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 140.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 มีจำนวนรายการ 130 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.92 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.31

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 819.12 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 690.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.32 มีจำนวนรายการ 1,637 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.53 ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 1,612 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.47

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 766.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.99 มีจำนวนรายการ 91 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.75 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ได้แก่ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณ 5.82 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ มีความขัดแย้งในเรื่องแนวคูน้ำ และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

7. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 324.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.17 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.34 อยู่ระหว่างดำเนินการ 340 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.54 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 4.17 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการแล้ว



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




1




สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	100,919.82	64,317.85	63.73	14,267	61	70	5,765	ยกเลิก 216 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง)	74,106.98	47,924.06	64.67	9,770	5	13	5,074	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,943.32	6,170.59	77.68					
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	66,163.66	41,753.47	63.11	9,770	5	13	5,074	รายการ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง 9,399 รายการ ยกเลิก 204 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง 371 รายการ
2. งบเงินกู้ไม่เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563	11,209.80	8,819.97	78.68	1,557			215	- ยกเลิก 5 รายการ - เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ งานยกเลิก และที่ไม่สามารถเบิกได้ทัน 446.65 ล้านบาท - นำไปเบิกโอนเปลี่ยนแปลง 510.80 ล้านบาท - เงินคงเหลือที่ต้องดำเนินการ 1,432.38 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2563	6,970.95	5,652.16	81.08	698			21	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	5,385.56	4,454.81	388.36	620			15	
- โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.86	2,329.90	90.98	266			2	
- โครงการเพื่อต่อต้านการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายจากดินโคลนถล่มด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.90	390.63	99.17	222				
- โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.59	552.76	76.82	79		-	5	ยกเลิก 1 รายการ
- โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.35	1,044.27	73.21	45			5	ยกเลิก 1 รายการ
- โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.86	137.25	48.18	8			3	
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563	1,585.39	1,197.35	75.52	78			6	ยกเลิก 1 รายการ



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ	แล้วเสร็จ
4. งบกลาง พ.ศ. 2564	2,653.14	140.32	5.29	130	40	48	42	0
4.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	1,609.78			68	21	47		
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรับรองรับการแก้ไขปัญหายุทธภัยและภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24		24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31			44	21	23		
4.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564	1,043.36	140.32	13.45	62	19	1	42	
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	819.12	690.68	84.32	1,637			25	1,612
6. จัดรูปที่ดิน	935.00	766.58	81.99	91			48	42
7. เงินกู้	4,224.82	324.09	7.67	384	16	9	340	16






งบลงทุน

2

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)



2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

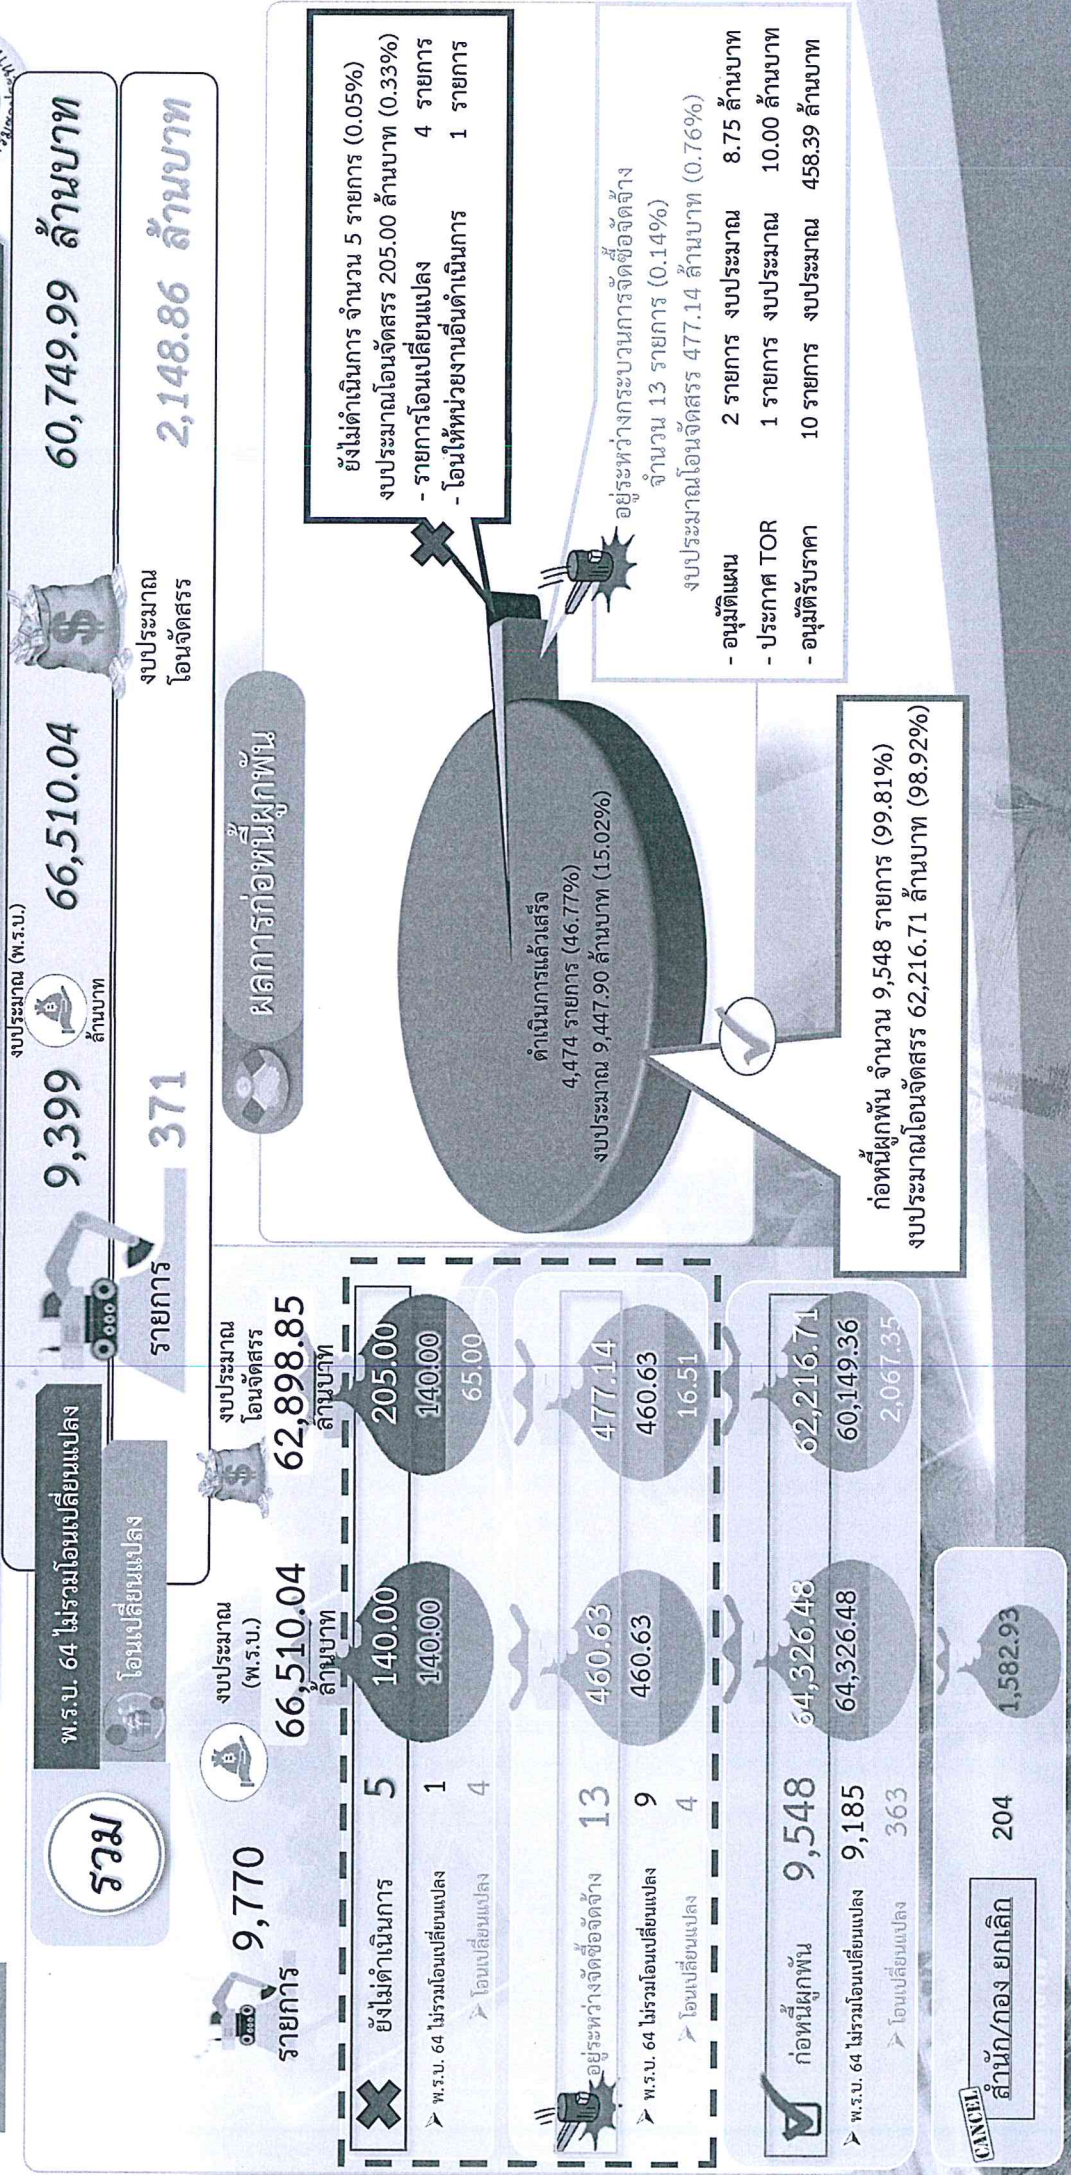

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

ก่อนถึงบ้าน

	แล้วเสร็จ	4,474 รายการ
	ก่อนผู้พัน	5,074 รายการ
	อนุมัติรับราคา	10 รายการ
	ประกาศ TOR	1 รายการ
	อนุมัติแผน	2 รายการ
	ยังไม่ดำเนินการ	5 รายการ

ยังไม่ก่อนผู้พัน
ผู้พัน 18
รายการ

[illegible]

2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Protect ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อตกลง							
						จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)						
											0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %	
รวม	64,927.11	62,898.85	41,153.10	65.43	9,566	5	205.00	13	477.14	9,548	62,216.71	1,358	448	447	787	2,034	4,474
สขบ. 1	1,200.46	1,115.64	844.04	75.66	324					324	1,115.64	2	5	5	31	118	163
สขบ. 2	1,294.34	1,215.57	933.42	76.79	373	1	8.50			372	1,207.07	101	47	16	19	48	141
สขบ. 3	1,966.55	1,782.92	1,361.05	76.34	334					334	1,782.92	33	24	18	28	96	135
สขบ. 4	1,263.11	1,165.62	824.39	70.73	499					499	1,165.62	168	59	27	36	71	138
สขบ. 5	2,891.26	2,735.43	1,961.13	71.69	549					549	2,735.43	25	16	14	61	134	299
สขบ. 6	3,337.57	3,100.42	2,673.34	86.23	706					706	3,100.42	31	11	26	47	188	403
สขบ. 7	3,031.25	3,029.49	2,445.84	80.73	669					669	3,029.49	25	38	29	52	147	378
สขบ. 8	2,420.54	2,166.75	1,315.66	60.72	534			2	8.74	532	2,158.01	40	31	42	38	83	298
สขบ. 9	2,784.90	2,620.37	1,614.35	61.61	540					540	2,620.37	19	9	32	62	128	290
สขบ. 10	1,444.94	1,312.29	754.79	57.52	632					632	1,312.29	87	13	23	67	169	273
สขบ. 11	2,009.29	1,815.60	1,110.79	61.18	599					599	1,815.60	284	26	11	24	79	175
สขบ. 12	2,282.67	2,237.97	1,516.10	67.74	615					615	2,237.97	72	6	13	27	136	361
สขบ. 13	1,609.84	1,450.72	1,095.41	75.51	534					534	1,450.72	60	30	32	36	208	168
สขบ. 14	2,589.19	2,890.12	1,623.50	56.17	282	1	25.00			281	2,865.12	19	12	18	36	48	148
สขบ. 15	1,541.32	1,383.37	695.87	50.30	514					514	1,383.37	77	29	13	38	98	259
สขบ. 16	2,013.08	1,864.40	1,061.98	56.96	542					542	1,864.40	13	14	26	42	61	386
สขบ. 17	1,189.08	1,282.34	568.35	44.32	272			7	105.42	265	1,176.92	19	11	14	16	37	168
สคก.	995.18	1,180.21	989.55	83.85	287					287	1,180.21	36	5	12	14	16	204
สคก.	48.12	48.27	0.15	0.31	2					2	48.27	1					1
สคก.	484.83	484.83	146.54	30.22	27					27	484.83	27					
สคก.	432.65	428.11	197.61	46.16	209			1	10.00	208	418.11	12	10	24	39	94	29
สคส.	467.04	554.39	404.37	72.94	63	2	31.50			61	522.89	28	3	3	18	4	5
สพญ.	11,971.14	11,761.47	6,291.52	53.49	182			1	180.00	181	11,581.47	90	25	18	21	19	8
สพพ.	83.72	82.85	58.00	70.00	1					1	82.85		1				
สอธ.	316.26	316.26	111.17	35.15	7					7	316.26	7					
กพท.	11,382.77	11,073.41	7,446.99	67.25	185	1	140.00	2	172.98	182	10,760.43	70	20	22	31	32	7
สคด.	3,702.66	3,530.30	2,968.21	84.08	51					51	3,530.30	7	3	2	2	11	26
สคด.	24.34	120.40	77.86	64.67	28					28	120.40			7	2	9	10
กคช.		0.34	0.33	95.31	3					3	0.34	2					1
LUMP SUM	149.00	149.00	60.78	40.79	3					3	149.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 204 รายการ งบประมาณ 1,582.93 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น
 2. โครงการผันจากกองเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563
 3. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 371 รายการ งบประมาณเปลี่ยนแปลง 2,148.86 ล้านบาท



2.4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Gen Project ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

ลำดับ/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ดำเนินการ							
						จำนวน รายการ	งบประมาณ	จำนวน รายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %		
รวม	64,927.11	62,898.85	41,153.10	65.43	9,566	5	205.00	13	477.14	9,548	1,358	448	447	787	2,034	4,474	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	19,650.71	19,168.19	12,848.04	67.03	454			5	387.98	449	18,780.21	147	28	46	72	111	45
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,140.30	7,808.11	4,354.26	55.77	223			1	20.00	222	7,788.11	63	20	28	37	42	32
การจัดการน้ำชลประทาน	2,177.12	2,358.57	1,653.08	70.09	1,646					1,646	2,358.57	156	60	93	215	339	783
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,358.90	1,280.53	956.11	74.67	45					45	1,280.53	11	10	2	7	13	2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาระบบชลประทาน	3,232.41	3,125.39	2,273.10	72.73	127					127	3,125.39	15	11	16	32	47	6
โครงการบรรเทาภัยจากภัยแล้งภัยน้ำ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	371.66	362.79	145.26	40.04	8	1	140.00			7	222.79	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	355.53	329.83	225.73	68.44	4					4	329.83	3				1	
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	6,896.12	6,690.84	5,860.44	87.59	5,444	2	31.50	2	6.99	5,440	6,652.34	692	223	152	275	1,127	2,971
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งเสวต	1,382.98	1,273.06	703.35	55.25	52					52	1,273.06	8	5	15	7	13	4
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,142.58	2,090.39	1,475.72	70.60	626	1	8.50	1	2.52	624	2,079.37	44	23	22	34	143	358
โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน	6,263.19	5,957.14	3,598.24	60.40	417	1	25.00	2	17.00	414	5,915.14	82	28	34	57	131	82
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,125.27	1,013.19	640.05	63.17	48					48	1,013.19	9	3	7	15	12	2
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชลประทาน	1,987.28	1,770.63	1,026.18	57.96	198					198	1,770.63	23	12	11	12	19	121
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	276.15	272.50	134.27	49.27	120					120	272.50	36	1	3		17	63
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	160.63	158.82	8.83	5.56	11			2	42.65	9	116.17	5	2		1	1	
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	651.60	597.30	325.77	54.54	19					19	597.30	3	6	7	3		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดเชียงใหม่	1,045.99	1,001.43	683.89	68.29	10					10	1,001.43	2	1	4	1	2	
โครงการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงพื้นที่จากหน่วยงานราชการ	1,231.35	1,657.58	468.97	28.29	15					15	1,657.58	9	1	2	2	1	
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากปี - พนมวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	410.92	366.10	211.54	57.78	7					7	366.10	1	1	2	2	1	
โครงการบรรเทาภัยจากภัยแล้งภัยน้ำภาคใต้ใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดลพบุรี	284.71	163.40	73.34	44.88	4					4	163.40	1	1			2	
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี	331.98	204.44	160.20	78.36	6					6	204.44	1	1		1	2	1
โครงการประมงน้ำจืดหรือเลี้ยงปลาในบ่อหรือในกระชัง	266.59	185.12	53.91	29.12	5					5	185.12	2	3				
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	349.82	349.82	260.76	74.54	4					4	349.82	3				1	
โครงการชลประทานน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,159.25	2,157.44	1,652.61	76.60	12					12	2,157.44	7	3			1	1
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	640.47	640.42	222.38	34.72	13					13	640.42	7	2	2	2		
โครงการประมงน้ำจืดหรือเลี้ยงปลาในบ่อหรือในกระชัง	213.40	213.40	114.81	53.80	5					5	213.40	2	2			1	
โครงการประมงน้ำจืดหรือเลี้ยงปลาในบ่อหรือในกระชัง	80.20	75.99	61.36	80.75	6					6	75.99	1	2		1	2	
โครงการประมงน้ำจืดหรือเลี้ยงปลาในบ่อหรือในกระชัง	526.44	562.31	417.56	74.26	10					10	562.31	3	1		3	2	1
โครงการปรับปรุงคลองชลประทาน จังหวัดสุโขทัย	412.62	412.62	285.63	69.23	5					5	412.62	4			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร	123.62	119.28	17.60	14.76	5					5	119.28	4	1				
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	421.76	303.48	89.44	29.47	10					10	303.48	9	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดลพบุรี	255.60	228.76	150.64	65.85	7					7	228.76	5	1			1	

หมายเหตุ : 1 ยกเลิก จำนวน 204 รายการ งบประมาณ 1,582.93 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น
2. โครงการที่นำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองเสือ-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563
3. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 371 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,148.86 ล้านบาท



2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564



66,163.66 ล้านบาท

ลงทุน

+ PO 55,172.85
(83.39%)

เบิกจ่าย

41,753.47 ล้านบาท
63.11%

7,943.32 ล้านบาท

ประจำ

+ PO 6,343.43
(79.86%)

เบิกจ่าย

6,170.59 ล้านบาท
77.68%

74,106.98 ล้านบาท

ภาพรวม

+ PO 61,516.28
(83.01%)

เบิกจ่าย

47,924.06 ล้านบาท
64.67%

--- เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

ร้อยละ 32%

ภาพรวม 32%
ร้อยละ 20%

ร้อยละ 36%

ร้อยละ 20%

ร้อยละ 54%

ร้อยละ 57%

ร้อยละ 77%

ร้อยละ 80%

ร้อยละ 100%

ร้อยละ 100%

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

ม.ค.64

ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

74,106.98 ล้านบาท

ภาพรวม

เบิกจ่าย

47,924.06 ล้านบาท
64.67%

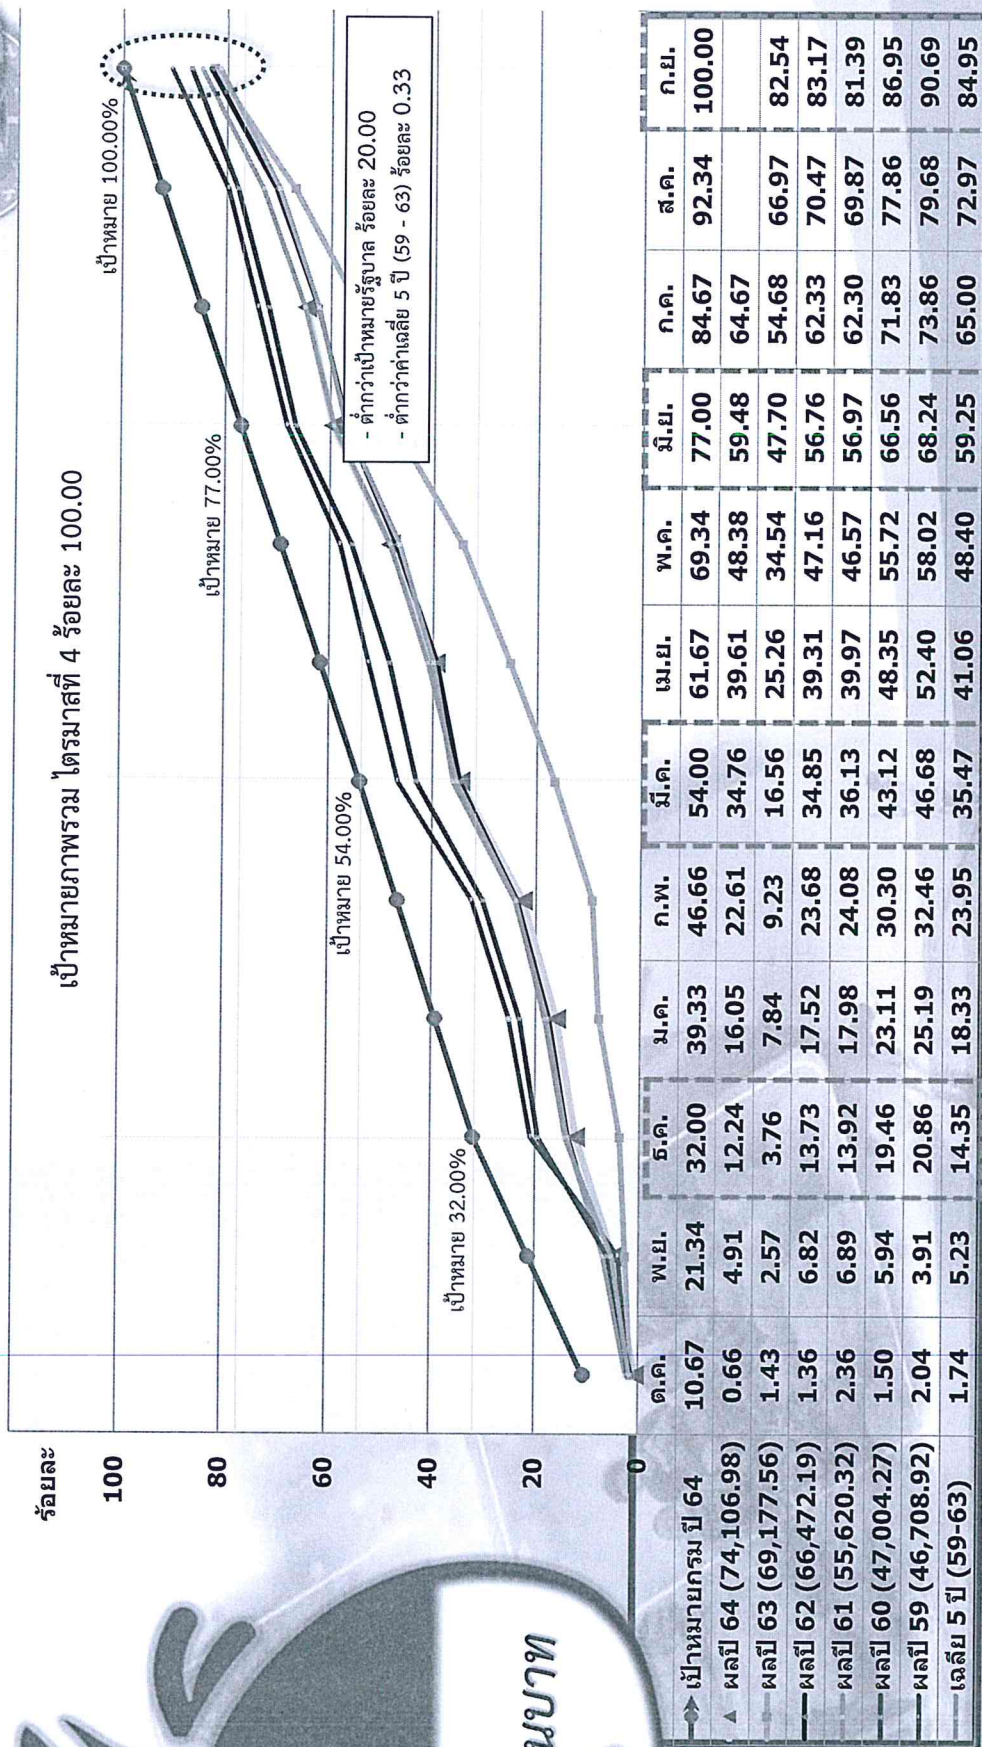


กองแผนงาน



2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ เดือนกรกฎาคม 2564


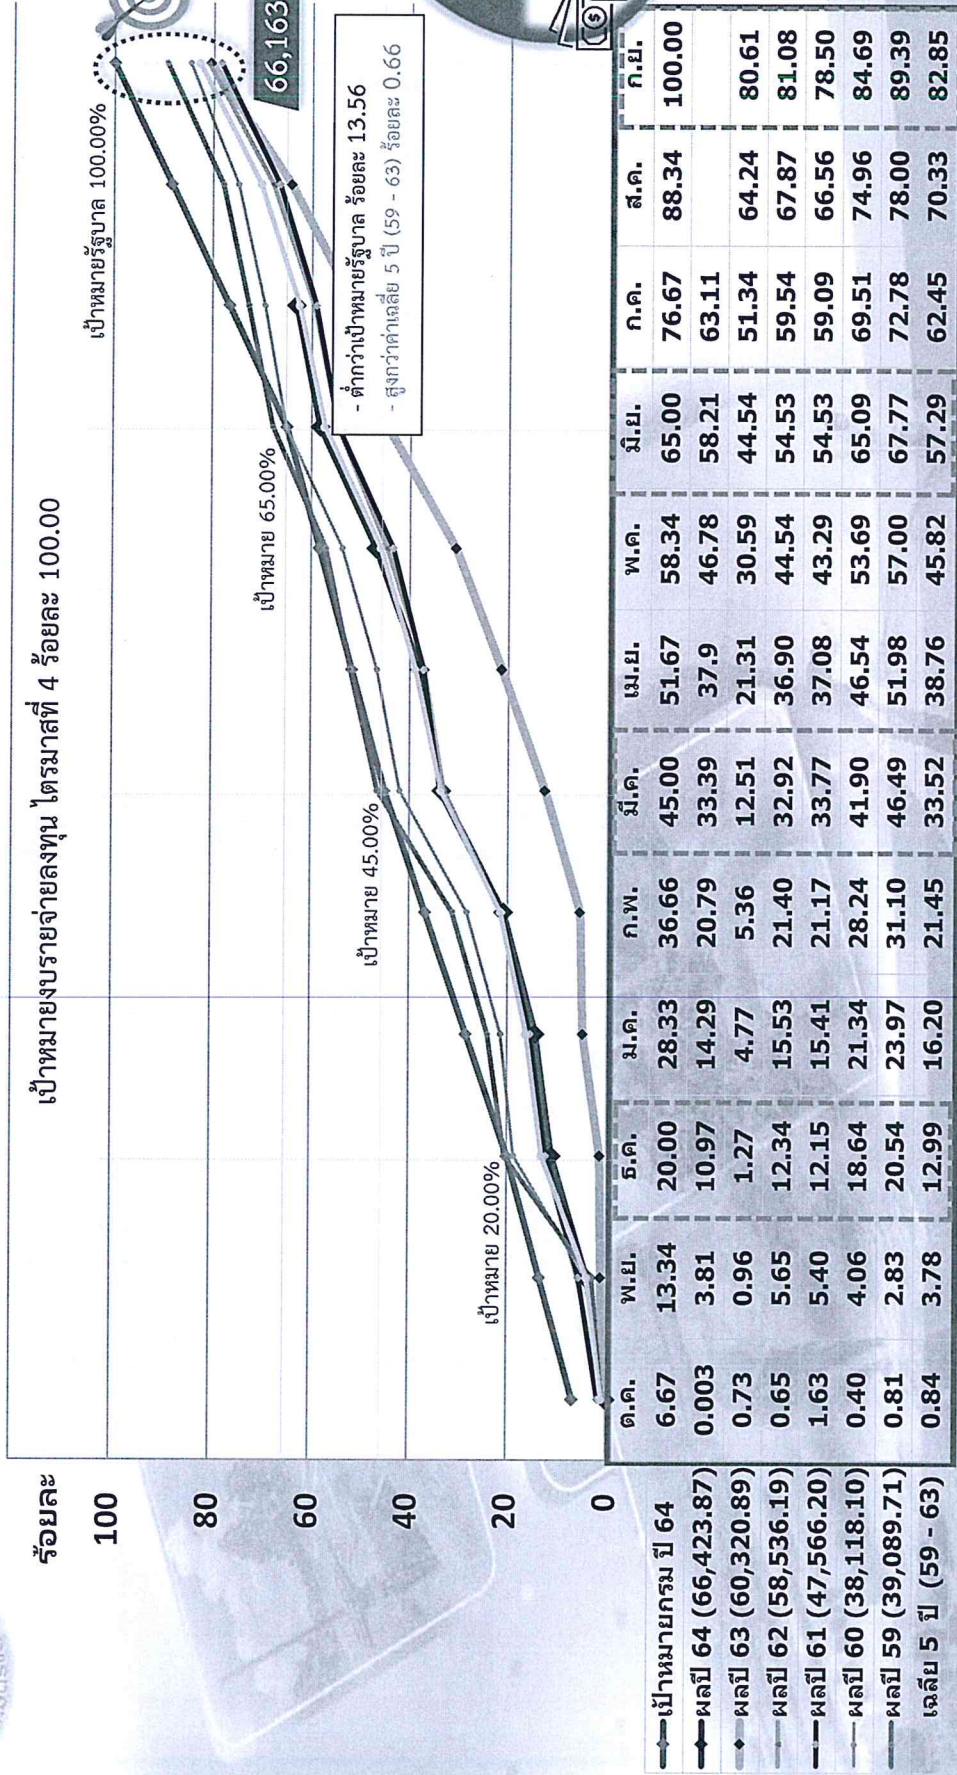


2.8

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ก.ค. 64 : 76.67 %

เฉลี่ย 5 ปี (59-63) : 62.45 %

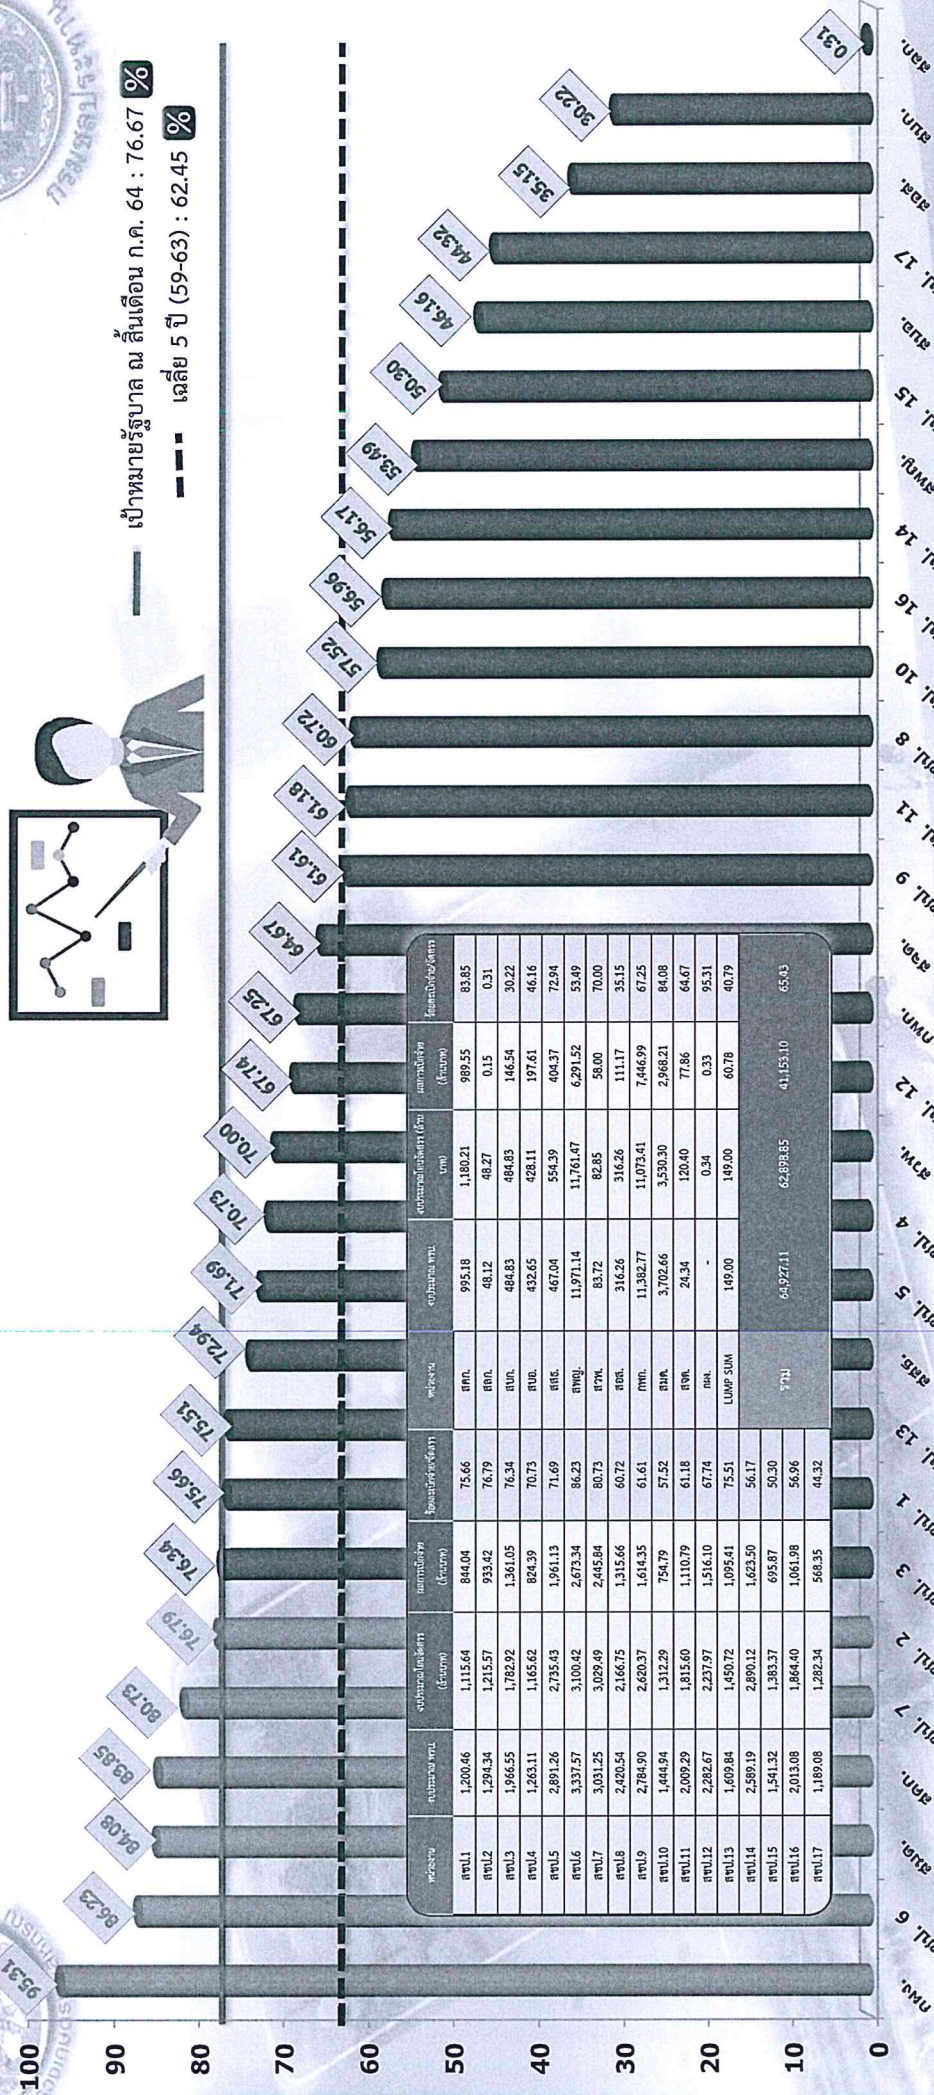

หมายเหตุ : 1. งบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 64,927.11 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิกจำนวน 204 รายการ งบประมาณ 1,582.93 ล้านบาท
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 371 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,148.86 ล้านบาท

กองแผนงาน

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

2.9


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	<u>ระดับกระทรวง</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	72,166.20	45,813.84	63.48	65,230.64	33,483.20	51.33	12.15
2	กระทรวงคมนาคม	177,193.81	109,505.30	61.80	152,267.07	71,461.80	46.93	14.87
3	กระทรวงมหาดไทย	80,550.06	33,127.64	41.13	77,043.36	20,774.87	26.97	14.16
	<u>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</u>							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,103.02	1,782.47	84.76	2,234.86	1,737.69	77.75	7.01
2	กรมชลประทาน	66,163.66	41,753.47	63.11	58,855.35	30,215.34	51.34	11.77
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,159.16	595.65	51.39	1,176.55	243.36	20.68	30.71
	<u>ระดับกรม (ผู้เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)</u>							
1	กรมทางหลวงชนบท	47,150.39	30,224.53	64.10	43,432.83	20,295.83	46.73	17.37
2	กรมทางหลวง	119,966.85	75,708.75	63.11	99,909.22	48,782.88	48.83	14.28
3	กรมชลประทาน	66,163.66	41,753.47	63.11	58,855.35	30,215.34	51.34	11.77
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,512.17	12,617.37	45.86	23,448.17	11,633.50	49.61	-3.75

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 54.66%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (47 หน่วยงาน) เฉลี่ย 54.39%



3

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

1,337 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

215 รายการ

ยกเลิกรายการ

5 รายการ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2564

ด้าน	ด้าน	ด้าน	ด้าน	ด้าน
แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64

ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

8,819.97 ล้านบาท 78.68 %

เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก

446.65 ล้านบาท 3.98 %

นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

510.80 ล้านบาท 4.56 %

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

1,432.38 ล้านบาท 12.78 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตแก้ไขและเข้าศึกษาริ้วพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2563

แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05	461.61	204.46		
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07	179.32	86.88		

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64

ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%



กรมส่งเสริมการเกษตร

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 6 ครั้ง จำนวน 6,970.9511 ล้านบาท 698 รายการ

เบิกจ่าย 5,652.1593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.08

สถานะการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 674 รายการ = 96.56%

ดำเนินการ 21 รายการ = 3.01%

ยกเลิก 3 รายการ = 0.43%

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพักตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน



ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 2,650 ไร่ ปริมาณน้ำ 124.51 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 523,753 ไร่ คร่าวเรือรับประโยชน์ 116,123 คร่าวเรือ

ปริมาณวัชพืช 8.0336 ล้านตัน

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนก.ค. 64)

มติ ครม. 17 มี.ค.	มติ ครม. 8 ก.ค.	มติ ครม. 13 ส.ค.	มติ ครม. 15 ก.ย.	มติ ครม. 15 ก.ย. ครุภัณฑ์	กปร. ปี 2563
266 รายการ	222 รายการ	79 รายการ	45 รายการ	8 รายการ	78 รายการ
2,560.8638 ล้านบาท	393.9028 ล้านบาท	719.5853 ล้านบาท	1,426.3528 ล้านบาท	284.8600 ล้านบาท	1585.3864 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,329.9031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.98	เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17	เบิกจ่าย 552.7554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.82	เบิกจ่าย 1,044.2695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.21	เบิกจ่าย 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18	เบิกจ่าย 1,197.3497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.52
89.41 %	100 %	92.24 %	87.37 %	62.20 %	79.41 %
• แล้วเสร็จ 264 รายการ	• แล้วเสร็จ 222 รายการ	• แล้วเสร็จ 73 รายการ	• แล้วเสร็จ 39 รายการ	• แล้วเสร็จ 5 รายการ	• แล้วเสร็จ 70 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ
พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่	ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่	เครื่องสูบน้ำ 44 เครื่อง/คัน/ไร่	ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
ปริมาณน้ำ 64.82 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่	พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่	ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.	ความพร้อมแก้ไขและบรรเทาภัยพิบัติ	จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่	คร่าวเรือรับประโยชน์ 8,509 คร่าวเรือ	คร่าวเรือรับประโยชน์ 7,520 คร่าวเรือ	พื้นที่รับประโยชน์ 65,736 ไร่	คลองการระบายน้ำบนบ่อขุดลอกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	
คร่าวเรือรับประโยชน์ 79,624 คร่าวเรือ	ปริมาณวัชพืช 8.0336 ล้านตัน		คร่าวเรือรับประโยชน์ 20,470 คร่าวเรือ		
โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่รับน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ	โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563	โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ	โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ปรากฏการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563	โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาภัยพิบัติ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบฯ) ประจำปี 2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 3 ครั้ง	จำนวน	2,653.1443 ล้านบาท
	เบิกจ่าย	140.3204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ	40 รายการ	= 30.77%
จัดซื้อ-จัดจ้าง	48 รายการ	= 36.92%
ดำเนินการ	42 รายการ	= 32.31%

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน	ปริมาณน้ำ
900 ไร่	15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์	ครัวเรือนรับประโยชน์
52,291 ไร่	13,213 ครัวเรือน

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายขกกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

มติ ครม.
8 มิ.ย.
ครุภัณฑ์

24 รายการ

1,183.3080 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
24 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สง.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลหีรับ
รองรับการแก้ไขปัญหอุทกภัยและภัยแล้ง

มติ ครม.
15 มิ.ย.

44 รายการ

1,043.3643 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 21 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สง.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี
2563/2564

กปร.
ปี 2564

62 รายการ

1,043.3643 ล้านบาท

เบิกจ่าย 140.3204 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 13.45


10.42 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
42 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 19 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดทำ
แหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และ
โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2564

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนก.ค. 64)





6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กรมชลประทาน

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนก.ค. 64)

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 248.3300 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 197.8497 ล้านบาท 79.67%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 22 รายการ



อยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 รายการ

ผลสัมฤทธิ์

พื้นที่เกษตรกรรม 26,865 ไร่

ผล = 12,365 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,376 ครัวเรือน

ผล = 1,396 ครัวเรือน

ภาพรวม



งบประมาณ 935.0000 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 766.5791 ล้านบาท 81.99%



ผลการดำเนินงาน : 91 รายการ

แล้วเสร็จ 42 รายการ

ก่อสร้าง 48 รายการ

* ยกเลิก 1 รายการ




ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่เกษตรกรรม 63,111 ไร่

ผล = 18,390 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,046 ครัวเรือน

ผล = 1,527 ครัวเรือน



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

งบประมาณ 686.6700 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 568.7294 ล้านบาท 82.82%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 20 รายการ



อยู่ระหว่างก่อสร้าง 36 รายการ


ผลสัมฤทธิ์

พื้นที่เกษตรกรรม 63,111 ไร่


ผล = 18,390 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,046 ครัวเรือน

ผล = 1,527 ครัวเรือน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ




งบประมาณ 893.6955 ล้านบาท

งบจัดสรร 819.1226 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 690.6753 ล้านบาท 84.32%

ผลการดำเนินงาน : 1,637 รายการ



แล้วเสร็จ

1,612 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 25 รายการ



เงินหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



17



7

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 4,224.8246 ล้านบาท

เบิกจ่าย 324.0879 ล้านบาท 7.67%

PO 508.0342 ล้านบาท 12.02%

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ	16 รายการ	= 4.17%
จัดซื้อ-จัดจ้าง	9 รายการ	= 2.34%
ดำเนินการ	340 รายการ	= 88.54%
แล้วเสร็จ	16 รายการ	= 4.17%
ยกเลิก	3 รายการ	= 0.78%

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2564 เพื่อดำเนินการแล้ว



ระยะเวลาการดำเนิน
โครงการดำเนินงาน

100%

31 ธ.ค. 64

จำนวน
รายการ

ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง



หมายเหตุ : ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สขป.6 = 2 รายการ และสขป.7 = 1 รายการ


NOTE: สถานะการดำเนินงาน

■ แล้วเสร็จ	= 16
■ ผลงานร้อยละ 80-99	= 2
■ ผลงานร้อยละ 51-80	= 24
■ ผลงานร้อยละ 21-50	= 63
■ ผลงานร้อยละ 1-20	= 251
■ จัดซื้อ-จัดจ้าง	= 9
■ ยังไม่ดำเนินการ	= 16
✗ ยกเลิก	= 3


พบรายการที่ไม่เป็นไปตาม
แผนงานรายการ ขบ.ค.ค.ค.
จำนวน 276 รายการ

ประเภทการดำเนินงาน

87 รายการ
62 รายการ
232 รายการ
= รวม 381 รายการ



Note :

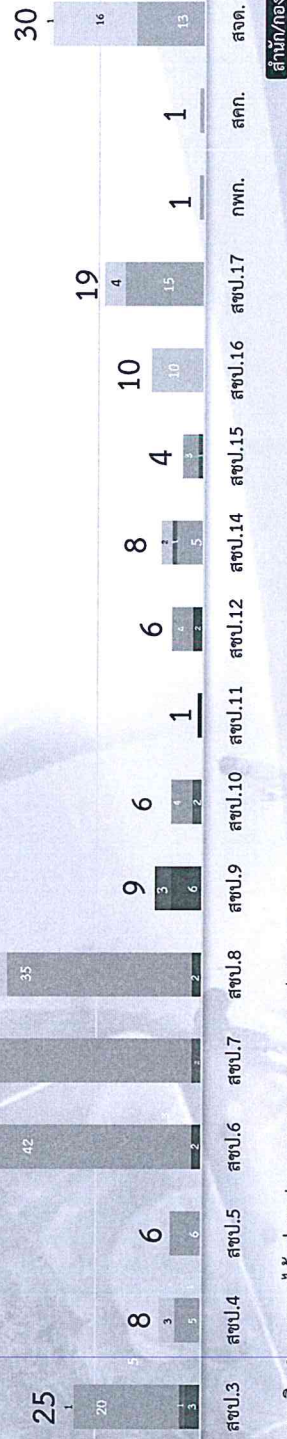

สำนัก/กอง
