



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) สำนักงานชลประทานที่ ๑ โทร.๑๓๘

ที่ สขป ๑.๐๑/ ๗๗

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน รอง ผส.ขป.๑ ผศร. ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.๑ ผสญ.๑ ผสภ.๑ ผบค.๑ คก. ผจจ.๑ ทน.๑ บอ.
ผอช.ภาคเหนือตอนบน จด.๑/๑ มด. สร.รว.๑ และ ผด.๑ สธ.

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้มีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานชลประทานที่ ๑ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้บรรจุขึ้นเว็บไซต์ สขป.๑ (www.rid-1.com) เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปฐม สุริยกันต์)

ผบท.ขป.๑

ร่าง
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สขป.๑

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุตชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ขป.๑	ประธาน
๒.	นายวุฒิชัย	รักษาสุข	ผคป.ลำพูน รก. รอง ผส.ขป.๑	
๓.	นายอภิวัฒน์	ภูมิไธสง	ผจบ.ขป.๑ รก. ผคบ.แม่ฮ่องสอน	
๔.	นายนิธิ	วรมงคล	ผผง.ขป.๑	
๕.	นายณัฐวุฒิ	นาสุก	ผวศ.ขป.๑ รก. ผคส.๑	
๖.	นายวิชัย	ชัยเจริญชาติ	ผคก.ขป.๑	
๗.	นายปฐม	สุรียกานต์	ผบท.ขป.๑	
๘.	นายจรินทร์	คงศรีเจริญ	ผคป.เชียงใหม่	
๙.	นายกตัญญู	ใจชื่น	ผคป.แม่ฮ่องสอน	
๑๐.	นายเฉลิมเกียรติ	อินทกนก	ผคบ.แม่แฝก-แม่จันทน์ รก. ผคบ.แม่แตง	
๑๑.	นายไพรัตน์	ทับประเสริฐ	ผศร.ห้วยฮ่องไคร้	
๑๒.	นายประถม	ทองปอ	นายช่างโยธาอาวุโส แทน ผสญ.๑	
๑๓.	นายอภิชาติ	มงคลวัฒน์	กส.๓ พก.๑ แทน ผสก.๑	
๑๔.	นายวิราพงษ์	อัปการัตน์	วศ.จจ.๑ แทน ผจจ.๑	
๑๕.	นายสมคิด	สะเภาคำ	ผอช.ภาคเหนือตอนบน	
๑๖.	นายสถาพร	คงชาติ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน แทน ผด.๑ สธ.	
๑๗.	นายสุขสวัสดิ์	นวลจันทร์	จด.๑/๑ มต.	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายสิทธิศักดิ์	เหมือนมี	ผบค.๑ คก.	ติดราชการ
๒.	นายประเสริฐ	แสนหลี่	สร.รว.๑	ติดราชการ
๓.	นายวรเดช	ชินพงษ์ศิริวิสัย	ทน.๑ บอ.	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายเกื้อกูล	มานะสัมพันธ์สกุล	วศ.คป.เชียงใหม่	
๒.	นายเกษียณ	สถิตกุล	วศ.คป.แม่ฮ่องสอน	
๓.	นายธีรพันธุ์	เด็ชขาด	วศ.คบ.แม่ฮ่องสอน	
๔.	นายอัยยา	อรรณพเพ็ชร	วศ.คบ.แม่แตง	
๕.	นายสิริภพ	แท่นมณี	จน.คป.เชียงใหม่	
๖.	นายสุรณวัฒน์	สุรการ	จน.คป.ลำพูน	
๗.	นายเชษฐพงศ์	นันทิทรธ	จน.คบ.แม่แตง	
๘.	นายณัฐพล	อภิรักษ์โน	จน.คบ.แม่แฝก-แม่จันทน์	
๙.	นายคณยศ	กาวิละ	วช.ห้วยฮ่องไคร้	
๑๐.	นายปรีชา	แย้มเย็น	วป.อช.ภาคเหนือตอนบน	
๑๑.	นายอุบลศักดิ์	ชัยยัง	วศ.๑ คก.	๑๒.นายจักรกฤษณ์...

๑๒. นายจักรกฤษณ์	ชมภูบาง	ผง.ชป.๑
๑๓. นายราชรัฐ	สัตถาผล	ยศ.ชป.๑
๑๔. นายก่อพงศ์	เจษฎาพันธ์	ตป.ชป.๑
๑๕. นายชัยชัย	เพชรอักษร	อบ.ชป.๑
๑๖. นายจิรัชย์	พัฒนพงศ์	พค.ชป.๑
๑๗. นายธนิต	จำภา	บน.ชป.๑
๑๘. นายศุภมิตร	กฤษณมิตร	ปช.ชป.๑
๑๙. นายชยกร	นันทานอก	สพ.ชป.๑
๒๐. นายปรานต์	จรมาศ	ปน.ชป.๑
๒๑. นายสันหพจน์	นันทิทรภ	ปป.ชป.๑
๒๒. นางสาวลินจง	คงตั้งมั่น	ธก.ชป.๑
๒๓. นายณัฐพล	สิทธิการ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒๔. นายพิพัฒน์	ปฏิพัทธ์ปถวี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๕. นายภูวสิษฐ์	สุดแดน	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒๖. นายสกลรัฐ	ปรางงาม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๗. นายอมรฤทธิ์	สิงห์โนปิน	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วย นายพลกร สุวรรณรัตน์ มีกำหนดเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่านรองคมนตรีและคณะ จะเดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายแม่อาจบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่โครงการ และในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่านรองคมนตรีและคณะ จะเดินทางไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเพื่อรับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน และติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งได้เชิญประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเตรียมความพร้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผส.ชป.๑ จะไปติดตามการเตรียมความพร้อมที่โครงการฯ แม่แฝก-แม่งัดฯ ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารฯ สชป.๑ ร่วมต้อนรับท่านรองคมนตรีและคณะ โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโครงการแม่แฝก-แม่งัดฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

นายปฐม สุริยกานต์ ผบ.ท.ชป.๑ : ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนร่างรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีผู้ขอแก้ไข หากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ขออนุญาตที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓..

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ สภาพภูมิอากาศ

นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน รายงานสภาพภูมิอากาศโดยสรุป ดังนี้

พยากรณ์อากาศประจำวัน ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๒๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า

ในช่วงวันที่ ๑ - ๔ มี.ค. ๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

ในช่วงวันที่ ๕ - ๖ มี.ค. ๖๔ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ ๑ - ๔ มี.ค. ๖๔ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย ๓ เดือน

เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกประกาศวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมใต้ แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั้นทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นสำหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกได้ด้วย จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง และมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ และ

ภาคกลางของ...

ภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้ อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้ว เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา

การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


สถานการณ์ปัจจุบัน ของปรากฏการณ์ลานีญามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกไปจนถึงด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรที่มีค่าต่ำกว่าปกติได้ขยายพื้นที่ไปทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร จากรายงานสถานการณ์ล่าสุดพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอุ่นขึ้นในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีค่าต่ำกว่าปกติประมาณ ๐.๓ - ๐.๒ องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกมีค่าต่ำกว่าปกติประมาณ ๐.๗ - ๑.๑ องศาเซลเซียส อีกทั้งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำไปจนถึงระดับ ๓๐๐ เมตร บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงมีค่าต่ำกว่าปกติมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม หลังจากนั้นได้อุ่นขึ้นเล็กน้อยบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติ ส่งผลต่อการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ ๘๕๐ เฮกโตปาสกาล (ความสูง ๑.๕ กม.จากระดับบก.) ทำให้มีลมตะวันออกที่ผิดปกติพัดปกคลุมตั้งแต่บริเวณตอนกลางด้านตะวันออกไปจนถึงบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร สำหรับลมที่ระดับ ๒๐๐ เฮกโตปาสกาล (ความสูง ๑๑ กม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) มีลมตะวันตกที่ผิดปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางไปจนถึงด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์ ENSO ที่มีสถานะเป็นลานีญาจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ ๖๐

ผลกระทบต่อประเทศไทย ปรากฏการณ์ลานีญาจะส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศไทย โดยคาดว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔ ปริมาณฝนของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่าปกติเล็กน้อย

รายงานสภาพน้ำฝน


กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานี สขป.๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

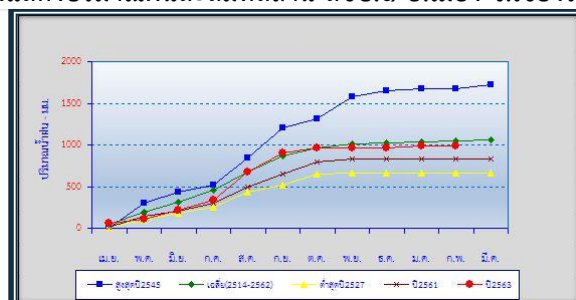

เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุท2545	4.7	301.0	126.8	87.8	324.7	363.9	103.9	268.8	67.5	20.9	0.0	51.7	1,721.7
สูงสุท2545	4.7	305.7	432.5	520.3	845.0	1,208.9	1,312.8	1,581.6	1,649.1	1,670.0	1,670.0	1,721.7	
เฉลี่ย	44.0	150.8	122.9	144.1	207.4	192.8	107.3	44.2	13.0	11.2	7.3	17.4	1,062.4
เฉลี่ยสะสม	44.0	194.8	317.7	461.8	669.2	862.0	969.3	1,013.5	1,026.5	1,037.7	1,045.0	1,062.4	
ต่ำสุท2527	15.1	76.6	91.6	71.6	172.9	35.3	142.5	1.3	0.0	10.9	0.0	0.0	667.8
ต่ำสุท2527	15.1	91.7	183.3	254.9	427.8	513.1	655.6	656.9	656.9	667.8	667.8	667.8	
ปี2562	12.8	128.4	62.8	93.4	200.7	151.5	140.5	38.9	4.9	0.0	0.0	1.8	835.7
สะสมปี2562	12.8	141.2	204.0	297.4	498.1	649.6	790.1	829.0	833.9	833.9	833.9	835.7	
ปี2563	65.3	44.6	104.9	123.5	338.4	220.9	63.6	2.4	0.0	21.7	6.7		
สะสมปี2563	65.3	109.9	214.8	338.3	676.7	897.6	961.2	963.6	963.6	985.3	992.0		


กราฟแสดงปริมาณ..

กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานีอุตลำนวน อ.เมือง จ.ลำพูน

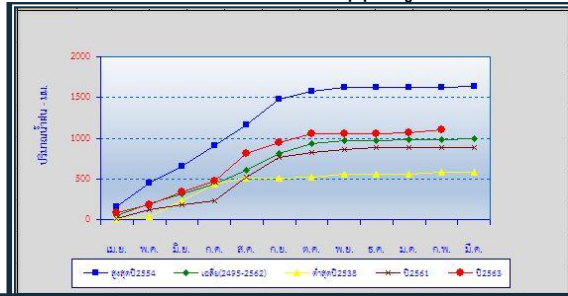


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
อุตลำนวนปี2554	156.7	296.7	201.8	253.4	249.3	318.4	104.1	44.6	0.0	1.8	0.0	8.4	1,635.2
อุตลำนวนปี2552	156.7	453.4	655.2	908.6	1,157.9	1,476.3	1,580.4	1,625.0	1,625.0	1,626.8	1,626.8	1,635.2	
เฉลี่ย	45.4	148.1	119.4	122.6	176.6	199.8	115.6	36.3	9.7	7.8	3.4	10.5	995.2
เฉลี่ยสะสม	45.4	193.5	312.9	435.5	612.1	811.9	927.5	963.8	973.5	981.3	984.7	995.2	
อุตลำนวนปี2553	12.0	30.0	184.8	203.6	76.5	6.8	1.8	39.8	0.0	0.0	22.8	0.0	578.1
อุตลำนวนปี2553	12.0	42.0	226.8	430.4	506.9	513.7	515.5	555.3	555.3	555.3	578.1	578.1	
ปี2562	13.5	110.6	57.9	53.0	292.6	233.3	62.3	41.8	19.9	0.0	0.0	2.0	886.3
อุตลำนวนปี2562	13.5	124.1	181.4	234.4	527.0	760.3	822.6	864.4	864.3	864.3	864.3	864.3	
ปี2563	85.8	98.8	159.0	131.3	338.3	135.1	100.2	11.4	0.0	2.2	41.4		
อุตลำนวนปี2563	85.8	184.6	343.6	474.9	813.2	948.3	1048.5	1059.9	1059.9	1062.1	1103.5		

กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

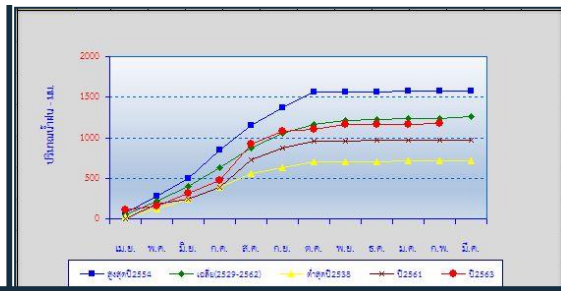


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
Sw.5Aปี2554	73.4	201.7	217.3	355.3	304.2	223.3	188.3	3.2	0.5	2.9	0.0	8.8	1,578.9
Sw.5Aปี2554	73.4	275.1	492.4	847.7	1,151.9	1,375.2	1,563.5	1,566.7	1,567.2	1,570.1	1,570.1	1,578.9	
เฉลี่ย	48.1	169.2	178.2	230.3	242.9	186.1	114.4	46.3	13.0	8.8	4.1	14.1	1,255.5
เฉลี่ยสะสม	48.1	217.3	395.5	625.8	868.7	1,054.8	1,169.2	1,215.5	1,228.5	1,237.3	1,241.4	1,255.5	
อุตลำนวนปี2552	25.3	90.8	121.4	152.9	163.2	78.5	70.1	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	718.4
อุตลำนวนปี2552	25.3	116.1	237.5	390.4	553.6	632.1	702.2	702.2	702.2	718.4	718.4	718.4	
ปี2562	0.0	177.8	65.7	147.2	342.3	139.3	81.3	2.0	10.9	0.0	0.0	0.0	966.5
อุตลำนวนปี2562	0.0	177.8	243.5	390.7	733.0	872.3	933.6	935.6	966.5	966.5	966.5	966.5	
ปี2563	104.5	57.8	148.5	143.7	448.6	154.5	28.8	57.4	0.0	2.1	9.7		
อุตลำนวนปี2563	104.5	162.3	310.8	454.5	903.1	1077.6	1106.4	1163.8	1163.8	1165.9	1175.6		

สภาพน้ำท่า

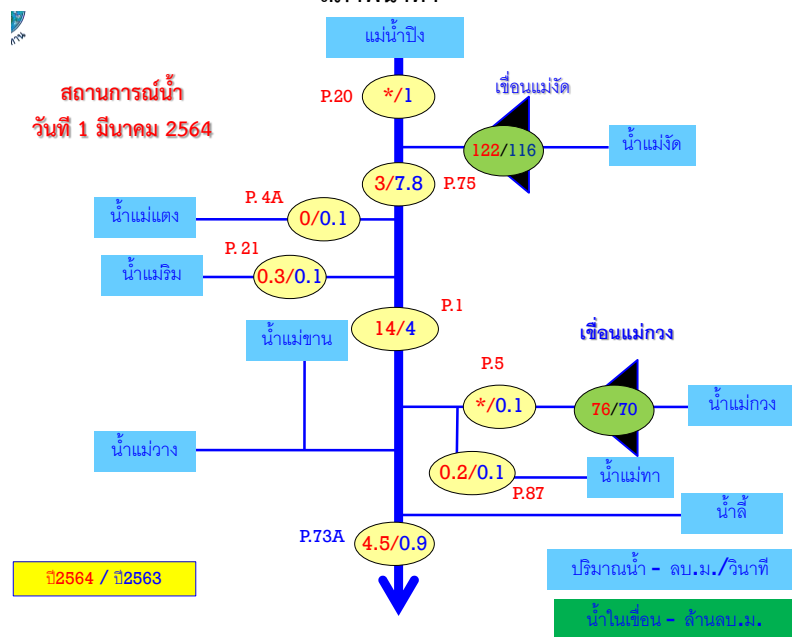


ปริมาณน้ำ...


ปริมาณน้ำสะสมเดือน ก.พ. สรุปข้อมูลถึงวันที่ 24 ก.พ.64
กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนารัฐ จ.เชียงใหม่

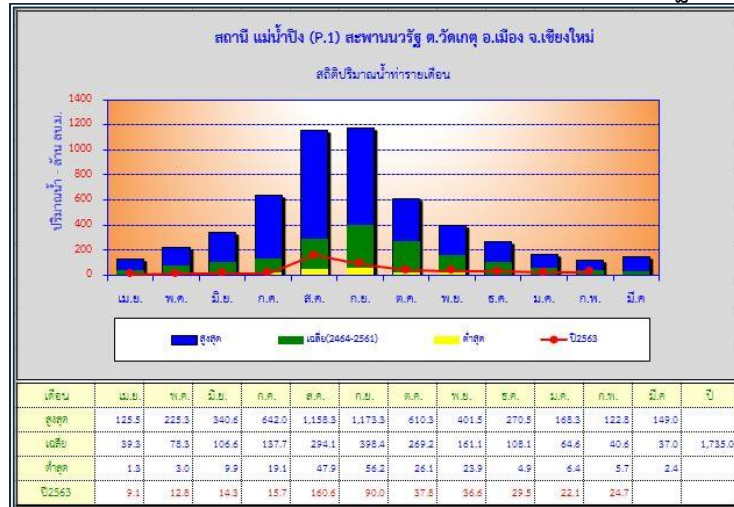

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.5 น้ำกวัง สะพานท่านาง จ.ลำพูน

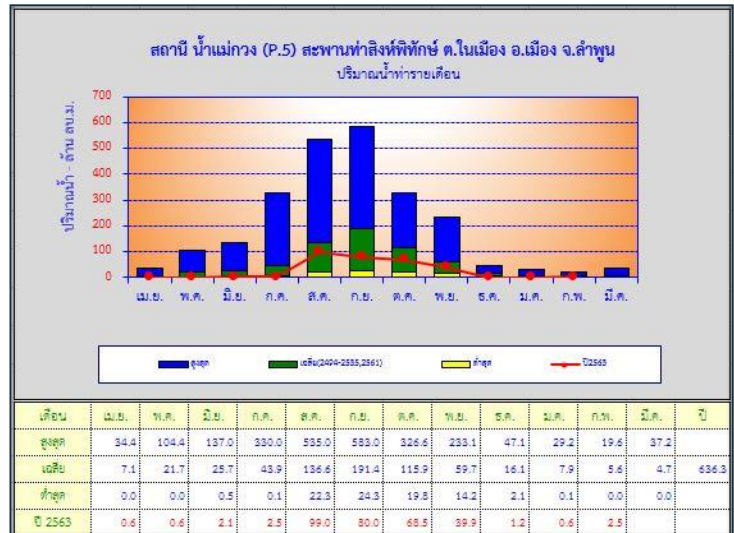

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน

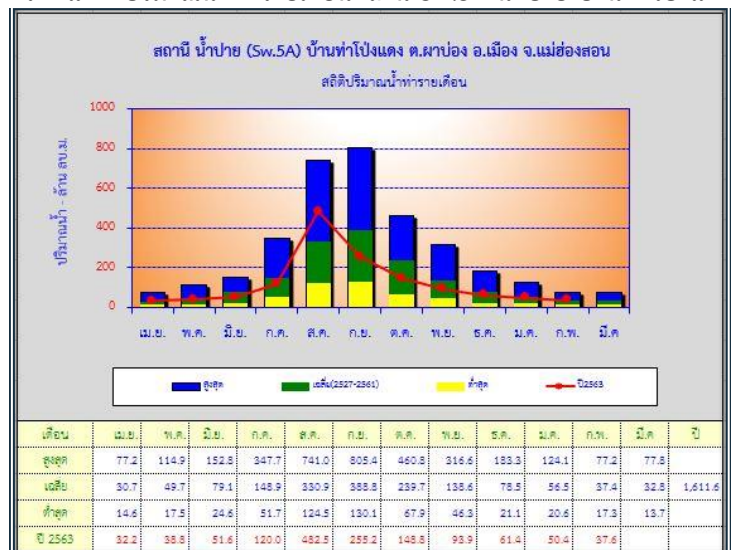

การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบวันที่ ๑



ปริมาณน้ำปรัยไหลผ่านสถานี(P.75) ป้านซอแล อ.แม่นางและสถานี(P.103) ป้านปาซอใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75 ล้าน ลบ.ม.	สมมติ ล้าน ลบ.ม.	เขื่อนแม่งัด ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณจริง ล้าน ลบ.ม.	P.103 ล้าน ลบ.ม.	สมมติ ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณจริง ล้าน ลบ.ม.	ช่วงเวลา
7 ม.ค. 64	0.180	0.038	0.025	0.117				21.00 - 24.00
8 ม.ค. 64	1.209	0.229	0.331	0.649	0.141	0.081	0.060	01.00 - 24.00, 16.00 - 24.00
9 ม.ค. 64	0.600	0.229	0.376	-0.005	0.686	0.216	0.470	01.00 - 24.00
10 ม.ค. 64	0.217	0.229	0.098	-0.110	0.411	0.216	0.195	01.00 - 24.00
11 ม.ค. 64					0.433	0.216	0.217	01.00 - 24.00
12 ม.ค. 64								
13 ม.ค. 64								
14 ม.ค. 64								
รวม	2.205	0.725	0.829	0.651	1.671	0.729	0.942	

การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบวันที่ ๒




ปริมาณน้ำปรัยไหลผ่านสถานี(P.75) ป้านซอแล อ.แม่นางและสถานี(P.103) ป้านปาซอใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75 ล้าน ลบ.ม.	สมมติ ล้าน ลบ.ม.	เขื่อนแม่งัด ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณจริง ล้าน ลบ.ม.	P.103 ล้าน ลบ.ม.	สมมติ ล้าน ลบ.ม.	ปริมาณจริง ล้าน ลบ.ม.	ช่วงเวลา
14 ม.ค. 64	0.117	0.036	0.045	0.036				21.00 - 24.00
15 ม.ค. 64	1.032	0.216	0.373	0.443	0.135	0.122	0.012	01.00 - 24.00, 17.00 - 24.00
16 ม.ค. 64	0.908	0.216	0.376	0.316	0.570	0.367	0.203	01.00 - 24.00
17 ม.ค. 64	0.255	0.216	0.304	-0.265	0.845	0.367	0.478	01.00 - 24.00
18 ม.ค. 64	0.019	0.018	0.022	-0.021	0.999	0.367	0.632	01.00 - 24.00
19 ม.ค. 64					0.840	0.367	0.472	01.00 - 24.00
20 ม.ค. 64					0.502	0.337	0.166	01.00 - 2.00
21 ม.ค. 64								
รวม	2.331	0.702	1.121	0.508	3.891	1.928	1.963	

การบริหารจัดการน้ำ...


การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบวันที่ ๓

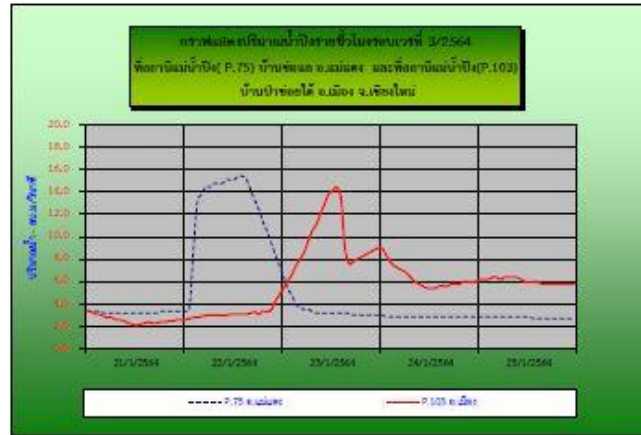

ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี(P.75) บ้านซางแล ม.แม่มดและสถานี(P.103) บ้านป่าซางใต้ ม.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เขื่อนแม่งัด	ปริมาณน้ำ	P.103	Base Flow	ปริมาณน้ำ	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
21 ม.ค. 64	0.072	0.069	0.067	-0.064				21.00 - 24.00
22 ม.ค. 64	1.050	0.276	0.277	0.504	0.069	0.039	0.010	01.00 - 24.00, 17.00 - 24.00
23 ม.ค. 64	0.305	0.276	0.266	-0.235	0.825	0.285	0.540	01.00 - 24.00
24 ม.ค. 64					0.546	0.285	0.261	01.00 - 24.00
รวม	1.435	0.622	0.608	0.205	1.441	0.630	0.811	

การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบวันที่ ๔

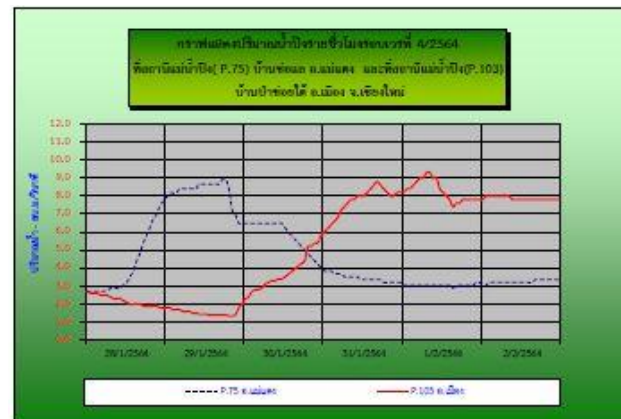


ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี(P.75) บ้านซางแล ม.แม่มดและสถานี(P.103) บ้านป่าซางใต้ ม.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่	P.75	Base Flow	เขื่อนแม่งัด	ปริมาณน้ำ	P.103	Base Flow	ปริมาณน้ำ	ช่วงเวลา
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	
28 ม.ค. 64	0.248	0.126	0.143	-0.022				13.00 - 24.00
29 ม.ค. 64	0.708	0.233	0.394	0.084	0.013	0.018	-0.005	01.00 - 24.00, 23.00 - 24.00
30 ม.ค. 64	0.506	0.233	0.356	-0.083	0.325	0.216	0.109	01.00 - 24.00
31 ม.ค. 64	0.238	0.233	0.269	-0.204	0.667	0.216	0.051	01.00 - 24.00
1 ก.พ. 64					0.715	0.216	0.099	01.00 - 24.00
รวม	1.753	0.826	1.152	-0.224	1.720	0.666	1.054	

การบริหารจัดการน้ำ...


การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๕

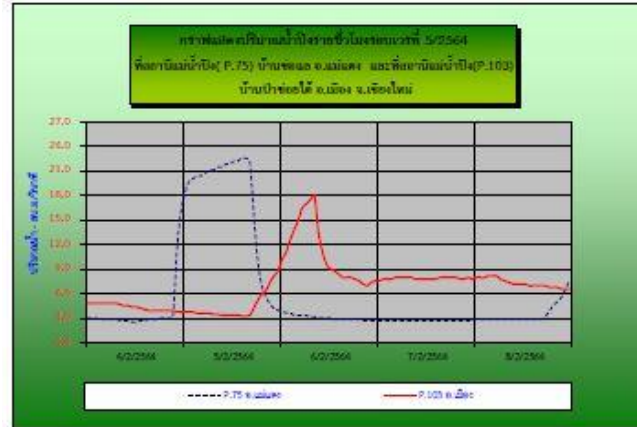

ปริมาณน้ำที่ปล่อยผ่านสถานี (P.75) น้ำเขื่อนแม่งัด และพิกัดน้ำเขื่อนแม่งัด (P.103) น้ำเขื่อนแม่งัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัน/ปี	P.75	Base Flow		ปริมาณน้ำที่เก็บกัก		P.103	Base Flow		ปริมาณน้ำที่ระบาย	ช่วงเวลาที่ระบาย
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.		
๑ ก.พ. ๖4	0.110	0.054	0.033	0.064						22.00 - 24.00
๕ ก.พ. ๖4	1.481	0.209	1.490	-0.258	0.167	0.092	0.075	0.075	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
๖ ก.พ. ๖4	0.267	0.209	0.306	-0.286	0.939	0.315	0.623	0.623	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
7 ก.พ. ๖4					0.681	0.315	0.366	0.366	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
รวม	1.858	0.529	1.828	-0.498	1.786	0.723	1.063			

การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๖

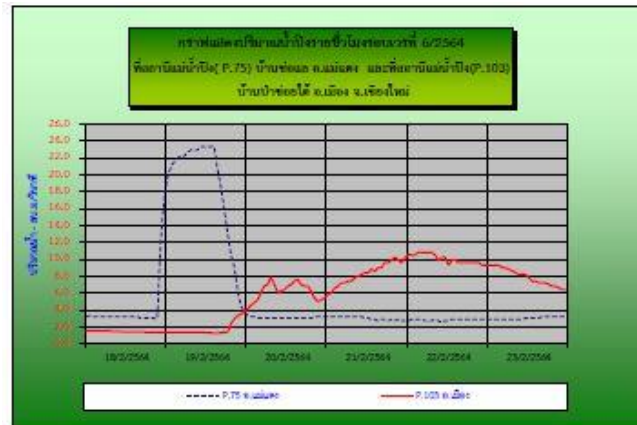

ปริมาณน้ำที่ปล่อยผ่านสถานี (P.75) น้ำเขื่อนแม่งัด และพิกัดน้ำเขื่อนแม่งัด (P.103) น้ำเขื่อนแม่งัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัน/ปี	P.75	Base Flow		ปริมาณน้ำที่เก็บกัก		P.103	Base Flow		ปริมาณน้ำที่ระบาย	ช่วงเวลาที่ระบาย
	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.	ล้าน ลบ.ม.		
18 ก.พ. ๖๕	0.108	0.022	0.019	0.039						23.00 - 24.00
19 ก.พ. ๖๕	1.581	0.263	0.266	1.054	0.067	0.034	0.033	0.033	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
20 ก.พ. ๖๕	0.267	0.263	0.276	-0.272	0.535	0.117	0.418	0.418	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
21 ก.พ. ๖๕	0.265	0.263	0.276	-0.275	0.719	0.117	0.602	0.602	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
22 ก.พ. ๖๕					0.868	0.117	0.751	0.751	01.00 - 24.00	01.00 - 24.00
รวม	2.208	0.810	0.836	0.562	2.188	0.384	1.804			

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปสถานการณ์น้ำ...



๓.๒ สรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

นายอภิวัดน์ ภูมิไธสง ผจบ.ขป.๑ มอบหมาย นายธนิต จำภา บ.น.ขป.๑ รายงาน สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ โดยสรุป ดังนี้

๑. สถานการณ์น้ำ น้ำฝน/น้ำท่า/น้ำในอ่าง

ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนมีแนวโน้มลดลง

ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้บริหารจัดการน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน

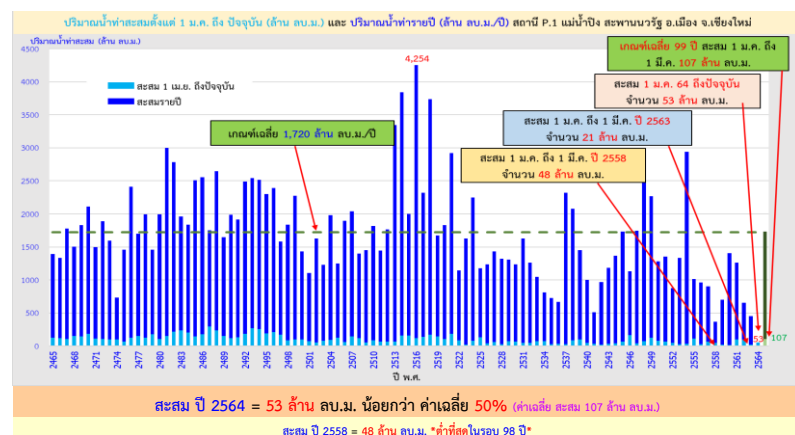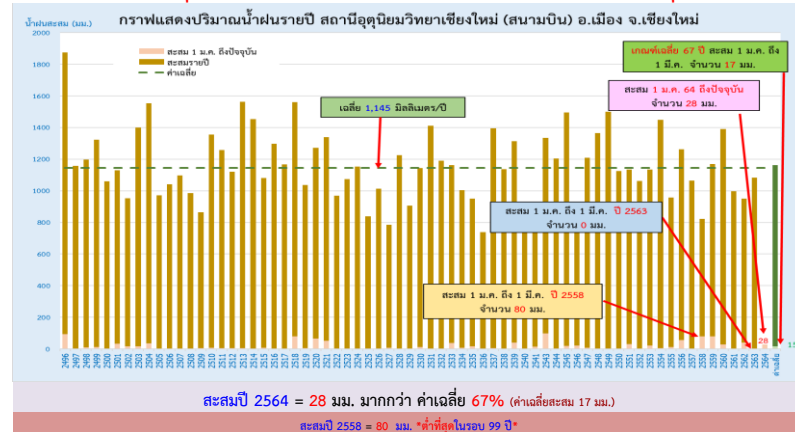

สถานการณ์แหล่งน้ำชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑ มี.ค.๖๔

ขนาดเล็ก ความจุตั้งแต่ 1 แสน ม. ³ จำนวน 117 แห่ง	ขนาดกลาง จำนวน 13 แห่ง	ขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง	
		เขื่อนแม่งัดตา	เขื่อนแม่งาง
> น้อยกว่า 30% จำนวน 41 แห่ง > ช่วง 30-50% จำนวน 22 แห่ง > ช่วง 50-80% จำนวน 38 แห่ง > ช่วง 80-100% จำนวน 16 แห่ง > มากกว่า 100% จำนวน 0 แห่ง	> น้อยกว่า 30% จำนวน 2 แห่ง > ช่วง 30-50% จำนวน 6 แห่ง > ช่วง 50-80% จำนวน 4 แห่ง > ช่วง 80-100% จำนวน 1 แห่ง > มากกว่า 100% จำนวน 0 แห่ง	ปัจจุบัน 122.123 ล้าน ม.³ (46.08%) ปี 63 111.849 ล้าน ม.³ (42.21%) Lower Rule Curve 135.34 ล้าน ม.³	ปัจจุบัน 76.013 ล้าน ม.³ (28.90%) ปี 63 70.375 ล้าน ม.³ (26.76%) Lower Rule Curve 86.74 ล้าน ม.³
ภาพรวม 30.72 ล้าน ลบ.ม. 47%	ภาพรวม 32.35 ล้าน ลบ.ม. 31%	ภาพรวม 198.136 ล้าน ลบ.ม. (38%)	
เก็บกักน้ำได้ 35.05 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้ 70.54 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้ 142.88 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้ 186.99 ล้าน ลบ.ม.
ภาพรวม เก็บกักน้ำได้อีก 329.87 ล้าน ลบ.ม.			

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2564


อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แห่ง
ความจุรวม 31

น้อยกว่า 30 % มี 2 แห่ง

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2564)	ความจุที่ รวมเก็บ กัก นก. (ล้าน ม. ³)	ปริมาณน้ำในอ่าง ปี 2563		ปริมาณน้ำในอ่าง ปัจจุบัน	
		ปริมาณ น้ำ (ล้าน ม. ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.	ปริมาณ น้ำ (ล้าน ม. ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.
โครงการชลประทานเชียงใหม่					
อ่างฯ แม่ฮอน ค.ฮอนเหนือ อ.แม่ออน	4.53	1.23	27.17%	1.84	40.71%
อ่างฯ แม่โคไร่ ค.ฮอนเหนือ อ.แม่ออน	0.85	0.65	76.12%	0.79	92.71%
อ่างฯ แม่จอกหลวง ค.ตอนบน อ.แม่วิน	1.10	0.91	82.82%	0.60	54.73%
อ่างฯ แม่กั้น ค.ป่าใหม่ อ.พร้าว	5.53	3.49	63.07%	2.38	42.98%
อ่างฯ แม่สะออน ค.ป่าห้วย อ.พร้าว	16.240	-	-	5.28	32.52%
อ่างฯ หัวมะนาว ค.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง	4.30	1.19	27.77%	1.95	45.35%
อ่างฯ ป่าห้วย ค.สันติสุข อ.ดอยหล่อ	2.60	0.69	26.62%	0.67	25.58%
อ่างฯ หัวเสือ ค.แม่ฮอน อ.แม่ฟ้าหลวง	4.27	0.97	22.75%	2.10	49.16%
อ่างฯ แม่สะลองหลวง ค.แม่อาย อ.แม่อาย	3.64	1.31	35.95%	1.25	34.44%
อ่างฯ แม่สุบ ค.ปัว อ.ดอยเต่า	39.00	6.70	17.17%	3.06	7.84%
อ่างฯ สันตนาถ ค.ช้างเผือก อ.แม่แจ่ม	1.45	1.07	69.38%	0.86	59.17%
อ่างฯ แม่ฮอน ค.เมืองงาย อ.เชียงดาว	4.08	2.23	54.73%	2.21	54.26%
อ่างฯ แม่สะลองหลวง	15.30	6.24	40.78%	9.36	61.20%
รวม จำนวน 13 แห่ง	102.897	26.62	25.87%	32.36	31.44%

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดลำพูน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

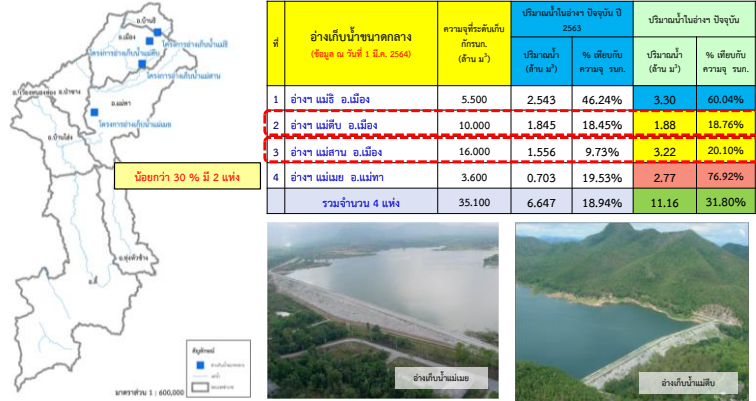

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)



๒. แผน/ผลการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔

- โครงการขนาดใหญ่ /ขนาดกลาง ในเขต สขป.๑

สรุป แผน / ผล การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64

ข้อมูล ณ วันที่ 17 - 23 ก.พ. 64

โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ข้าวนาปรัง				พืชไร่ - พืชผัก				ไม้ผล - ไม้ยืนต้น				ปอปลาก				อื่นๆ				รวม	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	% ผล เก็บเกี่ยว	% เก็บ เกี่ยว
		แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	ผล คิดเป็น (ไร่)	เก็บเกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)					
โครงการชลประทานเชียงใหม่	140,339	5,355	24,488	13,256	0	2,993	2,448	0	21,720	31,391	0	361	362	0	520	7	0	30,949	59,096	0	191%	0%			
โครงการชลประทานลำพูน	116,400	0	8,521	8,336	0	771	771	0	66,979	66,979	0	143	143	0	0	0	0	67,893	76,414	0	113%	0%			
...เขตชลประทาน...	96,900	0	8,521	8,336	0	771	771	0	66,939	66,939	0	143	143	0	0	0	0	67,135	69,674	0	117%	0%			
...เขตชลประทาน...	19,500	0	0	0	0	0	0	0	16,740	16,740	0	0	0	0	0	0	0	16,740	16,740	0	100%	0%			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	12,238	80	0	0	0	9,210	8,718	0	1,236	1,236	0	157	157	0	107	107	0	10,790	10,218	0	95%	0%			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	74,044	13,286	13,286	13,896	0	6,701	6,701	0	19,781	19,781	0	405	406	0	113	113	0	40,286	40,287	0	100%	0%			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	148,400	40,000	40,000	36,647	0	8,000	936	0	25,005	25,005	0	3212	3,212	0	0	0	0	76,267	69,815	0	92%	0%			
...เขตชลประทาน...	96,900	40,000	36,622	35,511	0	8,000	936	0	17,508	17,508	0	2639	2,639	0	0	0	0	62,997	58,044	0	81%	0%			
...เขตชลประทาน...	51,878	0	5,101	0	0	0	0	0	13,297	13,297	0	573	573	0	0	0	0	13,870	18,971	0	137%	0%			
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	99,298	0	12,808	15,622	0	352	937	0	26,208	26,208	0	713	713	0	15	15	0	27,288	40,681	0	149%	0%			
รวม	590,719	58,721	99,715	77,757	0	28,027	30,911	0	160,979	170,450	0	4,991	4,993	0	755	242	0	253,473	296,511	0	117.0%	0%			
...			170%	0%		75%	0%		106%	100%		32%	0%					117.0%	0%		117.0%	0%			

ข้าวนาปรัง แผน 58,721 ไร่ / ผล 99,715 ไร่ คิดเป็น 170 %


รวม แผน 253,473 ไร่ / ผล 296,511 ไร่ คิดเป็น 117 %

จังหวัด	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ข้าวนาปรัง				พืชไร่ - พืชผัก				ไม้ผล - ไม้ยืนต้น				ปอปลาก				อื่นๆ				รวม	% ผล เก็บเกี่ยว	% เก็บ เกี่ยว
		แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	ผล คิดเป็น (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บ เกี่ยว (ไร่)				
เขตจังหวัดเชียงใหม่	429,703	58,641	86,093	69,421	0	18,046	11,422	0	96,207	105,678	0	4,118	4,120	0	648	135	0	177,660	207,648	0	117%	0%		
เขตจังหวัดลำพูน	148,778	0	13,622	8,336	0	771	771	0	63,536	63,536	0	716	716	0	0	0	0	65,023	70,645	0	121%	0%		
เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,238	80	0	0	0	9,210	8,718	0	1,236	1,236	0	157	157	0	107	107	0	10,790	10,218	0	95%	0%		
รวม	590,719	58,721	99,715	77,757	0	28,027	20,911	0	160,979	170,450	0	4,991	4,993	0	755	242	0	253,473	296,511	0	117.0%	0%		
% เก็บเกี่ยว			170%	0%		75%	0%		106%	100%		32%	0%					117.0%	0%		117.0%	0%		


แผน/ผล การจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔

ลำดับความสำคัญ 1.อุปโภค-บริโภค 2.รักษาระบบนิเวศและการท่องเที่ยว 3.การเกษตร 4.อุตสาหกรรม




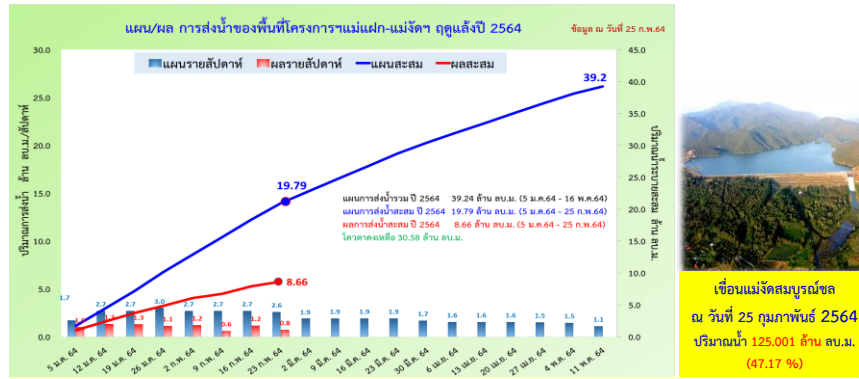

เขียนแม่จิดสมบูรณ์ชล
 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 ปริมาณน้ำ 125,001 ล้าน ลบ.ม.
 (47.17 %)

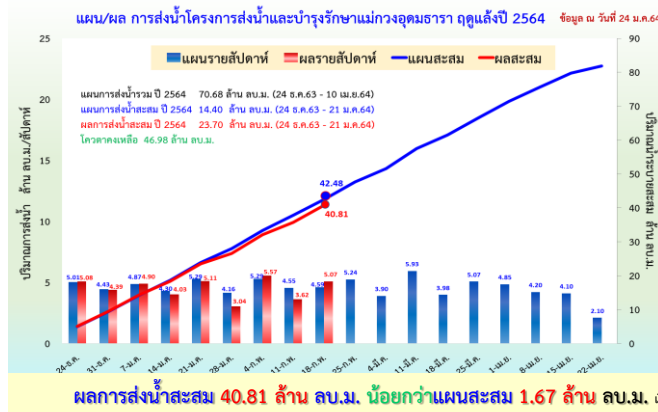

เขียนแม่กวังอุดมธรา
 ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 ปริมาณน้ำ 78,188 ล้าน ลบ.ม.
 (29.73 %)

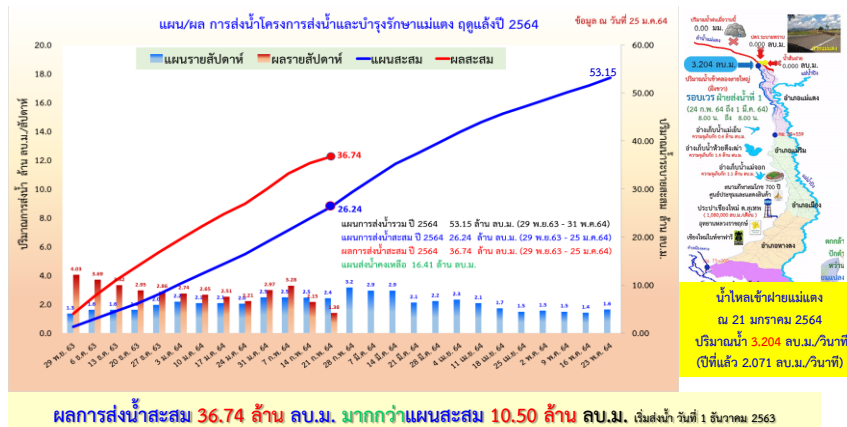

น้ำไหลเข้าฝายแม่แตง
 ณ 21 มกราคม 2564
 ปริมาณน้ำ 3,204 ลบ.ม./วินาที
 (ปีแล้ว 2,071 ลบ.ม./วินาที)

๒. แผน/ผลการบริหารจัดการน้ำ ถุดั้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔

- พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน



แผนการส่งน้ำ...

๓. การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง
บัญชีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งของ สขป.๑

ที่	เครื่องจักร-เครื่องมือ	จำนวน	หน่วย
1	เครื่องสูบน้ำ 8" - 12"	82	เครื่อง
2	รถสูบน้ำ 12"	2	คัน
3	รถขุด	5	คัน
4	รถบรรทุก	25	คัน
5	รถบรรทุกน้ำ	16	คัน
6	รถแทรกเตอร์	1	คัน
7	สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ยาว 44 เมตร	1	หน่วย
8	เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ	11	คัน
	รวม	143	

แผน/ผลการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค-บริโภค ปี ๒๕๖๓/๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)							
		๘"		๑๐"		๑๒"		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
๑	โครงการ ขป.เชียงใหม่	๑๗	๓	๐	-	๑	-	๑๘	๓
๒	โครงการ ขป.ลำพูน	๑๓	-	๑	-	๑	-	๑๕	-
๓	โครงการ ขป.แม่ฮ่องสอน	๔	-	๐	-	๐	-	๔	-
๔	โครงการส่งน้ำแม่แตง	๑๙	-	๓	-	๒	-	๒๔	-
๕	โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่จันดา	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๖	โครงการส่งน้ำแม่กวาง	๑๙	๓	๑	-	๐	-	๒๐	๓
	รวม	๗๒	๖	๔	๐	๔	๐	๘๐	๖

ปัจจุบัน สูบน้ำช่วยเหลือ 825,000 ลบ.ม.

พื้นที่ช่วยเหลือ 2,496 ไร่

การเก็บกักน้ำในแก้มลิงตามแนวคลองส่งน้ำแม่แตง เพื่อสำรองน้ำแก้ไขปัญหายากแล้งปี ๒๕๖๔



๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓-๖๔

สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 63- 15 ก.พ. 64

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ				
		ส.พ.ก.		JMC		ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ (ครั้ง)
		ครั้ง	เกษตรกร (คน)	ครั้ง	เกษตรกร (คน)	
๑	โครงการชลประทานเชียงใหม่					๒๕
๒	โครงการชลประทานลำพูน					
๓	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน			๑	๕๐	๕
๔	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง			๑	๑๒๓	๕๓
๕	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จันสมบูรณ์ชล					๕๒
๖	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางผดุงธารา	๕	๑๘๓	๑	๑๕๗	๔
	รวมสำนักงานชลประทานที่ ๑	๕	๑๘๓	๓	๓๓๐	๑๒๙

ศูนย์รับเรื่อง...

๓.๓ สรุปผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 นายนิธิ วรมงคล ผผง.ขป.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยสรุป ดังนี้

รายละเอียดรายการงานกันเงินไว้เบิกเหลือปี/เงินขยาย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	ชื่อรายการ	งบประมาณ (บาท)			ยอดเงินกับ ที่ถูกหักไป (บาท)	สถานะ ดำเนินงาน	ปี	เงินกับสถานะ ดำเนินงานในปัจจุบัน	งบประมาณที่มี ความจำเป็นที่ต้อง ใช้ต่อ (บาท)	แหล่งของ งบประมาณที่ ต้องขอใช้ต่อ	เหตุผลความ จำเป็นที่ต้อง ใช้งบประมาณต่อ	หมายเหตุ
		งบเงินกับคงเหลือ ยอดยกมา (30ก.ย.62)	เบิกจ่ายเงินกับ (บาท)	ร้อยละ								
1	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อม ระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอ ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	21,056,579.12	18,531,661.80	88.01	2,524,917.32	ถูกหัก	62	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	713,305.98	งบประมาณ เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เนื่องจากยัง เหลือจ่าย เขตไฟฟ้าที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อ จ่ายปีพ.ศ.2564 ตามบันทึก สขป.1/255/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินกันเหลือปี ๖๓)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โครงการ/แผนงาน	กันเหลือปี 2563						
	(รายการ)	กันเหลือปี63	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
		รวมทั้งสิ้น					
คป.เชียงใหม่	12	41,359,712.13	35,680,980.63	86.27	5,678,731.50	10	2
คป.แม่ฮ่องสอน	3	15,988,472.13	4,721,249.25	29.53	11,267,222.88	1	2
คป.แม่แก้ว	2	3,324,791.70	3,322,985.90	99.95	1,805.80	2	
คป.แม่แตง	3	5,402,929.80	432,730.45	8.01	4,970,199.35		3
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	1	2,946,023.00	-	-	2,946,023.00		1
โครงการก่อสร้างฯ	9	93,652,061.62	46,924,442.23	50.11	46,727,619.39	7	2
ส่วนบริหารจัดการน้ำ สขป.1	2	21,965,066.35	21,365,196.10	97.27	599,870.25	1	1
งบดำเนินงาน สขป.1	2	197,731.00	89,253.75	45.14	108,477.25	1	1
งบดำเนินงาน คป.เชียงใหม่	1	64,400.00	64,400.00	100.0	-	1	
งบดำเนินงาน คป.แม่ฮ่องสอน	1	197,950.00	65,983.32	33.33	131,966.68		1
รวมทั้งสิ้น	36	185,099,137.73	112,667,221.63	60.87	72,431,916.10	23	13

ผคป.เชียงใหม่ : โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฯ อินทราคนธี ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ
 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฯ เบญจมา ๑ จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๖๔

ผคป.แม่แตง : ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย ๒L - ๑๙L และปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC พร้อมอาคารประกอบ
 (ระยะที่ ๑) ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับถนนคันคลองส่งน้ำ RMC ช่วง กม.๓๒+๓๐๐-กม.๓๓+๓๐๐
 ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย

ผสร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๐๘ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง คณะกรรมการอุทธรณ์ยัง
 ไม่ได้ตอบกลับเรื่องค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ซึ่งได้ทำเรื่องสอบถามไปที่กรมชลประทานแล้ว

ประธาน : ให้ศูนย์ฯ ทำหนังสือติดตามทวงถามผลการพิจารณาทุกเดือน

ผวศ.ขป.๑ : ๑) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
 ตามอายุสัญญา ๒) จัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๔

ผจบ.ขป.๑ : ปรับปรุงทำนบกั้นดินพร้อมฐานรากเขื่อนห้วยตาผา ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่าย
 ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน : มอบส่วนแผนงานรายงานรูปภาพการดำเนินงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินกันเหลือปี ๖๓)
 เสนอที่ประชุมรับทราบด้วย

ผผง.ขป.๑ : รับทราบดำเนินการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลำดับ	หน่วยงาน	พจน.๖4 331 รายการ ย่อ 5 รายการ โอนให้สำนักเครื่องจักรกลงาน 4 รายการ ค.ณ.๓๒๒ รายการ		ได้รับจัดสรร (ข้อมูล ณ 23 ก.พ. 64)		อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง				ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง							
						อู่ระหว่างรออนุมัติแผนฯ		อนุมัติแผนฯแล้วเสร็จ	ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง	รับราคา		ลงนาม		คืบหน้างาน			
		จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)
1	คป.เชียงใหม่	65	284.76	65	284.76			65	284.76					64	283.76	1	1.00
2	คป.ลำพูน	41	177.05	40	112.05			41	177.05					39	111.05	2	66.00
3	คป.แม่ฮ่องสอน	19	50.70	19	50.70			19	50.70			2	10.90	17	39.80	2	10.90
4	คป.แม่ฮ่องสอน-แม่จัน	50	86.08	50	86.08			50	86.08			1	1.00	49	85.08	1	1.00
5	คป.แม่ฮ่องสอน	58	94.23	58	94.23	1	1.00	57	93.23					57	93.23	1	1.00
6	คป.แม่ฮ่องสอน	64	216.00	64	216.00			64	216.00	1	1.00			63	215.00	1	1.00
7	ศูนย์อำนวยการอำนวยการ	9	33.14	9	33.14			9	33.14					9	33.14		
8	คป.สบ.1	5	174.00	5	174.00			5	174.00					5	174.00		
9	ส่วนเครื่องจักรกล	2	1.73	2	1.73			2	1.73					2	1.73		
10	ส่วนแผนงาน	5	7.75	5	7.75			5	7.75					5	7.75		
11	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	1	14.52	1	14.52			1	14.52					1	14.52		
12	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	3	60.50	2	21.50			3	60.50					2	21.50	1	39.00
	รวม	322	1,200.46	320	1,096.46	1	1.00	321	1,199.46	1	1.00	3	11.90	313	1,080.56	9	119.90

รายการที่ยังไม่ได้ลงนามในระบบ Cen-project ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายการ	วงเงินตาม พจน.๖4	ได้รับจัดสรร	ขั้นตอน	หมายเหตุ
9		รวม	119,900,000	14,109,000		
1	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สบ.1	2) ปรับปรุงท่อระบายน้ำสายเชื่อมแม่จัน-แม่ฮ่องสอน (ต้นเชื่อมมาจากโครงการสร้าง) ค่าก่อสร้าง 39,000,000	39,000,000		อนุมัติแผน	อยู่ระหว่าง e-bidding คาดว่าได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
2	โครงการชลประทานลำพูน	1) อาคารควบคุมการระบายน้ำของสถานี ที่ที่ปรับปรุงใหม่ 2,000 ไร่ ค่าก่อสร้าง 65,000,000	65,000,000		อนุมัติแผน	กำหนดเปิดประมูลวันที่ 8 มีนาคม 2564
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	1.12) ก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หลัง ค่าก่อสร้าง 9,900,000	9,900,000	8,109,000	อนุมัติรับราคา	อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง ตามบันทึก สบ.1/197/2564
4	โครงการชลประทานลำพูน	1.159) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานลำพูน ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	อนุมัติแผน	หน่วยดำเนินการส่งรายงานตามต้องการ เพื่อดำเนินการจ้าง/จ้าง (RC)
5	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	1.158) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	อนุมัติรับราคา	ลงนามแล้ว ยังไม่ได้บันทึกที่ซื้อในระบบ Cen-project
6	โครงการชลประทานเชียงใหม่	1.128) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 11 รายการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	อนุมัติแผน	ดำเนินการรับแผนการดำเนินการ อยู่ระหว่างกรมเสนอสำนักงานประมง
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร	1.84) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	ประกาศจัดซื้อ	ลงนามแล้ว ยังไม่ได้บันทึกที่ซื้อในระบบ Cen-project
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร	1.49) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 11 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	อนุมัติรับราคา	หน่วยดำเนินการส่งรายงานตามต้องการ เพื่อดำเนินการจ้าง/จ้าง (RC)
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร	1.1) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของกรมการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม้งดุดมธรร ค่าก่อสร้าง 1,000,000	1,000,000	1,000,000	อยู่ระหว่างอนุมัติแผน	เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผผ.ชป.๑ : ขอให้โครงการเร่ง Revised ประมาณการงาน ๑ ล้าน ๑ โครงการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเองส่งให้ส่วนแผนงาน แล้วเร่งรัดการจัดหาด้านพัสดุ ทำข้อผูกพันให้ทันภายในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และลงในระบบ Cen-project

ผคป.เชียงใหม่ : โครงการฯ ได้แจ้งส่วนแผนงานแล้วว่าขอเปลี่ยนแปลงใบจัดสรรจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงใบจัดสรรเป็นงานดำเนินการเอง ถึงจะทำข้อผูกพันได้

ผคบ.แม่แม่งดุดมธรร รก.ผคบ.แม่แม่งดุดมธรร : ใบจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเป็นงานจ้างเหมา สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผคป.ลำพูน รก.รอง ผส.ชป.๑ : เติมโครงการฯ จ้างกลุ่มผู้ใช้น้ำ แต่ กต.ท้วงว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นนิติบุคคล ต้องจ้างรายบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่ม โครงการฯ จึงขอให้กลุ่มคัดเลือกสมาชิกมาเป็นผู้รับจ้าง และจะเริ่มดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

วค.คป.แม่ฮ่องสอน : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ กลุ่ม

ผผ.ชป.๑ : โครงการฯ ที่มีงานจ้างเหมา หากสามารถจ้างเหมาได้ ไม่จำเป็นต้อง Revise ประมาณการ หากโครงการฯ จะดำเนินการเอง ต้อง Revise ประมาณการ

วค.คป.แม่แม่งดุดมธรร : โครงการฯ แม่แม่งดุดมธรร จ้างเหมา ๒ กลุ่ม


ผผ.ชป.๑ : สรุปทั้ง ๖ รายการ สามารถลงนามในระบบ Cen-Project ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และในปีงบประมาณ พ.๒๕๖๕ ขอให้โครงการฯ จัดทำประมาณการเป็นงานดำเนินการเองทุกรายการ

สรุปผลการจัดสรร...


สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๖๔ (ข้อมูล ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	พ.ร.บ. 64 ตามประมาณการ (รวมค่าจ้างราชการ)		พ.ร.บ. 64 ตามประมาณการ (แยกค่าจ้างราชการ/งบเงินที่หักเงิน)		ได้รับจัดสรร (แยกค่าจ้างราชการ)		ผลการเบิกจ่าย (แยกค่าจ้างราชการ)			ค่าการณ้เบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 64 (ร้อยละจัดสรร)	ผลงาน	
		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	ร้อยละเทียบพ.ร.บ.	(บาท)	ร้อยละเทียบจัดสรร			ร้อยละเทียบพ.ร.บ.
	แยกรายโครงการ	326	1,251,766,200	321	1,197,566,200	319	1,002,752,663	83.73	355,937,364	35.50	29.72	34.21	29
1	คป.แม่เหล็ก-แม่จัน	50	92,882,200	49	83,028,200	49	82,669,705	99.57	47,205,736	57.10	56.86	40.00	53
2	คป.แม่ฮ่องสอน	20	65,700,000	19	49,379,400	19	41,768,571	84.59	21,325,836	51.06	43.19	39.80	49
3	คป.เชียงใหม่	66	287,259,000	65	274,410,400	65	211,561,788	77.10	95,368,169	45.08	34.75	39.66	34
4	คป.แม่แตง	58	94,234,000	58	90,990,000	58	91,302,000	100.00	34,835,742	38.15	38.29	35.00	38
5	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	10	55,135,000	9	33,135,000	9	33,135,000	100.00	10,634,365	32.09	32.09	40.00	35
6	โครงการก่อสร้าง สขป.1	5	174,000,000	5	170,052,000	5	165,731,399	97.46	49,201,088	29.69	28.93	30.00	11
7	คป.แม่กา	64	216,004,000	64	211,536,370	64	210,623,670	99.57	61,465,157	29.18	29.06	32.00	26
8	คป.ลำพูน	42	182,052,000	41	174,223,730	40	99,495,330	57.11	24,884,317	25.01	14.28	32.00	25
9	สขป.1	11	110,811,100	11	110,811,100	10	66,465,200	59.98	11,016,955	16.58	9.94	22.59	17
เป้าหมายเบิกจ่าย		ไตรมาส 1		เดือน ม.ค.64		เดือน ก.พ.64		ไตรมาส 2 (สิ้นเดือน มี.ค.64)		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
เป้าหมาย กรมฯ		20.00		28.33		36.66		45.00		65.00		100.00	
เป้าหมาย สำนัก		22.24		26.02		34.21		47.05		71.28		100.00	


กราฟแสดงผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

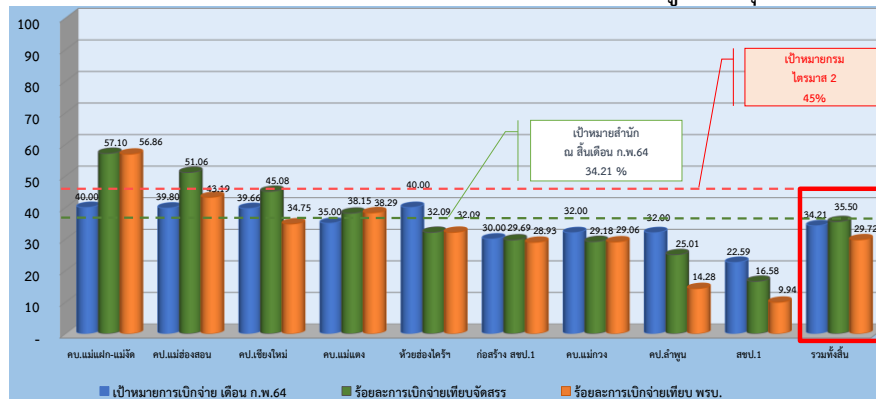

กราฟแสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

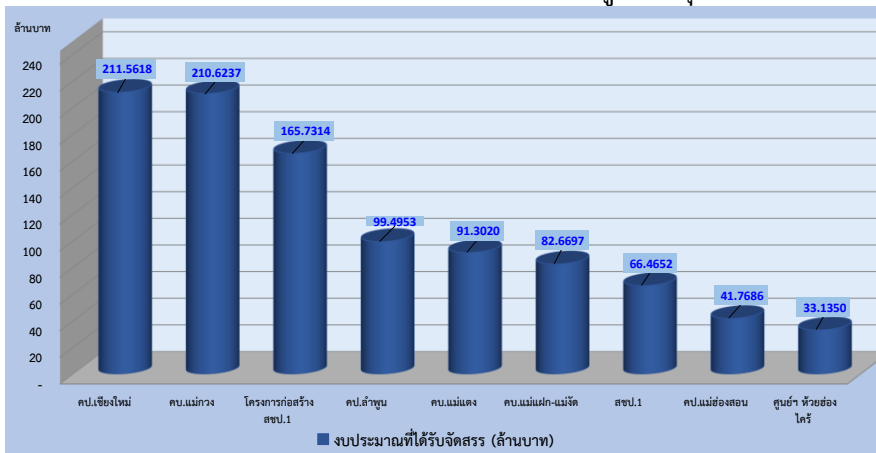

กราฟแสดงคาดการณ์เบิกจ่ายสิ้นไตรมาส ๒ (ปรับแก้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) งบ พ.ร.บ. ๖๔

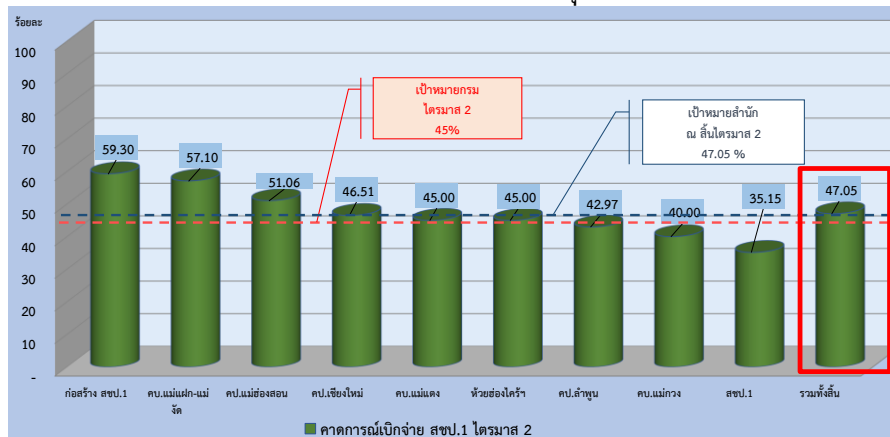

ผผง.ขป.๑ : กราฟแสดงคาดการณ์เบิกจ่ายสิ้นไตรมาส ๒ เป็นการคาดการณ์ของส่วนแผนงาน ขอให้โครงการฯ ยืนยันตัวเลขการคาดการณ์การเบิกจ่าย

ผคป.แม่แฝก-แม่จัน รก. ผคป.แม่แตง : โครงการฯ แม่แฝก-แม่จัน และโครงการฯ แม่แตง จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๖๕% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ผคป.แม่ฮ่องสอน : โครงการฯ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๕๕% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ผคป.เชียงใหม่ : โครงการฯ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๔๖% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ : ศูนย์ฯ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๔๕% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ผคป.ลำพูน : โครงการฯ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๔๒% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ผจบ.ขป.๑ รก ผคป.แม่กวงฯ : โครงการฯ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมาย ๔๐% ณ สิ้นไตรมาส ๒

ประธาน : โครงการฯ ใดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ควรศึกษาวิธีการดำเนินการของโครงการฯ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูง และขอให้โครงการฯ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของรายการงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ล่วงหน้า

สรุปผลการจ้างแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จบ พ.ร.บ. ๖๔

ลำดับที่	โครงการ	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		แผนการจ้างแรงงาน		ผลการจ้างแรงงาน		ร้อยละผลการจ้างแรงงาน	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวน แรงงาน (%)	ค่าจ้างแรงงาน (%)
	รวม สขป.1 ทั้งสิ้น	300	1,132,368,000	5,352	356,047,807	4,029	77,695,567	75.28	21.82
	งบ พ.ร.บ. 64	300	1,132,368,000	5,352	356,047,807	4,029	77,695,567	75.28	21.82
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	61	278,194,800	1,565	91,087,500	998	24,353,364	63.77	26.74
2	โครงการชลประทานลำพูน	38	174,425,000	671	22,782,230	348	5,752,161	51.86	25.25
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	16	53,100,000	262	19,369,800	322	6,307,230	100.00	32.56
4	โครงการฯ แม่แฝก-แม่จัน	44	83,157,200	399	39,102,890	641	16,888,402	100.00	43.19
5	โครงการฯ แม่แตง	57	97,234,000	799	39,992,945	540	4,041,138	67.58	10.10
6	โครงการฯ แม่กวง	62	135,104,000	899	58,157,860	482	11,489,624	53.61	19.76
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	10	70,403,000	371	28,289,667	324	2,703,474	87.33	9.56
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	5	174,000,000	345	52,834,915	346	5,438,630	100.00	10.29
9	ส่วนแผนงาน	5	7,750,000	28	2,730,000	22	614,567	78.57	22.51
10	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สขป.1	2	59,000,000	13	1,700,000	6	106,978	46.15	6.29

ผผง.ขป.๑ : ขอให้โครงการฯ เร่งรัดการจ้างแรงงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนการจ้างแรงงาน

ผคป.เชียงใหม่ : ตามแผนการจ้างฯ โครงการฯ มีการจ้างแรงงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดการจ้างแรงงานเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผคป.ลำพูน : ตามแผนการจ้างฯ โครงการฯ มีการจ้างแรงงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผคป.แม่ฮ่องสอน : ได้จ้างแรงงาน ๓๒๒ คน ดำเนินการทุกรายการงานตามงบ พ.ร.บ.๒๕๖๔ แล้ว เป็นการจ้างแรงงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผคป.แม่แฝก-แม่จันฯ : สาเหตุที่ผลการจ้างแรงงาน ๖๔๑ คน มากกว่าแผนที่วางไว้ คือ ๓๙๙ คน เนื่องจากแรงงานทำงานไม่ครบ ๓ เดือน จึงต้องจ้างแรงงานมาดำเนินงานต่อ ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ประธาน : ขอให้ ผศร. และ ผอ.โครงการ ตรวจสอบแผนและผลการจ้างแรงงานด้วย

นายณัฐพล สิทธิการ : ศูนย์ฯ จ้างแรงงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ตามรายงานผลในระบบตัวเลขไม่ตรงกับข้อมูลของศูนย์ฯ จึงขอตรวจสอบในระบบ

ผผง.ขป.๑ : ขอให้ทุกโครงการตรวจสอบในระบบและแก้ไขให้ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการที่เสนอค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อมูล ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการ	เสนอค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕									
		สรุปค่าขอตั้งงบประมาณ		ส่งส่วนแผนงานสำนัก		โครงการขอเพิ่มเติม		โครงการส่งยกเลิก		ส่งกองแผนงาน	
		รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	100	664,880,200	98	689,209,000	-	-	2	9,650,000	98	689,209,000
2	โครงการชลประทานลำพูน	65	204,132,700	62	192,016,800	-	-	1	40,000,000	48	128,127,100
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	21	106,400,000	21	98,980,000	-	-	-	-	21	98,980,000
4	โครงการฯ แม่แตง	81	318,125,600	81	317,202,300	-	-	-	-	81	317,202,300
5	โครงการฯ แม่กวง	78	142,283,000	78	142,350,500	-	-	-	-	77	122,850,500
6	โครงการฯ แม่แฝก-แม่จัน	75	171,984,700	75	171,976,200	-	-	-	-	75	171,976,200
7	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	96	138,760,200	103	124,987,100	8	6,226,900	1	20,000,000	103	124,987,100
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	17	465,420,000	17	447,040,000	-	-	-	-	17	465,420,000
9	สำนักงานชลประทานที่ 1	10	61,208,000	9	46,208,000	-	-	-	-	9	46,208,000
	รวม	543	2,273,194,400	544	2,229,969,900	8	6,226,900	4	69,650,000	529	2,164,960,200

รายการที่...

รายการที่ค้ำส่งประมาณการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนัก	ที่	โครงการ/งาน/รายการ**	สถานที่ดำเนินการ						ขอตั้งปี 2565 ทั้งสิ้น (บาท) 14 ก.ย. 63	หน่วยงาน ดำเนินการ	
			ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมู่บ้าน		พิกัด			
						ย่อย	หลัก	Lat	Long		
		รวมทั้งสิ้น								21,120,000	
1	2	ระบบประปาภายในที่ทำการโครงการชลประทานลำพูน จำนวน 1 แห่ง	ศรีบัวบาน	เมืองลำพูน	ลำพูน	0607	06	18.5020	99.1185	5,000,000	คป.ลำพูน
1	3	ซ่อมแซมอาคารโรงงานช่างกลและอุปกรณ์ โครงการชลประทานลำพูน จำนวน 1 แห่ง	ศรีบัวบาน	เมืองลำพูน	ลำพูน	0607	06	18.5104	99.1304	600,000	คป.ลำพูน
1	1	ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	วัดเกต	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	0602	06	18.7901	99.0171	15,000,000	สขป.1
1	37	ซ่อมแซมท่อลอดถนนระบบส่งน้ำห้วยปลาตุก อ่างเก็บน้ำแม่อิง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน	บ้านธิ	บ้านธิ	ลำพูน	0607	06	18.6199	99.1773	520,000	คป.ลำพูน

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายณัฐวุฒิ นากสุก ผวศ.ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสรุป ดังนี้

แผนงานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนงาน	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร (ณ 01/03/64)	%	หมายเหตุ
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๘๓	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๙๔.๐๐	พค. และ ปช.
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕๘	๖,๗๖๖,๗๐๐	๔,๖๕๐,๑๐๐	๖๘.๗๐	
๓	ฝ่ายปรุพีและธรณีวิทยา	๕	๓,๕๑๘,๙๐๐	๒,๔๓๐,๒๐๐	๖๙.๑๐	
๔	ฝ่ายออกแบบ	๑๓๔	๖,๐๘๕,๐๐๐	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๗.๗๖	
๕	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	
	รวม	๒๗๕	๑๘,๐๓๐,๖๐๐	๑๒,๑๕๕,๓๐๐ (๖๗.๔๑ %)		

แผนงานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๔(หน่วยเบิกร่วม)

ลำดับ	รายการ	จำนวนงาน	วงเงินงบประมาณ	%	จำนวนงานที่ได้รับอนุมัติ	วงเงินงบประมาณ
๑	ฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๖	๓๒๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย งบป.ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนงาน	วงเงินงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ณ 01/03/64)	เบิกจ่าย	% (เทียบจัดสรร)
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๘๓	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๔๖.๖๕	๒๕.๘๔
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕๘	๖,๗๖๖,๗๐๐	๔,๖๕๐,๑๐๐	๒,๑๐๔,๓๓๘.๐๐	๔๕.๒๕
๓	ฝ่ายปรุพีและธรณีวิทยา	๕	๓,๕๑๘,๙๐๐	๒,๔๓๐,๒๐๐	๒,๐๒๗,๗๘๑.๐๐	๘๓.๔๔
๔	ฝ่ายออกแบบ	๑๓๔	๖,๐๘๕,๐๐๐	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑,๔๐๔,๑๗๐.๕๕	๓๙.๙๔
๕	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	-
๖	ฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	๑๖	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๖๗,๐๗๔.๕๕	๒๐.๙๖

เบิกจ่าย ๔๘.๗๓ % (จัดสรร)

ผวศ.ขป.๑ : ส่วนวิศวกรรม อาจจะเสนอขอของบประมาณแผนงานเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมเพิ่มเติมเนื่องจากมีงานงานนโยบายเร่งด่วน ซึ่งจะเสนอท่าน รชบ. อนุมัติต่อไป

ประธาน : ขอทราบความก้าวหน้างานนโยบายท่าน รชบ.

ผวศ.ขป.๑...

ผศ.ชป.๑ : เป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ โดยฟ้าห่มปก ที่ท่านองคมนตรี พลเอก สุรธรรมรัฐ มาติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ ขอให้โครงการฯ เชียงใหม่ รายงาน

วศ.คป.เชียงใหม่ : หัวหน้าอุทยานขอต่อคู่และซ่อมแซมบ่อ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่และจัดทำประมาณการ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสนอของบประมาณเป็นงานเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธาน : ขอให้เตรียมข้อมูลให้ ผศ.ชป.๑ ชี้แจงในที่ประชุมที่ท่านองคมนตรี นายพลเอก สุรธรรมรัฐ มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จังหวัดเชียงใหม่

นายประถม ทองปอ นายช่างโยธาอาวุโส แทน ผสญ.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้ ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ คิดเป็น ๕๙.๔๙% ลำบากกว่าแผน ๓๖.๓๖% (เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลงาน ๓.๑๒%)



รูปความก้าวหน้า...

รูปความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา



ปัญหาอุปสรรค

❖ งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แดง-แม่จิด สัญญาที่ 2 และงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด-แม่กวง สัญญาที่ 1 ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

แนวทางการแก้ไข

❖ การเร่งรัด ติดตามกระบวนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปัจจุบัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำประกาศรับฟังความเห็นฯ ตามมาตรา 8 วรรค 3 และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติให้ทบทรวงประกาศกระทรวงอีกครั้งโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาว่าประกาศ ก่อนเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

❖ ด้านธรณี (Unseen problem) เช่น โพร่งถ้ำในอุโมงค์ , น้ำใต้ดินสูง (ตาน้ำ) หินแข็ง (แกรนิตและรอยแตกมาก)เป็นต้น

❖ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของสัญญา

❖ การปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ / ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

❖ คณะกรรมการตรวจการจ้าง กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน

ขนาดกลางที่ ๑


นายอภิชาติ มงคลวัจน์ แทน ผสภ.๑ รายงานความก้าวหน้าในความรับผิดชอบ โดยสรุป ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 64	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564			คงเหลือ	แผนผล ที่โครงการ		ค่าจ้างจะผูกพันไม่ทันในเดือน ธ.ค. 63
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GFMS				แผน	ผล	
						จำนวนเงิน	% พ.ร.บ.	% จัดสรร				
โครงการจัดหาและดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบชลประทาน												
1	ทำแบบวิศวกรรมและอาคารประกอบ ความสูง 10.448 ล้าน ลบ.ม. โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	51,425,000.00	51,425,000.00	15,427,500.00	35,997,500.00	-	-	-	35,997,500.00	21.06	0.00	งานผูกพันเงิน
2	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	99,926.00	0.50	0.50	19,900,074.00	0.00	0.00	ผูกพันเงินแล้ว
3	ระบบส่งน้ำพิเศษอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง ความสูง 8.890 กม. ส่วนจ่ายน้ำ อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	98,300,000.00	98,300,000.00	-	98,300,000.00	3,354,902.92	3.41	3.41	94,945,097.08	75.92	70.92	ผูกพันเงินแล้ว
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	899,990.00	899,990.00	-	899,990.00	99,926.00	11.10	11.10	800,064.00			ผูกพันเงินแล้ว
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ												
5	คันดินน้ำพรืออาคารประกอบ โครงการคันดินน้ำประจวบมาถ้ำน้อย อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	19,986,700.00	19,986,700.00	15,901,188.58	4,085,511.42	-	-	-	4,085,511.42	100	87.75	งานผูกพันเงิน
รวม		190,611,690.00	190,611,690.00	31,328,688.58	159,283,001.42	3,554,754.92	1.86	2.23	155,728,246.50			

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 64 (เพิ่มเติม)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564			คงเหลือ	แผนผล ที่โครงการ		หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GFMS				แผน	ผล		
						จำนวนเงิน	% พ.ร.บ.	% จัดสรร					
โครงการจัดหาและดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบชลประทาน													
1	ระบบส่งน้ำพิเศษอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง ความสูง 8.890 กม. ส่วนจ่ายน้ำ อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0.00	0.00		
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ													
เงินเกินงบที่ 63													
ลำดับ <th rowspan="4">งาน</th> <th rowspan="4">งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 63</th> <th colspan="3">งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</th> <th colspan="3">ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564</th> <th rowspan="4">คงเหลือ</th> <th colspan="2">แผนผล ที่โครงการ</th> <th rowspan="4">เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ทัน</th>	งาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 63	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564			คงเหลือ	แผนผล ที่โครงการ		เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ทัน	
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	เกินงบที่ 63	ระบบ GFMS				แผน	ผล		
						จำนวนเงิน	% พ.ร.บ.	% เงิน					
เงินเกินงบที่ 63													
1	ทำแบบวิศวกรรมและอาคารประกอบ ความสูง 10.448 ล้าน ลบ.ม. โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	72,600,000.00	72,600,000.00	18,150,000.00	464,445.00	-	-	-	464,445.00	21.06	0.00	ค่าจ้างจะผูกพันไม่ทัน เดือน ธ.ค. 63	
2	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	70,000,000.00	70,000,000.00	25,496,577.27	28,095,415.12	5,071,373.27			18.05	23,024,041.85	100.00	12.00	เนื่องจาก 1) สัญญาจ้างที่ 63 มีการขอรับ 2) งานก่อสร้างยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการขอเสนอจำนวน 4 รายการเกินงบที่มีจำนวนเงิน 4 ล้านบาทเกินงบที่มีจำนวนเงิน 3 ล้านบาทขอรับเงินเกินงบ 1 ล้านบาท
3	ระบบส่งน้ำพิเศษอาคารประกอบ ส่วนบานน้ำบานเงิน ส่วนจ่ายน้ำ อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	21,287,000.00	21,287,000.00	-	11,493,899.40	8,808,482.25			74.90	2,885,417.15	100.00	86.50	เนื่องจากงบผูกพันงวดเงิน
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าจ้างงาน 825 เมตร ส่วนส่งน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่	61,000,000.00	61,000,000.00	3,280,816.24	1,029,407.68	752,319.15			73.08	277,088.53	100.00	84.56	เนื่องจากเป็นค่าจ้างที่จ้างงานในการ เบิกจ่าย ตามปริมาณงานที่เกินงบ ค่าจ้างงานเกินงบเงิน 1 ล้านบาท 2564
5	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (งานก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการจ่ายน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวง อ่างกวดน้ำ จ.พิจิตร-เชียงใหม่)	2,599,999.00	2,599,999.00	-	2,599,999.73	2,599,999.73			100.00	-	100.00	100.00	

โครงการคั่นกันน้ำ...

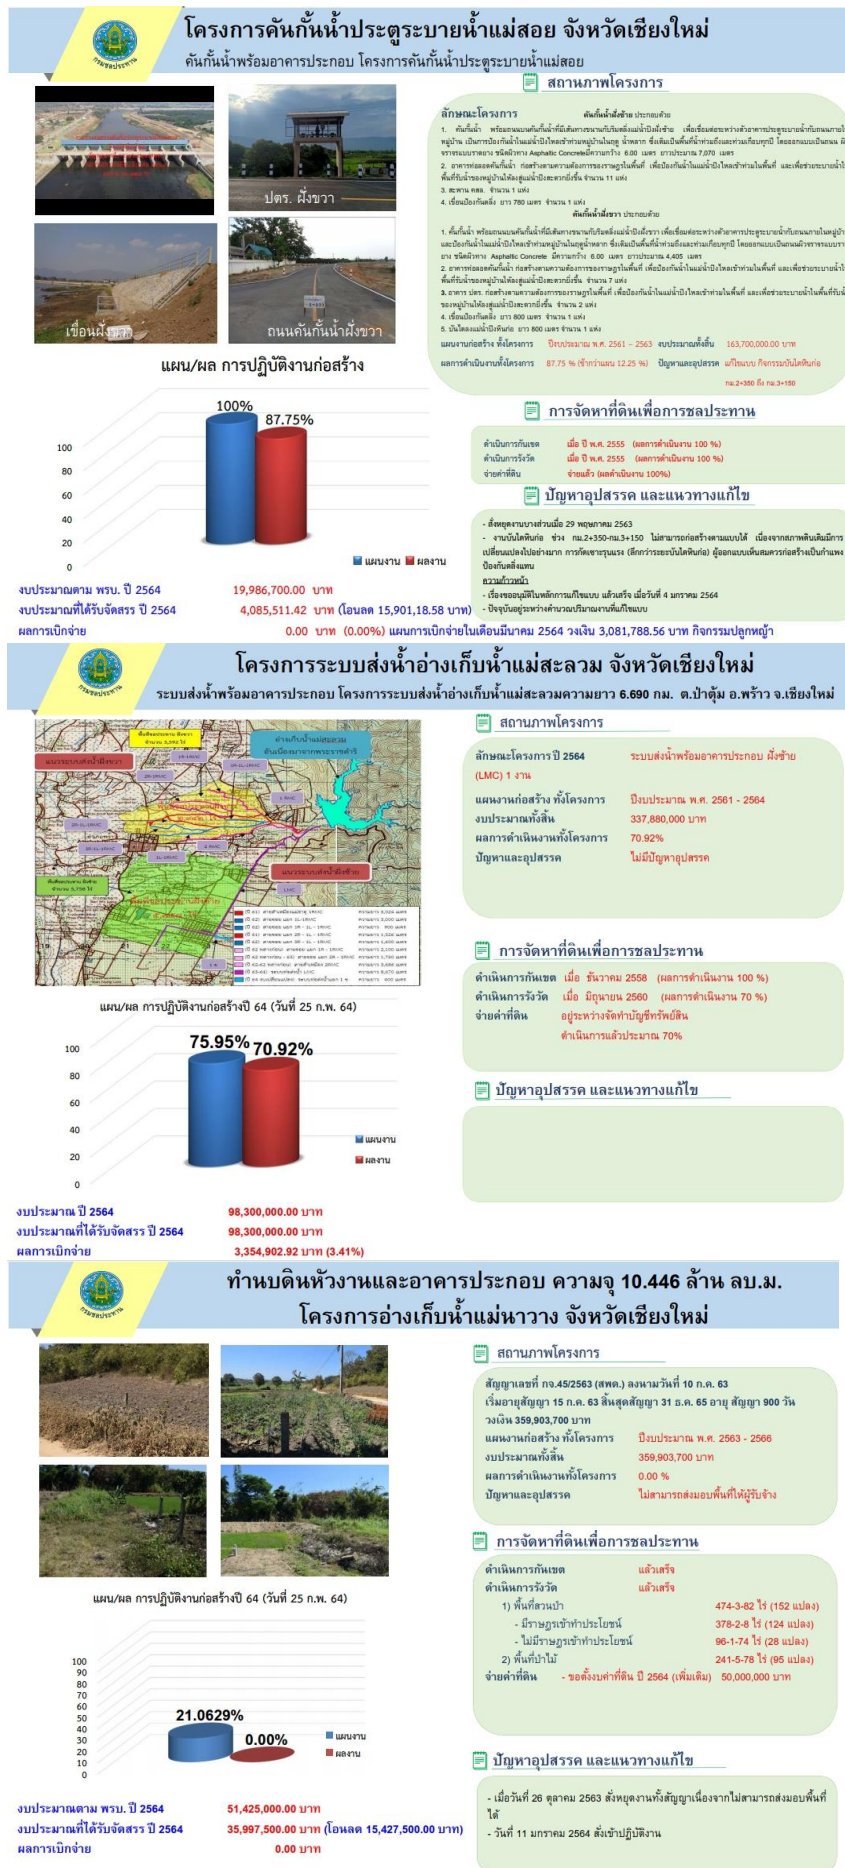



ค่าก่อสร้างส่วนประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนาว จังหวัดเชียงใหม่

(กันเหลื่อมปี 63)



สถานการณ์โครงการ

ลักษณะโครงการ ปี 2563 งานถนนเข้าโครงการ กม.4+700-6+159.746 ยาว 1.459 กม., งานปรับพื้นที่ลุ่มบริเวณ 1 งาน, งานถนนภายในลุ่มบริเวณหรือระยะประมาณน้ำ 1 งาน, งานระบบประปา 1 งาน, งานขยายเขตไฟฟ้า 1 งาน, งานบ้านพักถาวร 1 หลัง, งานอาคารชั่วคราว 8 แห่ง

แผนงานก่อสร้าง ทั้งโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 125,000,000 บาท

ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 12.00 %

ปัญหาและอุปสรรค (1) มีหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเข้างานบางส่วนแล้วทำให้ต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทำไม่ได้ซ้ำ (2) พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต ออป. มีราษฎรเข้าทำประโยชน์

การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

ดำเนินการกันเขต -

ดำเนินการขั้ววัด -

จ่ายค่าที่ดิน -

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ปัญหาเกี่ยวกับ ออป. ไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้าง

งบประมาณตาม พรบ. ปี 2563 70,000,000.00 บาท

ดินเงิน 25,496,577.27 บาท

คงเหลือ 44,503,422.73 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 15,948,342.31 บาท

- กันเหลื่อมปี 2563 28,095,415.12 บาท (เบิกจ่าย 5,071,373.27 บาท 18.05%)

- ดำเนินการ 24,843,162.84 บาท (เบิกจ่าย 4,271,868.82 บาท 17.20%)

- ค่าแรง 3,252,252.28 บาท (เบิกจ่าย 799,504.45 บาท 24.58%)



ค่าก่อสร้างส่วนประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนาว จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2564)



สถานการณ์โครงการ

ลักษณะโครงการ ปี 2564 งานอาคารที่ทำการ 2 แห่ง,บ้านพักถาวร 2 หลัง, งานผิวทางจราจรถนนภายใน 1 งาน

แผนงานก่อสร้าง ทั้งโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 125,000,000 บาท

ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 12.00 %

ปัญหาและอุปสรรค (1) มีหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเข้างานบางส่วนแล้วทำให้ต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทำไม่ได้ซ้ำ (2) พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต ออป. มีราษฎรเข้าทำประโยชน์

การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

ดำเนินการกันเขต -

ดำเนินการขั้ววัด -

จ่ายค่าที่ดิน -

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ปัญหาเกี่ยวกับ ออป. ไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้าง

งบประมาณตาม พรบ. ปี 2564 20,000,000.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 20,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท



อาคารป้องกันตลิ่งฝายวังป่าน จังหวัดลำพูน (กันเหลื่อมปี 63)

อาคารป้องกันตลิ่งฝายวังป่าน ความยาว 825 เมตร ต่อบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน



สถานการณ์โครงการ

แผนงานก่อสร้าง ทั้งโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 82.51% ข้างขวามืองาน 17.49%

ปัญหาและอุปสรรค ยกเลิกงานเข้าเขตโครงการสร้างรูปพรรณ เหล็กหักไฟ (พร้อมคอกและกอน) เนื่องจากมีผู้ยื่นฟ้อง 1 ราย ทำให้การจัดทำล่าช้า เป็นผลทำให้งานต่อเนื่องอื่น ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย

การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

ดำเนินการกันเขต -

ดำเนินการขั้ววัด -

จ่ายค่าที่ดิน -

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรค

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2564

งบประมาณตาม พรบ. ปี 2563 61,000,000.00 บาท


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 57,719,183.76 บาท

ผลการเบิก 56,654,634.68 บาท (92.88%)

เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 1,029,407.68 บาท

ผลการเบิกจ่าย 752,319.15 บาท (73.08%)

แผน/ผล การปฏิบัติงานก่อสร้างปี 64 (วันที่ 25 ก.พ. 64)




ประเภท	แผนงาน	ผลงาน
แผนงาน	100%	84.56%




ที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑

นายวิราพงษ์ อัครรัตน์ วศ.จ.๑ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ สรุปดังนี้

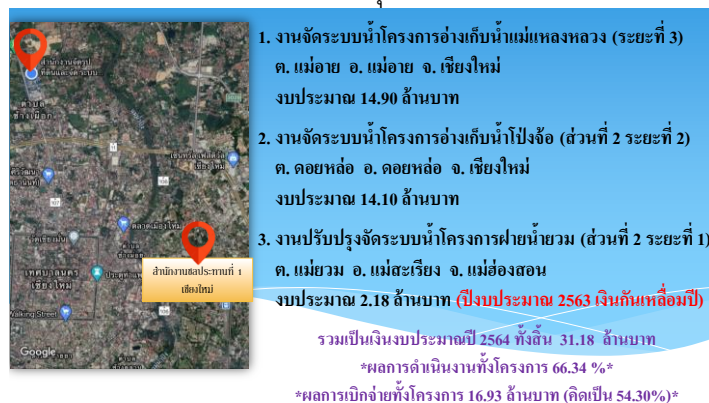

งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง (ระยะที่ 3) ตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่



*งานปีงบประมาณ 2564

- งบประมาณ 14.90 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 7.96 ล้านบาท (53.47%)
- ผลการดำเนินงาน 50.00 %



งานจัดระบบน้ำ...



ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผคป.แม่ฮ่องสอน : วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนารัฐบาลไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนารัฐบาลไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำที่หมายจำนวน ๔ แห่ง เรียบร้อยแล้ว

ผจบ.ขป.๑ : ๑) ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference เมื่อช่วงเช้านี้ รศบ. ประธานที่ประชุมได้แสดงความห่วงใยเรื่องสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จึงได้สั่งการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมิให้เผาเศษซากวัสดุ ขยะ หรือสิ่งต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วย

๒) ตามที่ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้สำหรับการใช้งานระบบ Mobile Application และ Website ในการติดตามสถานการณ์น้ำแบบการมีส่วนร่วม (SWOC PR) ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ จน.โครงการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนจัดสรรน้ำฯ จะได้ทำบันทึกแจ้งสรุปวิธีการใช้งานระบบให้แก่โครงการฯ ได้นำไปใช้งาน

๓) ตามที่ได้เข้าร่วม...

๓) ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัดผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะขอเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง

๔) ด้วย สบอ.มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้จัดส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทำในภาพรวมสำนักฯ เพื่อส่ง สบอ.ภายในกำหนด

ประธาน : ขอให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ มิให้เฉพาะชาวกว๊านฯ ขยะ หรือสิ่งต่างๆ เนื่องจากเป็นนโยบายกรม

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(นางสาวลินจง คงตั้งมั่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม
