



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ กผง ๐๖/ ๔๕๒ / ๖๒๖๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) งบ 2953
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำแนกตามสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรร)
ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

- ททท
- เรียน ผอ.สอ.น., ผอช.ทต.
เพื่อโปรดททท.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)
ผส.บอ ๑ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สชป.1 - 17 และส่วนกลาง
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สขป.1-17 และส่วนกลาง
(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน																
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำซื้อผูกพัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	57,355.15	45,467.05	19,100.07	42.01	7,049	63	852.06	856	6,799.46	6,130	49,703.63	1,102	672	732	620	1,208	1,796
สขป. 1	1,403.92	1,149.03	681.58	59.32	355	-	-	25	263.05	330	1,140.86	14	82	48	28	50	108
สขป. 2	1,586.59	1,253.27	431.50	34.43	321	19	112.79	40	379.64	262	1,094.17	42	28	29	19	84	60
สขป. 3	1,136.72	815.58	345.42	42.35	234	-	-	16	37.03	218	1,099.69	27	18	34	39	33	67
สขป. 4	1,267.08	925.78	349.24	37.72	281	17	64.15	5	93.22	259	1,109.71	39	33	32	35	60	60
สขป. 5	2,040.97	1,557.79	839.10	53.86	384	-	-	36	253.05	348	1,787.92	39	41	44	40	52	132
สขป. 6	2,502.98	1,870.52	789.60	42.21	393	-	-	15	153.33	378	2,349.65	68	37	29	36	80	128
สขป. 7	2,931.04	2,177.95	1,202.97	55.23	363	-	-	79	641.46	284	2,289.59	40	29	45	15	17	138
สขป. 8	3,005.17	1,869.11	519.05	27.77	472	1	0.26	72	725.10	399	2,279.80	66	36	33	42	85	137
สขป. 9	2,729.91	2,164.82	630.63	29.13	441	1	55.00	18	305.07	422	2,369.84	54	26	46	31	107	158
สขป. 10	1,945.96	1,420.74	516.93	36.38	385	1	100.00	19	153.95	365	1,692.01	66	24	41	18	128	88
สขป. 11	1,692.78	1,418.80	335.21	23.63	377	-	-	43	103.93	334	1,588.85	45	37	37	38	119	58
สขป. 12	1,984.09	1,406.41	561.71	39.94	409	-	-	40	332.56	369	1,651.53	65	36	42	24	83	119
สขป. 13	1,345.56	1,125.01	441.68	39.26	467	4	105.89	39	132.58	424	1,107.09	62	41	64	80	130	47
สขป. 14	2,237.03	1,589.47	469.12	29.51	238	-	-	25	419.26	213	1,817.77	50	18	22	20	17	86
สขป. 15	1,532.68	967.02	254.81	26.35	325	-	-	24	100.02	301	1,432.66	75	30	40	29	50	77
สขป. 16	1,923.71	1,612.72	642.16	39.82	320	-	-	9	149.03	311	1,774.68	21	25	37	17	55	156
สขป. 17	1,153.08	800.90	230.54	28.79	213	8	120.37	30	293.02	175	739.69	35	27	24	20	14	55
สบก.	506.79	297.38	52.17	17.54	24	2	9.00	3	22.00	19	475.79	1	1	4	8	-	5
สบอ.	251.71	165.91	66.78	40.25	135	1	1.44	90	137.40	44	112.87	15	2	9	8	9	1
กพก.	9,005.37	8,280.39	4,161.00	50.25	161	1	100.08	2	54.00	158	8,851.29	60	40	34	13	9	2
สพญ.	10,521.37	8,969.95	2,664.17	29.70	179	8	183.08	32	1,847.35	139	8,490.93	53	34	16	19	10	7
สสธ.	467.94	358.75	230.32	64.20	44	-	-	5	61.11	39	406.84	1	-	4	26	-	8
สอส.	103.47	104.29	17.17	16.46	6	-	-	-	-	6	103.47	-	1	5	-	-	-
สมต.	3,101.77	2,380.23	2,236.20	93.95	44	-	-	-	-	44	3,101.77	15	7	5	4	8	5
สดก.	828.46	785.24	431.02	54.89	475	-	-	189	142.30	286	686.16	146	19	8	11	8	94
อื่นๆ	149.00	-	-	-	3	-	-	-	-	3	149.00	3	-	-	-	-	-



2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลผลิต

(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน																
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการ ทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำข้อผูกพัน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	57,355.15	45,467.05	19,100.07	42.01	7,049	63	852	856	6,799.46	6,130	49,703.63	1,102	672	732	620	1,208	1,796
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,509.44	1,380.00	675.89	48.98	1,224	1	1	241	233.34	982	1,274.66	198	144	249	131	89	171
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,288.02	1,186.88	604.31	50.92	475	1	5	18	85.48	456	1,197.54	27	89	33	48	61	198
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	6,108.18	2,477.06	346.85	14.00	555	37	238	206	2,506.01	312	3,363.71	220	15	24	-	25	28
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,524.05	6,280.29	1,967.18	31.32	184	2	155	11	244.34	171	7,124.71	64	42	41	15	8	1
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,138.91	8,527.97	4,552.10	53.38	3,843	11	160	309	901.43	3,523	9,077.48	371	216	273	330	974	1,359
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	15,794.76	13,063.75	6,966.13	53.32	414	2	9	24	811.80	388	14,973.96	112	106	81	55	23	11
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,242.67	5,233.38	1,740.91	33.27	168	-	-	14	299.93	154	5,942.75	70	34	20	18	8	4
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	264.64	217.18	25.42	11.70	54	-	-	4	46.90	50	217.74	8	2	2	8	14	16
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำดาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	174.93	170.80	111.21	65.11	6	1	3	-	-	5	171.93	-	1	1	3	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	120.00	120.00	11.97	9.98	2	-	-	-	-	2	120.00	2	-	-	-	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	200.08	100.00	28.29	28.29	2	1	100	-	-	1	100.00	1	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,632.87	1,440.72	599.67	41.62	15	-	-	1	15.00	14	1,617.87	1	10	-	2	-	1
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	351.15	351.15	110.13	31.36	3	1	101	-	-	2	250.00	2	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	233.98	233.98	0.97	0.42	2	-	-	1	230.00	1	3.98	-	1	-	-	-	-
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต์	820.55	855.93	385.32	45.02	19	-	-	10	21.33	9	799.21	3	2	-	2	-	2
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	413.30	416.39	36.61	8.79	9	-	-	1	2.79	8	410.51	1	5	1	1	-	-
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	413.13	519.94	137.35	26.42	15	-	-	-	-	15	413.13	3	3	5	-	2	2
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	188.70	139.94	39.24	28.04	7	1	40	3	43.99	3	104.72	3	-	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,045.36	95.36	80.35	84.26	13	5	39	4	657.66	4	348.77	2	1	-	-	-	1
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,503.02	1,465.96	219.21	14.95	13	-	-	5	141.48	8	1,361.53	4	-	1	3	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	701.91	526.05	385.71	73.32	16	-	-	-	-	16	701.91	7	1	1	4	2	1
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	650.51	636.68	73.22	11.50	8	-	-	3	549.00	5	101.51	2	-	-	-	2	1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	35.00	27.64	2.02	7.30	2	-	-	1	9.00	1	26.00	1	-	-	-	-	-

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

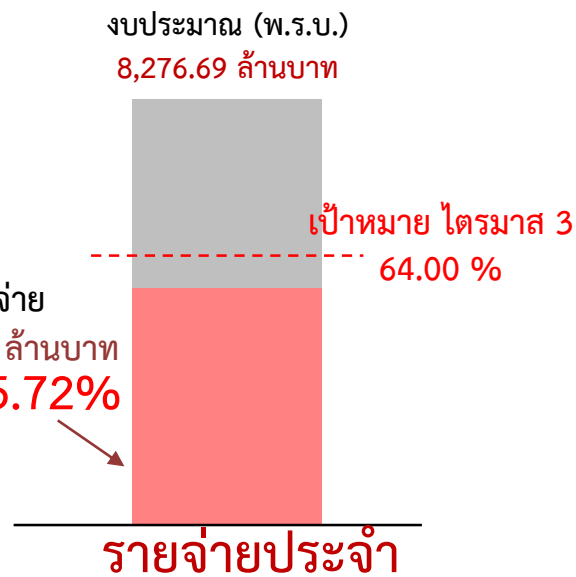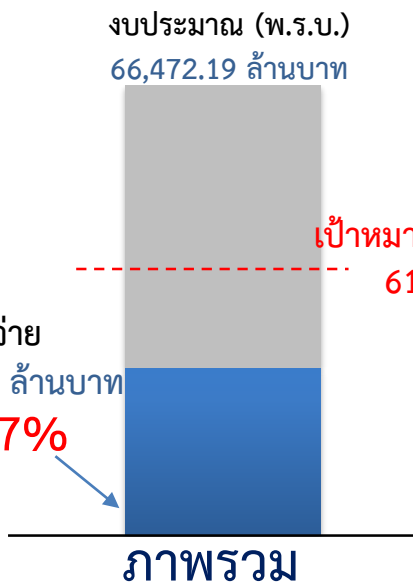

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 6,927 รายการ งบประมาณ 48,063.20 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 6,019 รายการ (86.89%) งบประมาณ 41,067.47 ล้านบาท (85.44%)


รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 100 รายการ (99.01%) งบประมาณ 7,824.24 ล้านบาท (97.14%) และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (0.99%) งบประมาณ 230.00 ล้านบาท (2.86%) ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ (76.19%) งบประมาณ 842.92 ล้านบาท (40.56%) ได้แก่ 1. จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี 2. ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจวบ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 3. คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยาง และอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทองโขบ อำเภอกอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 4. ระบบระบายน้ำฝิ่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมา) โครงการเขื่อนห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 5. คลองระบายน้ำคลองหนั่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 6. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด 7. คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 8. ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 9. อาคารจอตลอด กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10. ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ 11. ประตูปรับน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูปรับน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภوتاเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13. โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร 14. โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 15. โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16. จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี

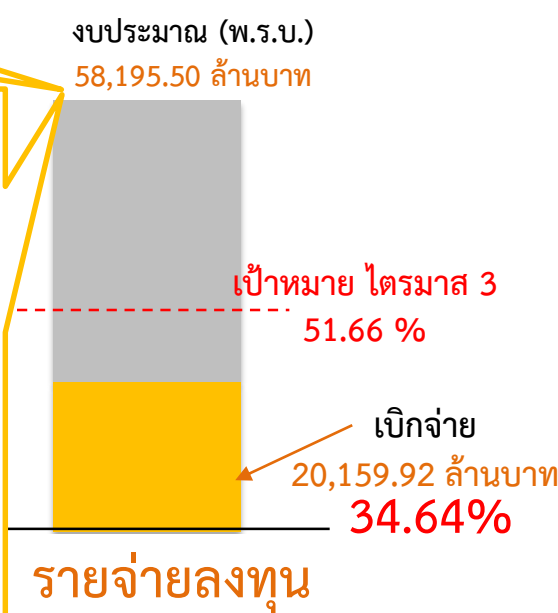


หมายเหตุ : ร้อยละต่องบประมาณ (พ.ร.บ.)

4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562

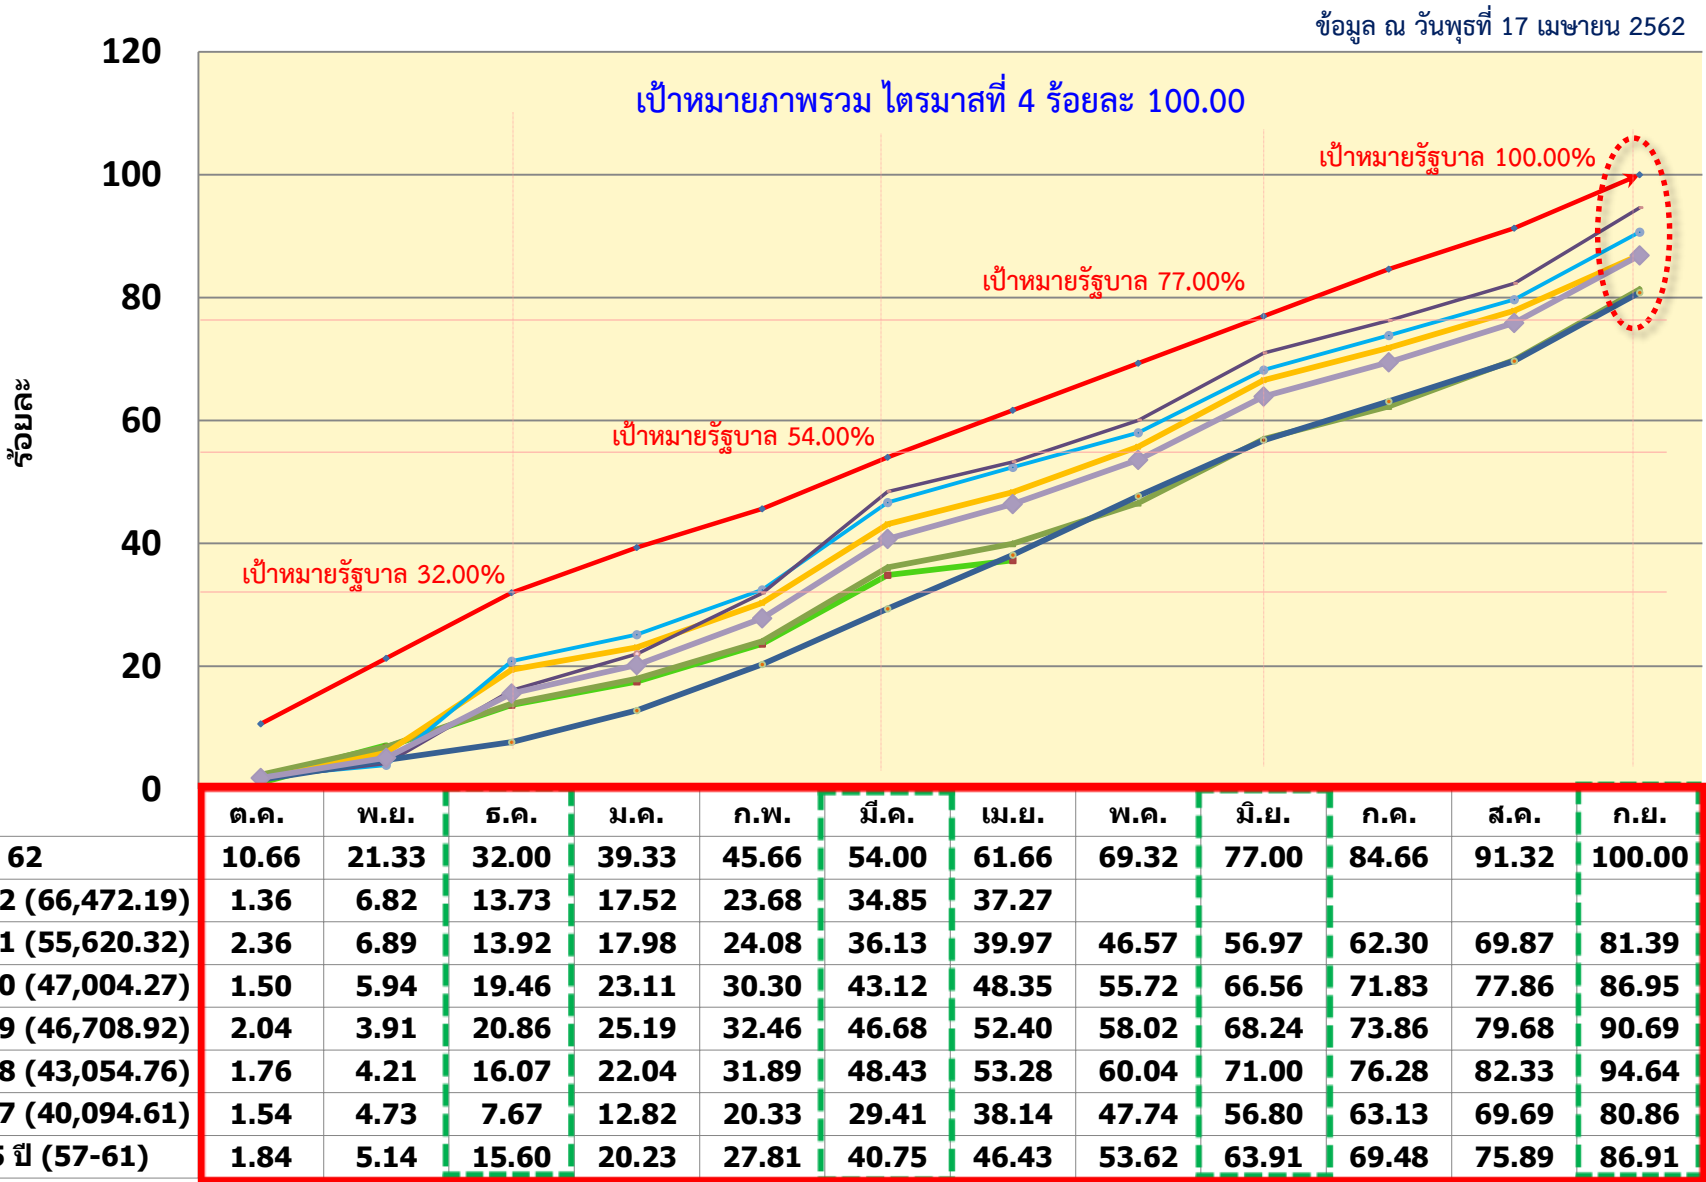


5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

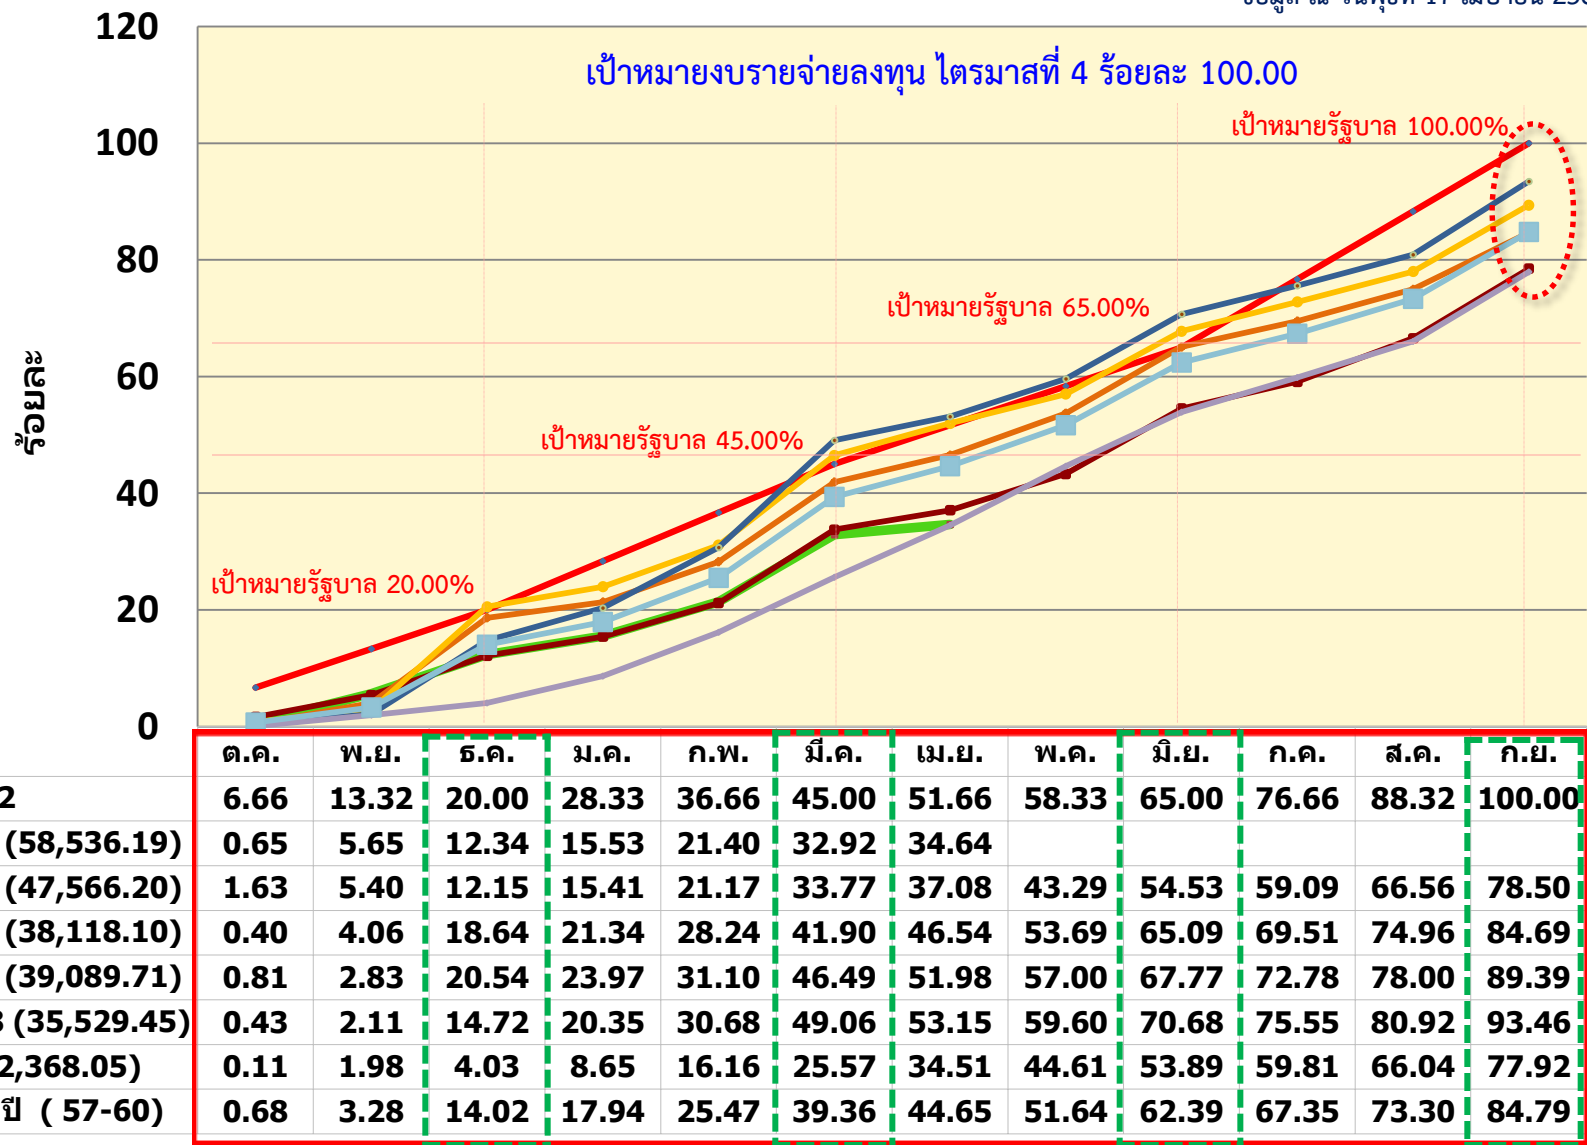

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

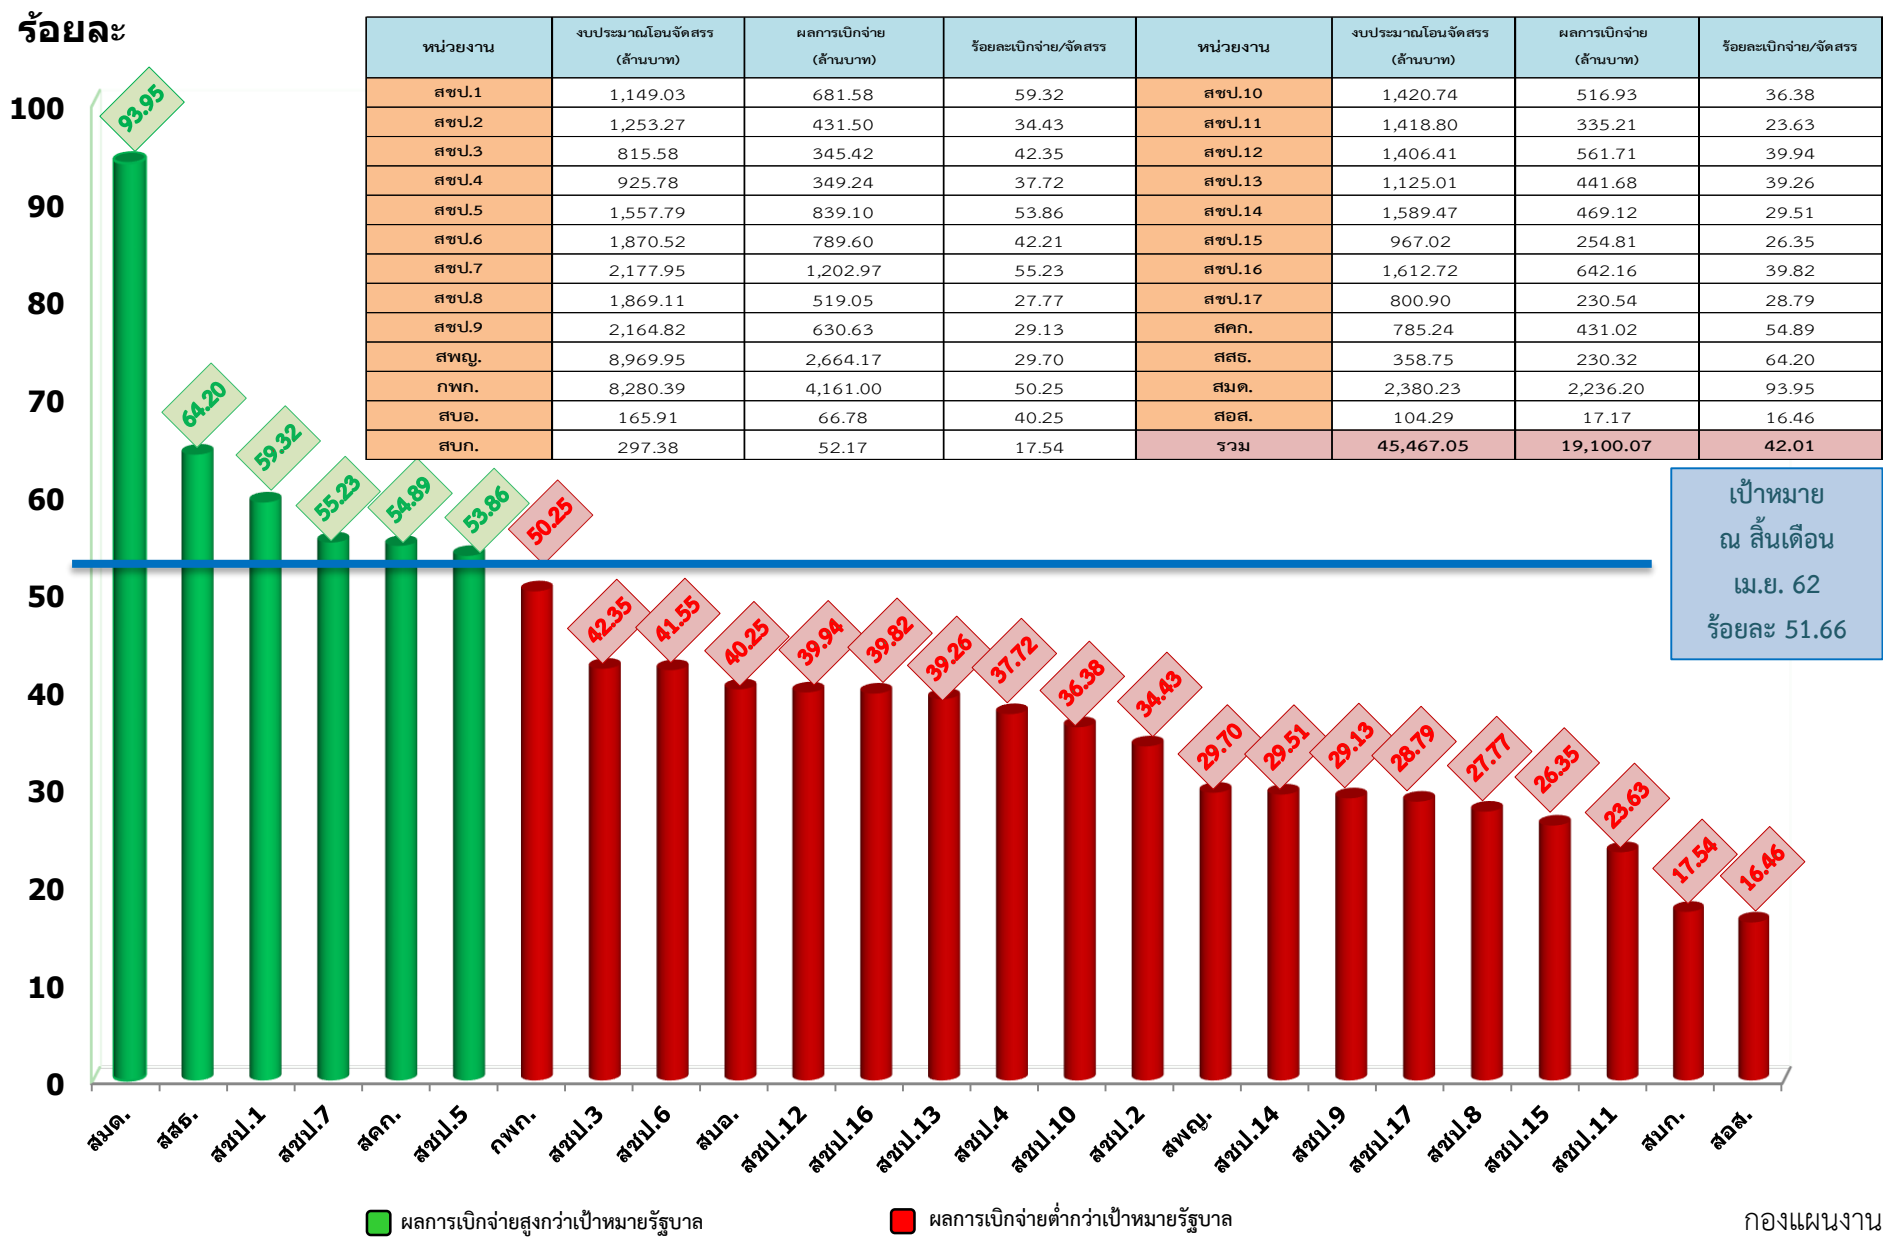


7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)



8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562)

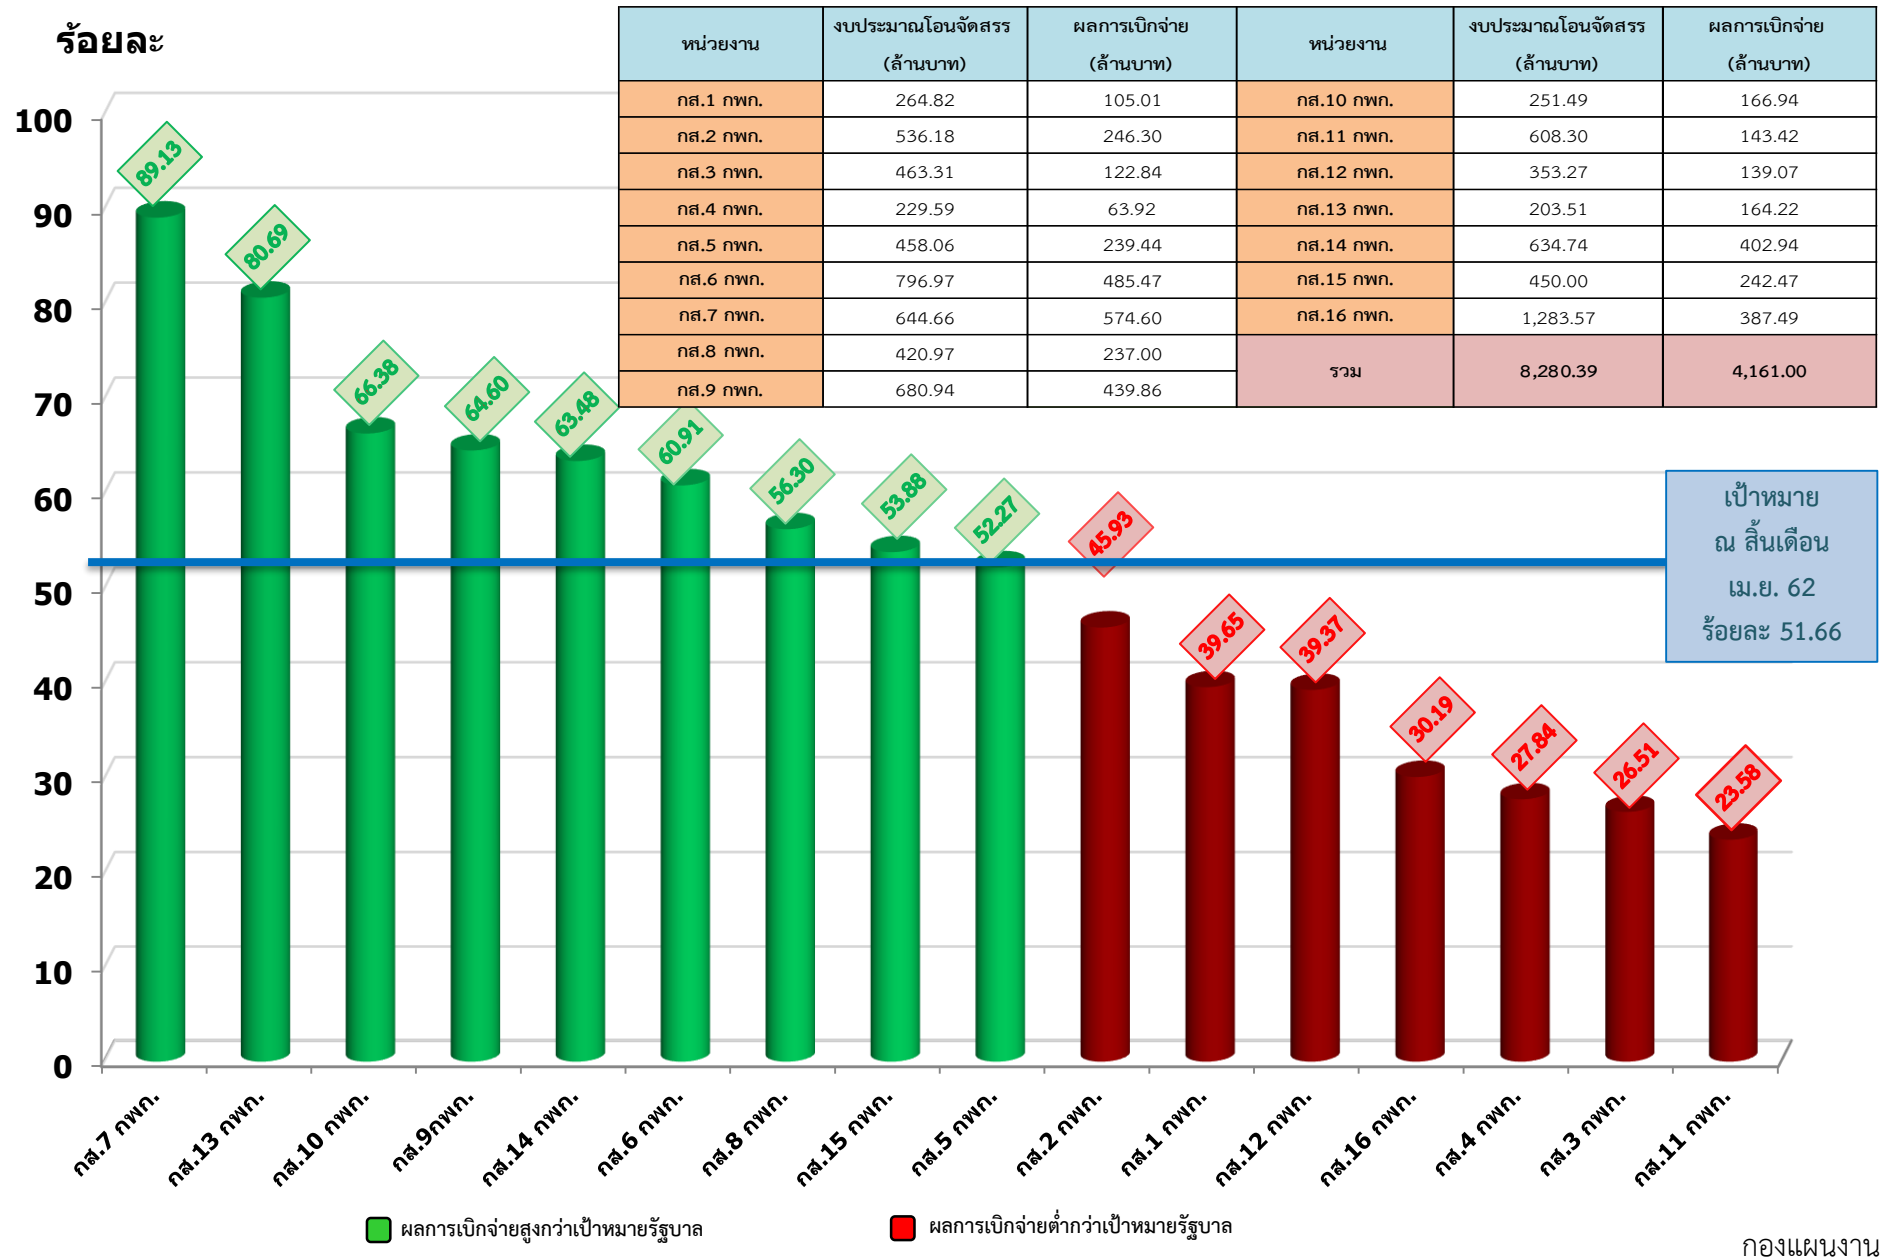

9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงศึกษาธิการ	48,591.65	22,760.99	46.84
2	กระทรวงมหาดไทย	66,647.33	11,921.26	17.89
3	กระทรวงกลาโหม	62,038.96	15,850.62	25.55
4	กระทรวงสาธารณสุข	17,839.84	5,287.05	29.64
5	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,634.07	22,459.29	34.22
6	สำนักนายกรัฐมนตรี	10,975.47	3,858.47	35.16
7	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,890.26	2,189.22	18.41
8	กระทรวงคมนาคม	167,031.75	61,193.10	36.64
<u>ระดับกรม</u> (คู่เทียบ)				
1	กรมทางหลวงชนบท	45,070.70	19,854.98	44.05
2	กรมทางหลวง	111,327.63	39,340.43	35.34
3	กรมชลประทาน	58,195.50	19,657.48	33.78
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,489.16	6,332.31	25.86

- หมายเหตุ :
- ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 32.72%
 - ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 31.16%
