



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) สำนักงานชลประทานที่ ๑ โทร.๑๓๘

ที่ สขป ๑.๐๑/ ๑๙๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน รอง ผส.ขป.๑ ผศร. ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.๑ ผสญ.๑ ผสภ.๑ ผบค.๑ คก. ผจจ.๑ ทน.๑ บอ.
ผอช.ภาคเหนือตอนบน จด.๑/๑ มด. สร.รว.๑ และ ผด.๑ สธ.

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้มีการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานชลประทานที่ ๑ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้บรรจุขึ้น
เว็บไซต์ สขป.๑ (www.rid-1.com) เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม กรุณา
แจ้งได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายปฐม สุริยกานต์)
ผบท.ขป.๑

ร่าง
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สชป.๑

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุตชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ชป.๑	ประธาน
๒.	นายวุฒิชัย	รักษาสุข	ผคป.ลำพูน รก. รอง ผส.ชป.๑	
๓.	นายธนิต	จำภา	บน.ชป.๑ แทน ผจบ.ชป.๑	
๔.	นายนิติ	วรมงคล	ผผง.ชป.๑	
๕.	นายณัฐวุฒิ	นาทสุก	ผวศ.ชป.๑ รก. ผคส.๑	
๖.	นายวิชัย	ชัยเจริญชาติ	ผคก.ชป.๑	
๗.	นายปฐม	สุรียกานต์	ผบท.ชป.๑	
๘.	นายจรินทร์	คงศรีเจริญ	ผคป.เชียงใหม่	
๙.	นายกตัญญู	ใจชื่น	ผคป.แม่ฮ่องสอน	
๑๐.	นายวศิน	ลีลาชีนาเวช	ผคบ.แม่แตง	
๑๑.	นายอัยยา	อรรณพเพชร	ผคบ.แม่กวางฯ	
๑๒.	นายเฉลิมเกียรติ	อินทนก	ผคบ.แม่แฝก-แม่จันทฯ	
๑๓.	นายสิทธิโชค	พิรุณรัตน์	วศ.กส.๑ แทน ผคส.๑	
๑๔.	นายไพรัตน์	ทับประเสริฐ	ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ	
๑๕.	นายไพบูลย์	เรืองสงคราม	กส.๓/๑ พญ. แทน ผสญ.๑	
๑๖.	นายภาณุวัฒน์	ยัมศิริวัฒน์	วศ.พก.๑ แทน ผสก.๑	
๑๗.	นายวิราพงษ์	อัปการัตน์	วศ.จจ.๑ แทน ผจจ.๑	
๑๘.	นายสมคิด	สะเภาคำ	ผอช.ภาคเหนือตอนบน	
๑๙.	นายประเสริฐ	แสนหลี่	สร.รว.๑	
๒๐.	นายสมชาติ	มากเพ็ง	ผด.๑ สธ.	
๒๑.	นายอุบลศักดิ์	ชัยฮัง	วศ.๑ กก. แทน ผบค.๑ กก.	
๒๒.	นางสาวธาริณี	แก้วศรีงาม	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ แทน จด.๑/๑ มด.	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายวรเดช	ชินพงศ์ฐิติวัธส์	ทน.๑ บอ.	ติตราชการ
----	----------	------------------	----------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายเกษียณ	สฤชติกุล	วศ.คป.แม่ฮ่องสอน	
๒.	นายธีรพันธุ์	เต็ดขาด	วศ.คบ.แม่กวางอุดมธารา	
๓.	นายสุภรณ์วัฒน์	สุรการ	จน.คป.ลำพูน	
๔.	นายเชษฐพงศ์	นันทิพรรภา	จน.คบ.แม่แตง	
๕.	นายณัฐพล	อภินันท์โน	จน.คบ.แม่แฝก-แม่จันทฯ	
๖.	นายคณยศ	กาวิละ	วช.ห้วยฮ่องไคร้	
๗.	นายปรีชา	แย้มเยื้อน	วป.อช.ภาคเหนือตอนบน	
๘.	นายจักรกฤษณ์	ชมภูบาง	ผง.ชป.๑	
๙.	นายราชรัฐ	สัตถาผล	ยศ.ชป.๑	๑๐.นายก่องพงศ์...

๑๐. นายก่อพงศ์	เจษฎาพันธ์	ตป.ชป.๑
๑๑. นายจิรัชย์	พัฒน์พงศา	พค.ชป.๑
๑๒. นายชยกร	นันทานอก	สพ.ชป.๑
๑๓. นายปรานต์	จรมาศ	ปน.ชป.๑
๑๔. นายสัณห์พนธ์	นันทิทรภ	ปป.ชป.๑
๑๕. นายณอมศักดิ์	แก้วดุลพันธ์	วค.ชป.๑
๑๖. นางสาวลินจง	คงตั้งมั่น	ธก.ชป.๑
๑๗. นายณัฐพล	สิทธิการ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๑๘. นายสกลฤทธิ์	ดวงราศรี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๙. นายพิพัฒน์	ปฏิพัทธ์ปถวิ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๐. นายภูวสิษฐ์	สุดแดน	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒๑. นายอุดม	ม้าเมือง	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นการประชุมครั้งที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ซึ่งเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดทุกระดับขึ้นเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมได้มีมาตรการ D-M-H-T เพื่อให้บุคลากรได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย และถึงแม้รัฐบาลจะได้สั่งซื้อวัคซีนแล้ว แต่ไม่ควรประมาทให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด จึงขอให้ ผอ.ส่วน / ผอ.โครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใกล้ชิดนำไปปฏิบัติ และพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) โดยมอบ ผบท.ชป.๑ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ และทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป



ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เนื่องจากกรม...

๑.๒ เนื่องจากกรมมีนโยบายการดำเนินการโครงการพระราชดำริที่ชัดเจน จึงขอให้ ผอ.โครงการที่ มีงานพระราชดำริ รายงานในที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓ ตามที่ได้มอบหมายการปฏิบัติงานให้ ผอ.ส่วน/ผศ./ผอ.โครงการ ขอให้รายงานผลการ ดำเนินงานในที่ประชุม

๑.๔ การขออนุญาตเดินทางไปราชการของ ผอ.ส่วน/ผศ./ผอ.โครงการ ขอให้แนบคำสั่งการหรือ จัดทำบันทึกเสนอ ผส.ชป.๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายปฐม สุริยกานต์ ผบต.ชป.๑ : ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนร่างรายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอแก้ไข คือ ผว ศ.ชป.๑ และ ผคบ.แม่แฝก-แม่จิดา ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีผู้ใดแก้ไขเพิ่มเติม ขออนุญาตที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ สภาพภูมิอากาศ

นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน รายงานสภาพภูมิอากาศโดยสรุป ดังนี้

พยากรณ์อากาศประจำวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ บริเวณดังกล่าว มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำ ความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค ตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียง ใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๖-๔๐ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ ๘ - ๙ เม.ย. ๖๔ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้และลม ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกเฉียง ใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ ๘ - ๙ เม.ย. ๖๔ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๔ เม.ย. ๖๔ อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียง ใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย ๓ เดือน

เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ออกประกาศ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุดในรอบปี โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่งมักมีอุณหภูมิและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสี ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น สำหรับฝนในเดือนนี้โดยทั่วไปมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาในทุกภาคของประเทศ

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ปกติสภาวะอากาศในระยะครึ่งแรกของเดือนจะยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้ง และในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกได้ด้วย จากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ส่วนระยะครึ่งหลังของเดือน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง และมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนร่องความกด อากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศมาเลเซียได้เลื่อนขึ้นมาพัดผ่านภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทยตามลำดับ นอกจากนี้ อาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย

เดือนมิถุนายน ปกติแล้วจะมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย กับร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย จากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง นอกจากนี้ อาจมีพายุหมุนเขตร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือสู่ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของประเทศ

การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ลานีญามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกไปจนถึงด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรที่มีค่าต่ำกว่าปกติได้ขยายพื้นที่ไปจนถึงตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร จากรายงานสถานการณ์ล่าสุดพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยในบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอุ่นขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีค่าโดยมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๐.๒ องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนกลางด้านตะวันออกมีค่าต่ำกว่าปกติประมาณ ๐.๘-๐.๗ องศาเซลเซียส อีกทั้งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ ๓๐๐ เมตร บริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงมีค่าต่ำกว่าค่าปกติตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม จากนั้นได้อุ่นขึ้นเล็กน้อยบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในขณะที่บริเวณอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงกว่าค่าปกติในระดับลึกบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรยังคงอุ่นต่อเนื่องและได้ขยายพื้นที่มาด้านตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้น ส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ ๘๕๐ เฮกโตปาสกาล(ความสูงประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ทำให้มีลมตะวันออกที่พัดปกติพัดปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร สำหรับลมที่ระดับ ๒๐๐ เฮกโตปาสกาล(ความสูงประมาณ ๑๑ กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) มีลมตะวันตกที่พัดปกติพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกมหาสมุทร

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่าปรากฏการณ์ ENSO ที่มีสถานะเป็นลานีญาจะต่อเนื่องต่อไปจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ ๖๐


ผลกระทบ...

ผลกระทบกับประเทศไทย ปรากฏการณ์ลานีญาจะส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศไทย โดยคาดว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ปริมาณฝนของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา อย่างใกล้ชิด


รายงานสภาพน้ำฝน

กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานี สขป.๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

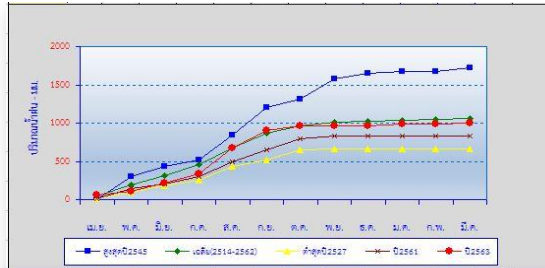


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
ฤดูร้อน 2545	4.7	301.0	126.8	87.8	324.7	363.9	103.9	268.8	67.5	20.9	0.0	51.7	1,721.7
ฝนสะสม 2545	4.7	305.7	432.5	520.3	845.0	1,208.9	1,312.8	1,581.6	1,649.1	1,670.0	1,670.0	1,721.7	
เฉลี่ย	44.0	150.8	122.9	144.1	207.4	192.8	107.3	44.2	13.0	11.2	7.3	17.4	1,062.4
เฉลี่ยฝน	44.0	194.8	317.7	461.8	669.2	862.0	969.3	1,013.5	1,026.5	1,037.7	1,045.0	1,062.4	
ค่าฤดู 2527	15.1	76.6	91.6	71.6	172.9	85.3	142.5	1.3	0.0	10.9	0.0	0.0	667.8
ฝนสะสม 2527	15.1	91.7	183.3	254.9	427.8	513.1	655.6	656.9	656.9	667.8	667.8	667.8	
ปี 2562	12.8	128.4	62.8	93.4	200.7	151.5	140.5	38.9	4.9	0.0	0.0	1.8	835.7
ฝนสะสม 2562	12.8	141.2	204.0	297.4	498.1	649.6	790.1	829.0	833.9	833.9	833.9	835.7	
ปี 2563	65.3	44.6	104.9	123.5	338.4	220.9	63.6	2.4	0.0	21.7	6.7	7.5	999.5
ฝนสะสม 2563	65.3	109.9	214.8	338.3	676.7	897.6	961.2	963.6	963.6	985.3	992.0	999.5	

กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานีอุตลุ่ม อ.เมือง จ.ลำพูน

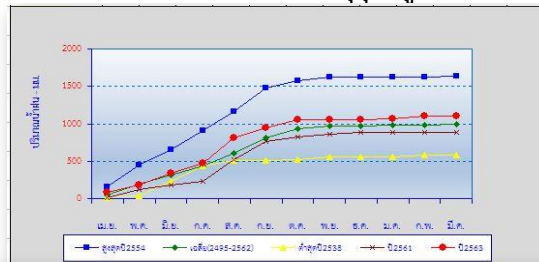


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
ฤดูร้อน 2554	156.7	296.7	201.8	253.4	249.3	318.4	104.1	44.6	0.0	1.8	0.0	8.4	1,635.2
ฝนสะสม 2554	156.7	453.4	655.2	908.6	1,157.9	1,476.3	1,580.4	1,625.0	1,626.8	1,626.8	1,635.2	1,635.2	
เฉลี่ย	45.4	148.1	119.4	122.6	176.6	199.8	115.6	36.3	9.7	7.8	3.4	10.5	995.2
เฉลี่ยฝน	45.4	193.5	312.9	435.5	612.1	811.9	927.5	963.8	973.5	981.3	984.7	995.2	
ค่าฤดู 2538	12.0	30.0	184.8	203.6	76.5	6.8	1.8	39.8	0.0	0.0	22.8	0.0	578.1
ฝนสะสม 2538	12.0	42.0	226.8	430.4	506.9	513.7	515.5	555.3	555.3	555.3	578.1	578.1	
ปี 2562	13.5	110.6	57.3	53.0	292.6	233.3	62.3	61.8	19.9	0.0	0.0	2.0	886.3
ฝนสะสม 2562	13.5	124.1	181.4	234.4	527.0	760.3	822.6	884.4	884.3	884.3	884.3	886.3	
ปี 2563	85.8	98.8	159.0	131.3	338.3	135.1	100.2	11.4	0.0	2.2	41.4	0.0	1,103.5
ฝนสะสม 2563	85.8	184.6	343.6	474.9	813.2	948.3	1,048.5	1,059.9	1,059.9	1,062.1	1,103.5	1,103.5	


กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

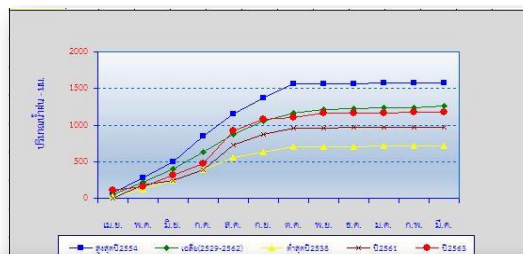


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
ฤดูร้อน 2554	58.1	113.9	146.5	288.7	741.0	808.4	455.8	184.1	94.6	67.4	45.6	39.5	3,040.7
ฝนสะสม 2554	58.1	172.1	318.6	607.2	1,348.3	2,153.7	2,609.4	2,793.5	2,888.1	2,955.6	3,001.2	3,040.7	
เฉลี่ย	30.7	49.7	79.1	148.9	330.9	388.8	239.7	138.6	78.5	56.5	37.4	32.8	1,611.6
เฉลี่ยฝน	30.7	80.4	159.5	308.4	639.3	1,028.1	1,267.8	1,406.4	1,484.9	1,541.4	1,578.8	1,611.6	
ค่าฤดู 2541	18.6	21.4	24.6	51.7	141.2	215.0	67.9	44.3	21.1	20.6	17.3	16.8	662.5
ฝนสะสม 2541	18.6	40.0	64.6	116.3	257.5	472.5	540.4	586.7	607.8	628.4	645.7	662.5	
ปี 2562	14.6	21.3	30.5	44.5	316.8	267.7	146.1	83.5	49.0	37.6	27.8	24.0	1,065.4
ฝนสะสม 2562	14.6	37.9	68.4	112.9	429.7	697.4	843.5	927.0	976.0	1,013.6	1,041.4	1,065.4	
ปี 2563	32.2	38.8	51.6	120.0	482.5	255.2	148.8	93.9	61.4	50.4	43.0	35.3	
ฝนสะสม 2563	32.2	71.0	122.5	242.5	725.0	980.3	1,129.1	1,222.9	1,284.3	1,334.7	1,377.7	1,413.0	

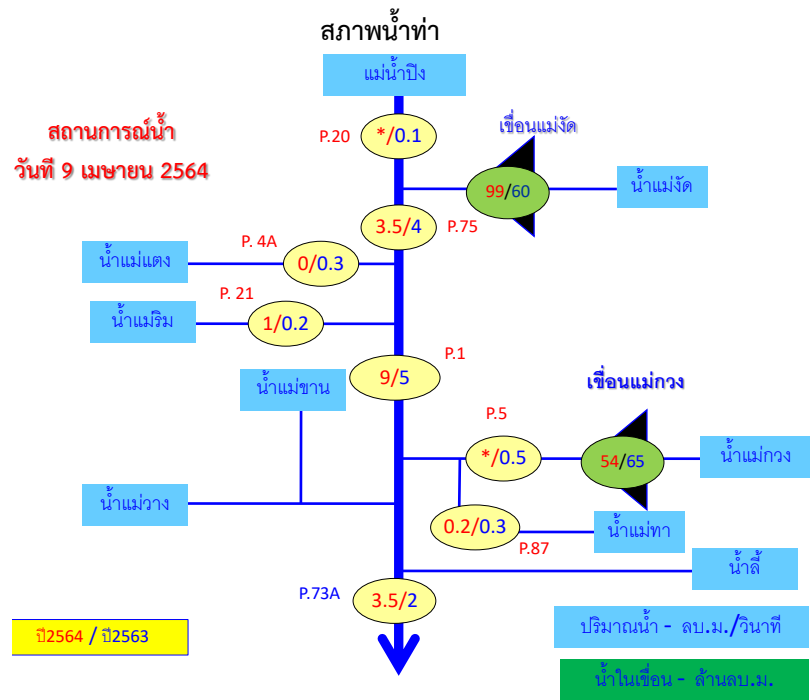

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนารัฐ จ.เชียงใหม่

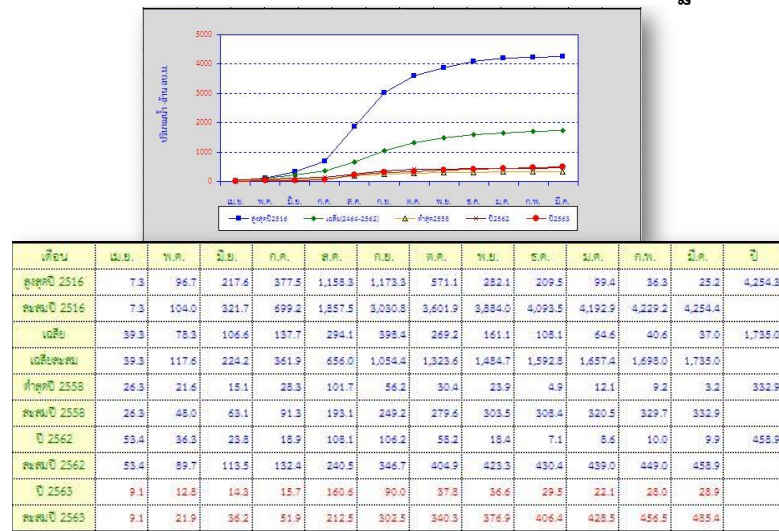


กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.5 น้ำกวาง สะพานท่านาง จ.ลำพูน

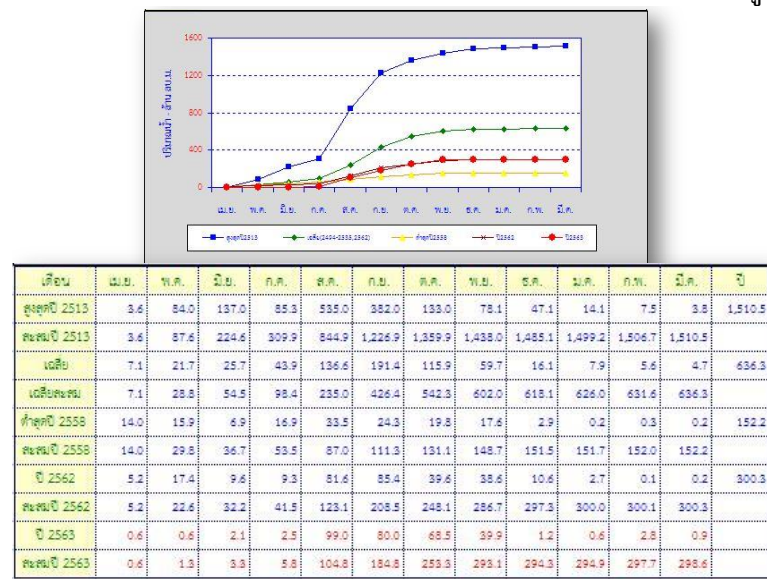

กราฟแสดงปริมาณน้ำท่า...

กราฟแสดงปริมาณน้ำทำรายเดือนสถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน

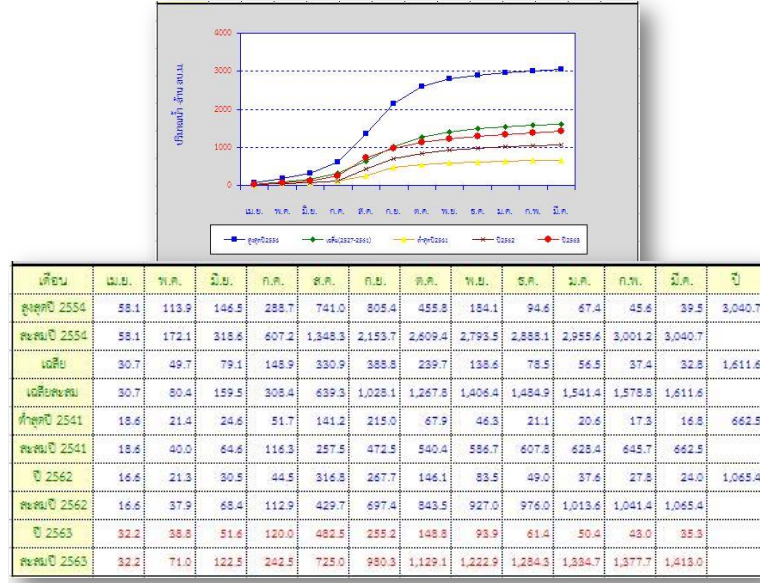

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

นายธนิต จ่าภา บบ.ขป.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ โดยสรุป ดังนี้

๑. สถานการณ์น้ำ น้ำฝน/น้ำท่า/น้ำในอ่าง

ที่เขื่อนแม่งัดฯ ฝนไม่ตกตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 – 28 ม.ค. 64
รวม 89 วัน

เขื่อนแม่งัดฯ ฝนตก วันที่ 29-30 ม.ค. 64
จำนวน 1.2 และ 17.7 มม. ตามลำดับ (ฝนตกรอบที่ 1)

เขื่อนแม่งัดฯ ฝนตก วันที่ 7-8 ก.พ. 64
จำนวน 5.1 และ 40 มม. ตามลำดับ (ฝนตกรอบที่ 2)

เขื่อนแม่งัดฯ ฝนตก วันที่ 3-6 เม.ย. 64
รวม 24.2 มม. (ฝนตกรอบที่ 3)

น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัด (29 ม.ค.64 -6 ก.พ.64) เพิ่มขึ้น 0.65 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0 ลบ.ม./วัน)
น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งาว (29 ม.ค.64 -2 ก.พ.64) เพิ่มขึ้น 0.42 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0.03 ล้าน ลบ.ม./วัน)


น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัด (7-9 ก.พ.64) เพิ่มขึ้น 1.05 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0 ลบ.ม./วัน)
น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งาว (8-9 ก.พ.64) เพิ่มขึ้น 0.02 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0.03 ล้าน ลบ.ม./วัน)

น้ำในลำน้ำปิงสัน สันฝาย /ปตร.ทุกแห่ง ยกเว้นฝายตอยน้อย

น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัด (3-7 เม.ย.64) เพิ่มขึ้น 0.73 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0 ลบ.ม./วัน)
น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งาว (3-7 เม.ย. 64) เพิ่มขึ้น 0.63 ล้าน ลบ.ม. (Base Flow 0.03 ล้าน ลบ.ม./วัน)

น้ำในลำน้ำปิงเพิ่มขึ้น บางแห่ง
ฝายวังป่าน เพิ่มขึ้น 0.4 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าสันฝาย 0.46 เมตร
ปตร.แม่สอย เพิ่มขึ้น 0.6 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าสันฝาย 2.53 เมตร


ปริมาณน้ำท่าที่ไหลในแม่น้ำปิงตอนบนมีแนวโน้มลดลง ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้บริหารจัดการน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน

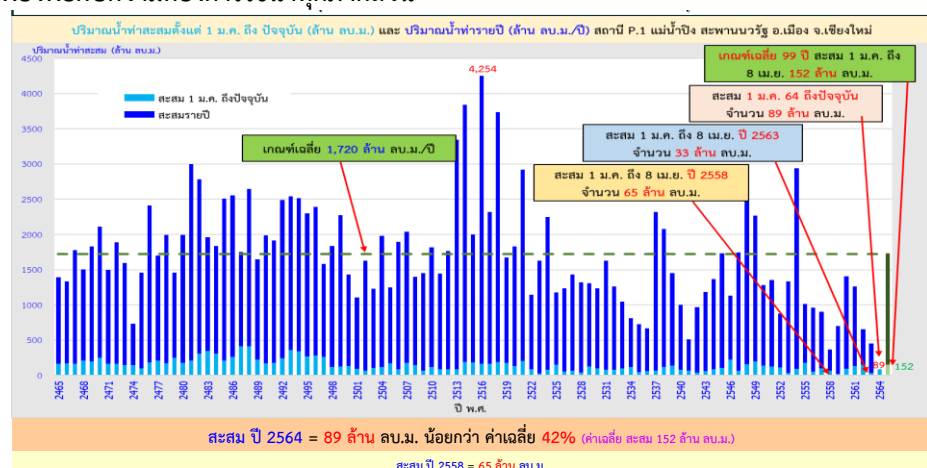


ปริมาณน้ำท่า...

ปริมาณน้ำท่า

ภาพรวม ปริมาณน้ำท่า ในลำน้ำ 7 สาขา มากกว่าปีที่แล้ว

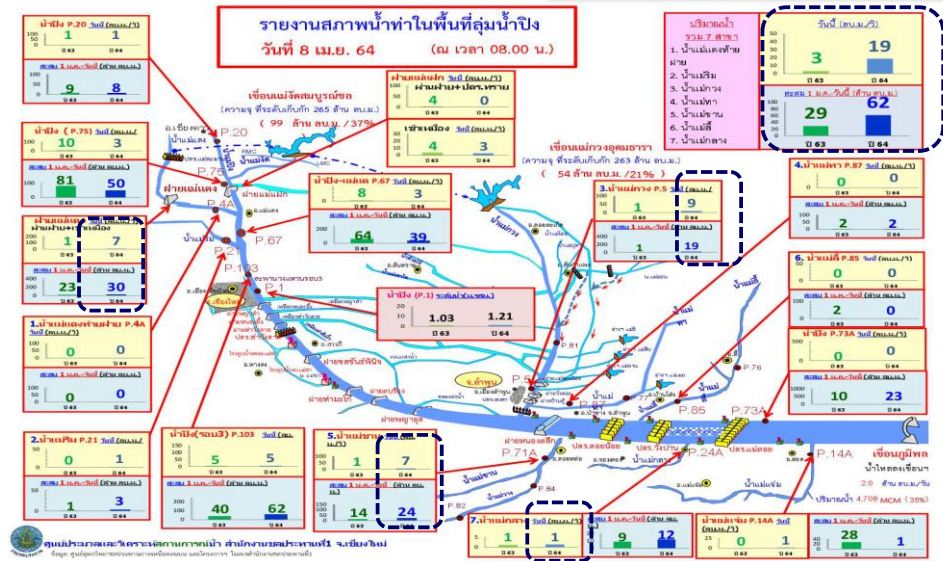


สถานการณ์น้ำไหลเข้า เขื่อนแม่งัด

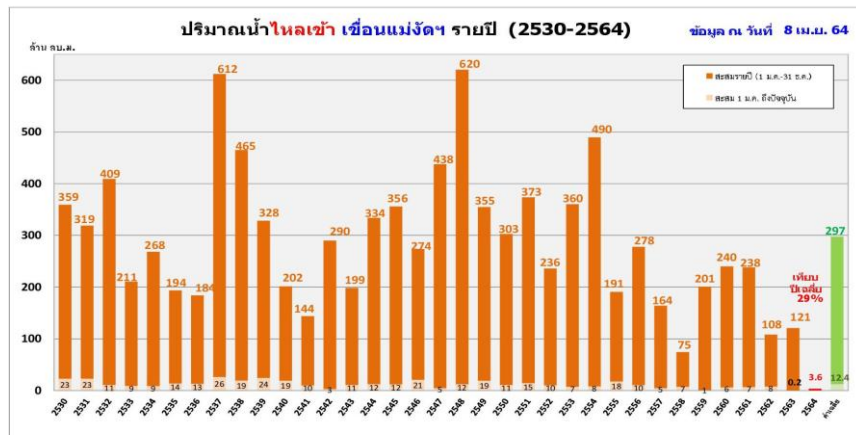

สะสมปี 2564 = 3.6 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 71% (ค่าเฉลี่ยสะสม 12.4 ล้าน ลบ.ม.)

สถานการณ์น้ำไหลเข้า เขื่อนแม่งาว

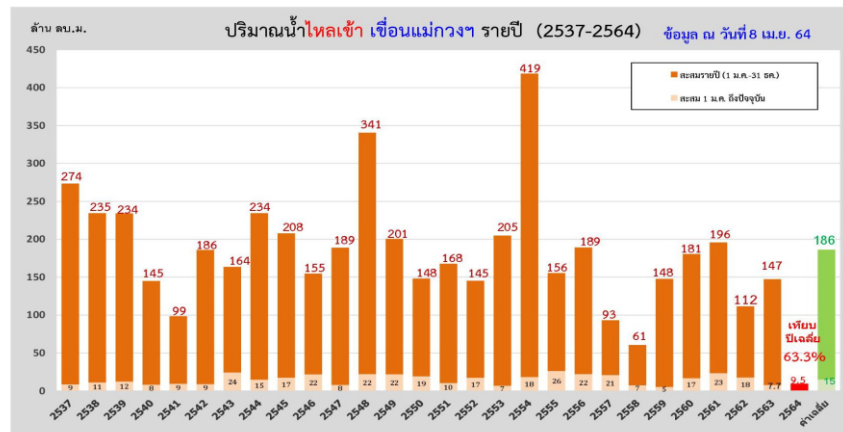

สะสมปี 2564 = 9.5 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 27% (ค่าเฉลี่ยสะสม 15 ล้าน ลบ.ม.)


สถานการณ์น้ำไหลเข้า...




สถานการณ์แหล่งน้ำชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

ขนาดเล็ก ความจุ้เก็บ 1 แสน ม.³ จำนวน 117 แห่ง	ขนาดกลาง จำนวน 13 แห่ง	ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
- น้อยกว่า 30% จำนวน 54 แห่ง - ช่วง 30-50% จำนวน 27 แห่ง - ช่วง 50-80% จำนวน 29 แห่ง - ช่วง 80-100% จำนวน 7 แห่ง - มากกว่า 100% จำนวน 0 แห่ง	- น้อยกว่า 30% จำนวน 4 แห่ง - ช่วง 30-50% จำนวน 6 แห่ง - ช่วง 50-80% จำนวน 2 แห่ง - ช่วง 80-100% จำนวน 1 แห่ง - มากกว่า 100% จำนวน 0 แห่ง	เขื่อนแม่งัดตา ปัจจุบัน 99,034 ล้าน ม.³ (37.37%) ปี 63 59,540 ล้าน ม.³ (22.47%) Lower Rule Curve 100.53 ล้าน ม.³
เขื่อนแม่กวาง ปัจจุบัน 53,749 ล้าน ม.³ (20.44%) ปี 63 65,035 ล้าน ม.³ (24.73%) Lower Rule Curve 70.98 ล้าน ม.³		
ภาพรวม 25.54 ล้าน ลบ.ม. 39%	ภาพรวม 27.39 ล้าน ลบ.ม. 27%	ภาพรวม 152,783 ล้าน ลบ.ม. (30%)
ภาพรวม (ปี 63) 24.14 ล้าน ลบ.ม. 37%	ภาพรวม (ปี 63) 22.65 ล้าน ลบ.ม. 22%	เก็บกักน้ำได้อีก 165.97 ล้าน ลบ.ม.
เก็บกักน้ำได้อีก 40.68 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้อีก 75.50 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้อีก 209.25 ล้าน ลบ.ม.
		ภาพรวม เก็บกักน้ำได้อีก 375.217 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

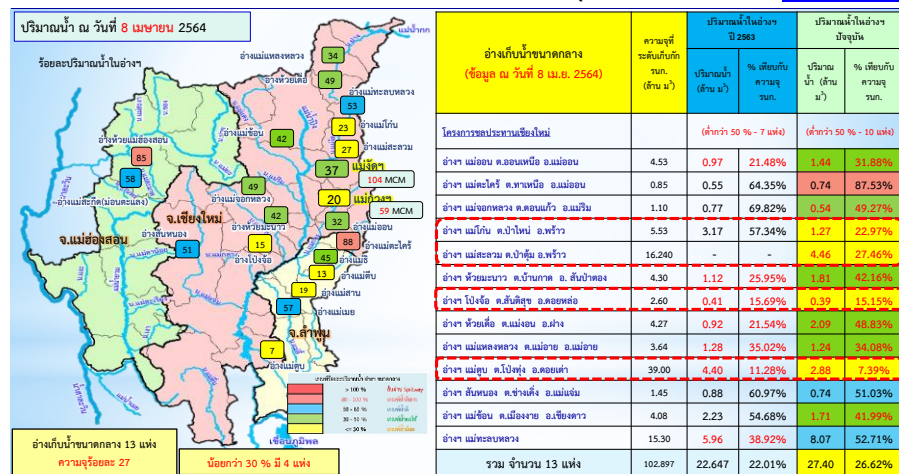

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดลำพูน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

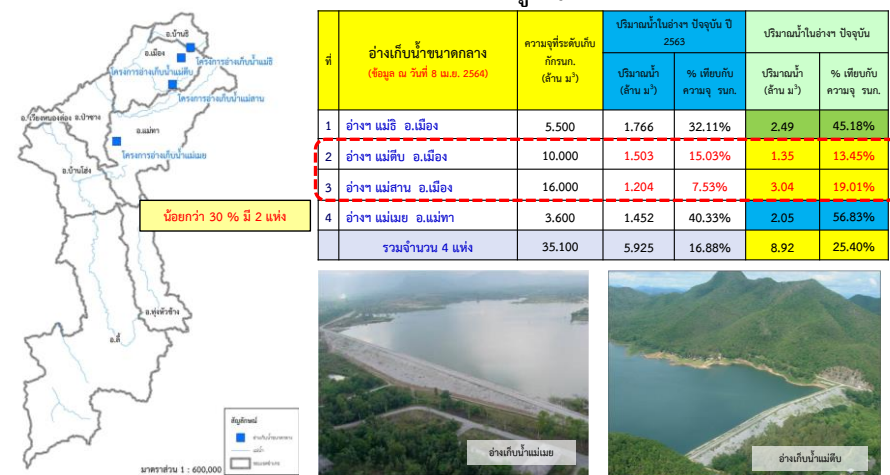

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ...

ปริมาณน้ำ / ผล ปริมาณน้ำสาขาต่อพื้นที่ตอนบน ปี 2563/64

รวม 7 สาขา (แม่แจ่ม แม่ริม แม่กวง แม่ทา แม่ขาน แม่สี และ แม่กลาง)

ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม./สัปดาห์

เปรียบเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง 7 สาขา ตั้งแต่ 3 ม.ค.64 - ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำสะสม ล้าน ลบ.ม.

วันที่	ค่าการณ (ล้าน ลบ.ม.)	ผล (ล้าน ลบ.ม.)
3-9	~2.0	~1.0
10-16	~3.0	~3.0
17-23	~4.0	~4.0
24-30	~5.0	~5.0
31-6	~6.0	~6.0
7-13	~7.0	~7.0
14-20	~8.0	~8.0
21-27	~9.0	~9.0
28-5	~10.0	~10.0
6-12	~11.0	~11.0
13-19	~12.0	~12.0
20-26	~13.0	~13.0
27-2	~14.0	~14.0
3-9	22.1	60.7
10-16	~15.0	~15.0
17-23	~18.0	~18.0
24-30	~21.0	~21.0
1-7	~24.0	~24.0
8-14	~27.0	~27.0
15-21	~30.0	~30.0
22-28	42.0	~33.0

รวม 7 สาขา สะสม 3 ม.ค.64 - 8 เม.ย.64
ผลสะสม 60.7 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่า ค่าการณสะสม 38.6 ล้าน ลบ.ม. (75 %)

แผน/ผลการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอุปโภค-บริโภค ปี ๒๕๖๓/๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)							
		๘"		๑๐"		๑๒"		รวม	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
๑	โครงการ ชป.เชียงใหม่	๑๗	๔	๐	-	๑	-	๑๘	๔
๒	โครงการ ชป.ลำพูน	๑๓	-	๑	-	๑	-	๑๕	-
๓	โครงการ ชป.แม่ฮ่องสอน	๔	-	๐	-	๐	-	๔	-
๔	โครงการส่งน้ำแม่แตง	๑๙	-	๓	-	๒	-	๒๔	-
๕	โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม้งัดดา	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๖	โครงการส่งน้ำแม่กวาง	๑๙	๓	๑	-	๐	-	๒๐	๓
รวม		๗๒	๗	๔	๐	๔	๐	๘๑	๗

ปัจจุบัน สูบน้ำช่วยเหลือ ๑,๙๖๗,๕๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ช่วยเหลือ ๓,๐๔๖ ไร่

การเก็บกักน้ำในแก้มลิงตามแนวคลองส่งน้ำแม่แตง เพื่อสำรองน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔



๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓-๖๔

สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 63- 1 เม.ย. 64

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ				
		ศ.พ.ก.		JMC		ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ (ครั้ง)
		ครั้ง	เกษตรกร (คน)	ครั้ง	เกษตรกร (คน)	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่					29
2	โครงการชลประทานลำพูน					5
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน			1	50	8
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง			1	123	80
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม้งัดสมบูรณ์ชล					77
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา	9	230	1	157	5
	รวมสำนักงานชลประทานที่ 1	9	230	3	330	204

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จำนวน ๖ แห่ง



การกำจัดวัชพืช...

การกำจัดวัชพืชในเขต สขป.๑

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564



คป.เชียงใหม่

กำจัดวัชพืชหน้า ปศ.ท่าวังคาลด้วยแรงงานคน

เป้าหมาย 123 ไร่ 6,150 ต้น

ผลการดำเนินงาน 120 ไร่ 6,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 97



คป.แม่แฝก-แม่จัดสมบูรณ์ชล

กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการส่งน้ำ แม่แฝก

เป้าหมาย 426 ไร่ 21,300 ต้น

ผลการดำเนินงาน 260 ไร่ 13,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 61



คป.แม่กวางอุดมธารา

กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำกวางและอ่างฯห้วยหลวงวังธาร

เป้าหมาย 500 ไร่ 25,000 ต้น

ผลการดำเนินงาน 323 ไร่ 16,150 ต้น คิดเป็นร้อยละ 65


แผนของงบประมาณกำจัดวัชพืชเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๔

ที่	รายการ	วงเงินที่เสนอขอตั้ง (บาท)	ปริมาณงาน (ไร่)	ภาพประกอบ
1	งานกำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงและห้วยงาน (แรงงานคน) ปศ.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	300,000	92.30	 
2	งานกำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงและห้วยงาน (แรงงานคน) ฝ่ายคอยน้อย ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่	300,000	92.30	 
	รวม	600,000	184.60	


๕.๓ การจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำของสำนักงานชลประทานที่ ๑

นายชยกร นนตานอก สฟ.ขป.๑ รายงานการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำของ

สำนักงานชลประทานที่ ๑ โดยสรุป ดังนี้

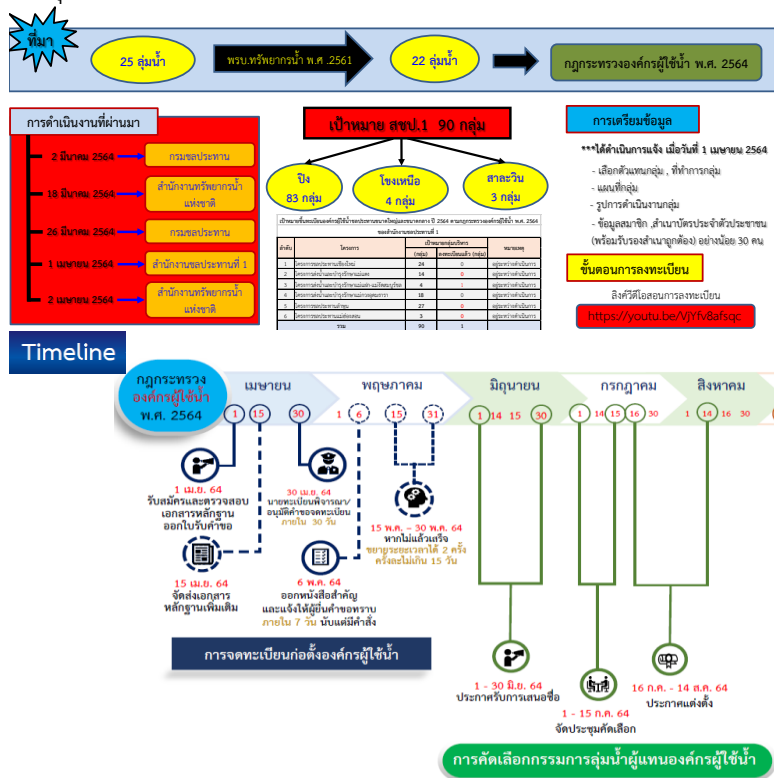

คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทานที่ ๑

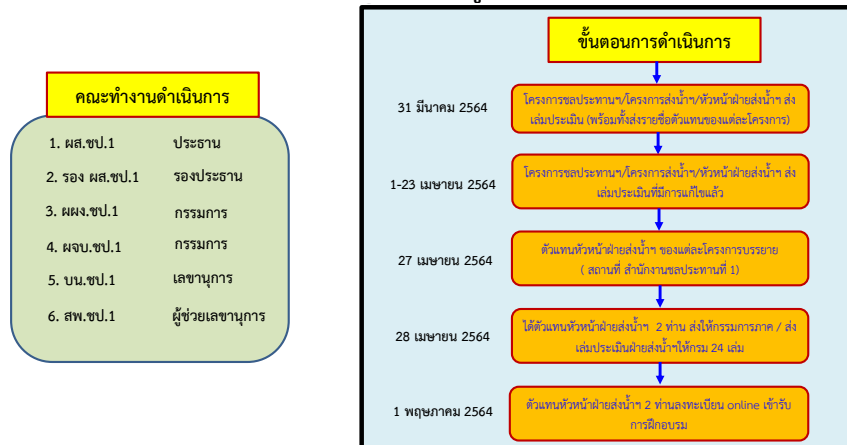

ผคป.แม่ฮ่องสอน : รายการที่กันหลัอมปี ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ผลงาน ๗๐% ผลการเบิกจ่าย ๓๗.๗๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผคป.แม่กวางฯ : รายการที่กันหลัอมปี ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ได้แก่ ๑) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย ๓ (จาวยอง) ความยาว ๑.๐๓๖ กม. พร้อมอาคารประกอบ ๒) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก กม.๐+๐๐๐-๗+๐๐๐ ความยาว ๗ กม. พร้อมอาคารประกอบ

ผคป.แม่แตง : รายการที่กันหลัอมปี ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จหมด ได้แก่ ๑) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย ๒L-๑๙L ๒) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๒๑L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๑) จำนวน ๑ สาย ๓) ถนนคันคลองส่งน้ำ RMC ช่วง กม.๓๒+๓๐๐ – กม.๓๒+๓๐๐ (วัดป่าดาราภิรมย์)

ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ : รายการที่กันหลัอมปี ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๐๘ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๘.๖๔๙ กิโลเมตร ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่รอส่งจากต่างประเทศ คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๔

วศ.กส.๑ : รายการที่กันหลัอมปี จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ ผลงาน ๗๓% ผลการเบิกจ่าย ๖๔.๙๔% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒) จัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน พร้อมระบบส่งน้ำ ผลงาน ๕๔% ผลการเบิกจ่าย ๗๖% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

สพ.ขป.๑ : รายการที่กันหลัอมปี จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ ได้แก่ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมมลพิษอากาศพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเชื่อมเซ็นเซอร์หลักของเซ็นเซอร์แม่กวางอุดมธารา ผลงาน ๙๕% ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๑๙% คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


ที่	โครงการ/แผนงาน	พ.บ. 2564						งบพิเศษ 64				งบกลาง กปร. 2564				รวมทั้งสิ้น	
								งบลงทุน (โอนเบ็ดเตล็ด)		งบปี 62 ที่ถูกเก็บ							
		รายการ	งบประมาณตาม พ.บ. 64	รายการ	รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รายการ	งบโครงการ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
1	คป.เชียงใหม่	66	287,259,000	65	244,391,191	1	2,500,000					2	13,167,600	67	257,558,791		
2	คป.ลำพูน	42	182,052,000	41	141,788,120	1	5,000,000	1	8,000,000					42	149,788,120		
3	คป.แม่ฮ่องสอน	20	65,700,000	19	41,768,571	1	15,000,000							19	41,768,571		
4	คป.แม่ฮ่องสอน-แม่ใจ	50	92,882,200	49	82,669,512	1	7,000,000	2	25,992,800					51	108,662,312		
5	คป.แม่แตง	58	94,234,000	58	91,302,000									58	91,302,000		
6	คป.แม่กวาง	64	216,004,000	64	199,925,518									64	199,925,518		
7	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	10	55,135,000	9	33,135,000	1	22,000,000					4	110,499,595	15	143,634,595		
8	โครงการก่อสร้าง สป.๑	5	174,000,000	5	160,983,501					1	707,956			6	161,691,457		
9	ส่วนเครื่องจักรกล	2	1,730,000	2	1,730,000									2	1,730,000		
10	ส่วนแผนงาน	5	7,750,000	5	7,750,000									5	7,750,000		
11	ส่วนวิศวกรรมบริหาร	1	14,520,000	1	9,705,100									1	9,705,100		
12	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	3	60,500,000	3	48,406,788									3	48,406,788		
13	ค่าดำเนินการ สป.๑				25,927,167										25,927,167		
	รวมทั้งสิ้น	326	1,251,766,200	321	1,089,482,468	5	51,500,000	3	33,992,800	1	707,956	8	123,667,195	333	1,247,850,419		

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๖๔ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


ลำดับ	โครงการ	พ.บ.64 (รวมค่าอำนาจการ)		พ.บ.64 ตามประมาณการ (แยกค่าอำนาจการ/งบงานที่ยกเลิก)		ได้รับจัดสรร (แยกค่าอำนาจการ)			ผลการเบิกจ่าย (แยกค่าอำนาจการ)			ค่าการณ เบิกจ่าย ณ สิ้น เดือน มีนาคม 64 (ร้อยละจัดสรร)	ผลจา
		จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	ร้อยละเพียบ พ.บ.	(บาท)	ร้อยละเพียบ พ.บ.	ร้อยละเพียบ พ.บ.		
	แยกรายโครงการ	326	1,251,766,200	321	1,197,566,200	321	1,089,482,468	90.97	520,224,169	47.75	43.44	48.24	40
1	คป.แม่แฝด-แม่ใจ	50	92,882,200	49	83,028,200	49	82,669,512	99.57	59,708,731	72.23	71.91	65.00	70
2	คป.แม่ฮ่องสอน	20	65,700,000	19	49,379,400	19	41,768,571	84.59	27,025,529	64.70	54.73	51.06	65
3	คป.เชียงใหม่	66	287,259,000	65	274,410,400	65	244,391,191	89.06	136,070,146	55.68	49.59	46.51	56
4	ก่อสร้าง สป.๑	5	174,000,000	5	170,052,000	5	160,983,501	94.67	89,194,924	55.41	52.45	59.30	13
5	คป.แม่แตง	58	94,234,000	58	90,990,000	58	91,302,000	100.00	48,732,325	53.37	53.56	51.00	48
6	คป.แม่กวาง	64	216,004,000	64	211,536,370	64	199,925,518	94.51	88,876,492	44.45	42.01	40.00	31
7	ห้วยฮ่องไคร้	10	55,135,000	9	33,135,000	9	33,135,000	100.00	12,394,361	37.41	37.41	45.00	46
8	คป.ลำพูน	42	182,052,000	41	174,223,730	41	141,788,120	81.38	38,330,440	27.03	22.00	42.97	26
9	สป.๑	11	110,811,100	11	110,811,100	11	93,519,055	84.40	19,891,221	21.27	17.95	35.15	16
เป้าหมายเบิกจ่าย		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2 (สิ้นเดือน มี.ค.64)		เดือน เม.ย.64		เดือน พ.ค.64		ไตรมาส 3 (สิ้นเดือน มิ.ย.64)		ไตรมาส 4	
เป้าหมาย งบฯ		20.00		45.00		51.67		58.34		65.00		100.00	
เป้าหมาย สำนัก		22.24		48.24		57.35		70.93		80.39		100.00	

กราฟแสดงผล...

กราฟแสดงผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๖๔ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

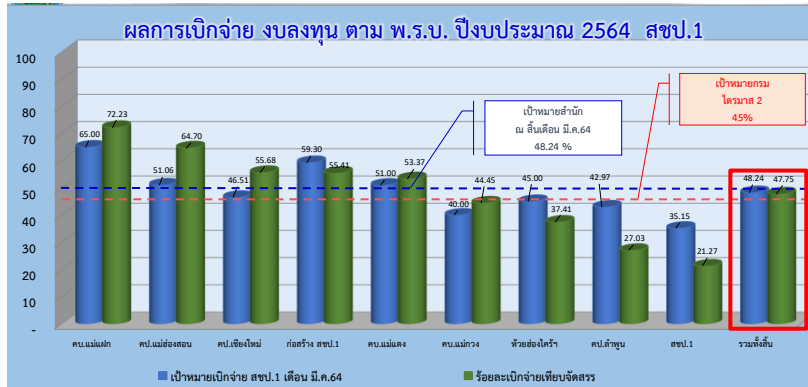

กราฟแสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ๖๔ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

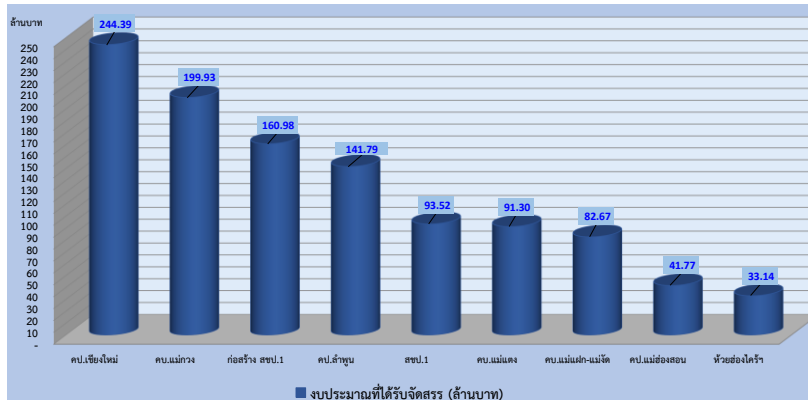

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่าย งบเพิ่มเติม๖๔ (โอนเปลี่ยนแปลง) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ
	งบเพิ่มเติม๖๔ (โอนเปลี่ยนแปลง)	3	33,992,800	3	33,992,800	28,340	0.08	33,964,460
1	ค.บ.สงขลา	1	8,000,000	1	8,000,000	-	-	8,000,000
2	ค.บ.แม่เหล็ก-แม่เหล็ก	2	25,992,800	2	25,992,800	28,340	0.11	25,964,460

ที่	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	งบเพิ่มเติม๖๔ (โอนเปลี่ยนแปลง)	33,992,800	33,992,800	28,340	0.08
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอย 9 ขวาแม่เหล็ก กม.2+277.3+678 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	9,830,000	9,830,000	28,340	0.29
2	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ณ L-MC (เหมืองลึก) ระยะ 4 ฝ่ายชลประทาน (ขนาดกลาง) ความยาว 0.530 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำห้วย ตำบลหนองช้างหิน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	8,000,000	8,000,000	-	-
3	ปรับปรุงคูคลองฝั่งขวาคลองซอย 9 ขวา แม่เหล็ก กม.0+000-1+877 และ กม.2+277.3+678 ความยาว 5,227.8 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	16,162,800	16,162,800	-	-

ผศ.ป.ลำพูน : ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ๔L-LMC (เหมืองลึก) ระยะ ๔ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำลังดำเนินการจัดหาตัววัสดุ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ประธาน : ขอรบกวนความก้าวหน้าการดำเนินงานฝ่ายหนองสลัก

ผศ.ป.ลำพูน : เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมในรายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างจะเสนอแผนบุคลากรและเครื่องจักรเครื่องมือ และจะส่งผู้รับจ้างเข้าทำงานภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง กปร. ปี ๒๕๖๔ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ
	งบกลาง กปร.๖๔	8	123,667,195	22,127,976	17.89	101,539,219
1	ค.บ.เชียงใหม่	2	13,167,600	106,224	0.81	13,061,376
2	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	6	110,499,595	22,021,752	19.93	88,477,843

ที่	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64 (บาท) (%)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
8	งบกลาง กปร.๖๔	389,288,966	123,667,195	22,127,976 17.89	
1	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ (จัดทำน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่)	6,800,000	6,467,600	-	ค.บ.เชียงใหม่
2	จัดทำน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	9,200,000	6,700,000	106,224	1.59
3	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	76,259,890	68,567,825	15,434,148	22.51
4	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	17,419,860	15,752,660	2,465,411	15.65
5	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	13,632,900	7,176,853	740,649	10.32
6	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	10,486,800	8,941,245	700,916	7.84
7	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	12,441,880	4,004,209	883,942	22.08
8	โครงการพัฒนาระบบชลประทานน้ำดิบที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	15,518,636	6,056,803	1,796,685	29.66

ผศ.ป.เชียงใหม่...

ผศ.เป็ยงใหม่ : ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างการจัดหาด้านวัสดุ ขณะนี้เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายในกำหนด

ผศ.ห้วยฮ่องไคร้ : ทั้ง ๖ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อไม่นานมานี้ และดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

สรุปผลการจ้างแรงงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จบ พ.ร.บ. ๖๔

ลำดับ	โครงการ	รายการที่มีการจ้างแรงงาน		แผนการจ้างแรงงาน		ผลการจ้างแรงงานสะสม						ร้อยละผลการจ้างแรงงาน	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนสะสม (คน)					ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนสะสม (%)	ค่าจ้างรวม (%)
						2.1	2.2	2.3	2.4	รวมทั้งสิ้น			
	จบ พ.ร.บ. 64	300	1,182,120,000	5,141	365,727,071	974	85	3,790	666	5,515	157,682,202	100.00	43.11
1	โครงการชลประทานเชิงใหม่	61	278,194,800	1,565	91,087,500	540		1,230		1,770	44,559,135	100.00	48.92
2	โครงการชลประทานลำพูน	38	174,425,000	450	21,898,030	23	3	396		422	12,353,099	93.78	56.41
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	16	53,100,000	262	19,369,800	216	70	71		357	10,911,801	100.00	56.33
4	โครงการฯ แม่แฝก-แม่ติ	44	83,157,200	399	39,102,890	96	11	7	666	780	26,268,252	100.00	67.18
5	โครงการฯ แม่แฝก	57	97,234,000	799	39,992,945					584	17,505,941	73.09	43.77
6	โครงการฯ แม่กวง	63	222,004,000	1,099	89,072,960	73				820	31,823,924	81.25	35.73
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	9	33,255,000	181	7,938,030	26	1	118		145	3,964,039	100.00	49.94
8	โครงการก่อสร้าง สป.1	5	174,000,000	345	52,834,915					523	8,731,222	100.00	16.53
9	ส่วนแผนงาน	5	7,750,000	28	2,730,000			26		26	1,164,336	92.86	42.65
10	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สป.1	2	59,000,000	13	1,700,000			15		15	400,453	115.38	23.56
การพิจารณาจ้างแรงงานตามลำดับ คือ													
2.1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร/เกษตรกรในพื้นที่												974 ราย	
2.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้ของกรมชลประทานในพื้นที่ดำเนินโครงการ												85 ราย	
2.3 ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในพื้นที่												3,790 ราย	
2.4 หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีเพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และศูนย์ฯ ตามลำดับ												666 ราย	

รายละเอียดโครงการที่เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							
		คำขอตั้งงบประมาณ		ผ่านพิจารณาของกองแผนงาน		ขอยกเลิกโครงการ		สรุปที่ได้รับการเสนอ เข้าคณะกรรมการพิจารณา รวบรวมงบประมาณ พ.ศ. 2565	
		รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการชลประทานเชิงใหม่	98	664,309,000	83	463,451,200			83	463,451,200
2	โครงการชลประทานลำพูน	62	191,440,100	27	85,267,700	2	40,520,000	25	44,747,700
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	20	98,980,000	15	39,600,000			15	39,600,000
4	โครงการ แม่แฝก	81	317,202,300	77	285,747,600			77	285,747,600
5	โครงการ แม่กวงอุดมธารา	77	142,350,500	58	113,533,000			58	113,533,000
6	โครงการ แม่แฝก-แม่ติ	75	171,976,200	63	69,405,000			63	69,405,000
7	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	103	118,760,200	80	95,429,700			80	95,429,700
8	โครงการก่อสร้าง สป.1	17	447,040,000	12	374,230,000			12	374,230,000
9	สำนักงานชลประทานที่ 1	10	61,208,000	9	24,523,000			9	24,523,000
รวม		543	2,213,266,300	424	1,551,187,200	2	40,520,000	422	1,510,667,200

รายละเอียดโครงการที่ยกเลิกในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน งบประมาณ	เหตุผลยกเลิก	หน่วยงาน รับผิดชอบ
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน							
1	ซ่อมแซมท่อลอดคนระบบท่อส่งน้ำห้วยปลาตุก อำเภอบ้านแม่อิง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	บ้านธิ	บ้านธิ	ลำพูน	520,000	จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีน้ำขังซ้อนทับโครงการของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่ 1	คป.ลำพูน
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ							
2	อาคารควบคุมการระบายน้ำฝายหนองลึก พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	บ้านเรือน	ป่าซาง	ลำพูน	40,000,000	ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม สถานที่ก่อสร้าง และแผนการดำเนินการไปใช้โครงการศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) โครงการชลประทานลำพูน ซึ่งมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม	คป.ลำพูน

รายละเอียดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ที่	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน						
1	ปรับปรุงอาคารสายพลังงาน ฝ่ายน้ำยม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	38,000,000	คป.แม่ฮ่องสอน
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
2	ซ่อมแซมฝายคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผาคอ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ป่างมู	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	600,000	คป.แม่ฮ่องสอน
3	ซ่อมแซมอาคารปล่อยคลองส่งน้ำ ฝ่ายป่างมู โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ป่างมู	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	650,000	คป.แม่ฮ่องสอน
4	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำวัดคอนาคี ฝ่ายทำโป่งแดง โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผาป่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	350,000	คป.แม่ฮ่องสอน
5	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำตื้น โครงการรักษาระบบน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ศูนย์แม่สะงา	ป่างมู	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	5,000,000	คป.แม่ฮ่องสอน
6	ปรับปรุงฝายบ้านไม้สะพานพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 0.600 กิโลเมตร	ป่างมู	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	15,000,000	คป.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ...

รายละเอียดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (ต่อ)

ที่	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน					63,800,000	
1	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 12R-2R-LMC แฉ่ง ความยาว 1.490 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	แม่ทอยพระ	แม่แตง	เชียงใหม่	8,400,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
2	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 7.5R-LMC แม่แฝก กม.1+275 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	4,900,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
3	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-16R-LMC แม่แฝก ความยาว 0.624 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่ติตสมบูรณ์ชล	ป่าไผ่	สันทราย	เชียงใหม่	5,500,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
4	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-1R-16R-LMC แม่แฝก ความยาว 0.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล	ป่าไผ่	สันทราย	เชียงใหม่	4,400,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
5	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 6L-1R-LMC แม่ติต ความยาว 1.280 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	ซ้อแล	แม่แตง	เชียงใหม่	7,300,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
6	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ความยาว 0.200 กิโลเมตร โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล	เมืองเมิน	สันทราย	เชียงใหม่	3,800,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
7	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-10R-LMC แม่แฝก ความยาว 1.600 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่ติตสมบูรณ์ชล	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	10,800,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
8	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-4R-LMC แม่แฝก ความยาว 1.05 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	แม่แฝกใหม่	สันทราย	เชียงใหม่	7,100,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
9	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 5R-LMC แม่ติต ความยาว 0.890 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	แม่ทอยพระ	แม่แตง	เชียงใหม่	5,000,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
10	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2R-1R-LMC แม่แฝก ความยาว 1.154 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	6,600,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน					12,850,000	
11	ซ่อมเสริมประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ 7.1R-LMC, 1R-7.1R-LMC, 1L-1R-7.1R-LMC แม่ จี้จำนวน 3 สาย พื้นที่รับประโยชน์ 421 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่ ติตสมบูรณ์ชล	แม่ทอยพระ	แม่แตง	เชียงใหม่	12,850,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ					25,000,000	
12	ประตูปะบายน้ำเหนือวังพร้อมโรงสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการส่งน้ำและ	หนองจ่อม,สัน ทรายน้อย	สันทราย	เชียงใหม่	25,000,000	ค.บ.แม่แฝก-แม่ติตสมบูรณ์ชล

ผลป.ล้าพูน : อาคารควบคุมการระบายน้ำฝ่ายหนองสลักฯ ไม่ได้จัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ไม่ทราบว่าจะเหตุใดจึงได้รับการพิจารณาจากกองแผนงาน

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่ไม่ได้รับการพิจารณาโครงการ/รายการงานจากกองแผนงาน เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในช่องทางอื่น โดยมอบ ผผง.ชป.๑ พิจารณาทหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและขอให้รายงานหลังวันหยุดประเพณีสงกรานต์

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายณัฐวุฒิ นากสุก ผวศ.ชป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ โดยสรุป ดังนี้

แผนงานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนงาน	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร (ณ 01/03/64)	%	หมายเหตุ
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๘๓	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๙๔.๐๐	พค. และ ปช.
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕๘	๖,๗๖๖,๗๐๐	๔,๖๕๐,๑๐๐	๖๘.๗๐	
๓	ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา	๕	๓,๕๑๘,๙๐๐	๒,๔๓๐,๒๐๐	๖๙.๑๐	
๔	ฝ่ายออกแบบ	๑๓๔	๖,๐๘๕,๐๐๐	๓,๕๑๕,๐๐๐	๕๗.๗๖	
๕	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	
รวม		๒๗๕	๑๘,๐๓๐,๖๐๐	๑๒,๑๕๕,๓๐๐ (๖๗.๔๑ %)		

แผนงานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๔(หน่วยเบิกร่วม)

ลำดับ	รายการ	จำนวน งาน	วงเงิน งบประมาณ	%	จำนวน งานที่ ได้รับ อนุมัติ	วงเงินงบประมาณ
๑	ฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนฯ	๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๖	๓๒๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวนงาน	วงเงิน งบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ณ 01/03/64)	เบิกจ่าย	% (เทียบจัดสรร)
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๘๓	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๔๖.๖๕	๒๕.๘๔
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕๘	๖,๗๖๖,๗๐๐	๔,๖๕๐,๑๐๐	๒,๑๐๔,๓๔๘.๐๐	๔๕.๒๕
๓	ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา	๕	๓,๕๑๘,๙๐๐	๒,๔๓๐,๒๐๐	๒,๐๒๗,๗๔๑.๐๐	๘๓.๔๔
๔	ฝ่ายออกแบบ	๑๓๔	๖,๐๘๕,๐๐๐	๓,๕๑๕,๐๐๐	๑,๔๐๔,๑๗๐.๕๕	๓๙.๙๔
๕	ฝ่ายตรวจสอบและ วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	-
๖	ฝ่ายจัดการด้านความ ปลอดภัยเขื่อนฯ	๑๖	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๖๗,๐๗๔.๕๕	๒๐.๙๖

เบิกจ่าย ๔๘.๗๓ % (จัดสรร)

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นายไพฑูรย์ เรืองสงคราม กส.๓/๑ พญ. แทน ผสญ.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปดังนี้ ผลการดำเนินงานทั้งโครงการคิดเป็น ๕๕.๗๑%



สัญญาที่ 1 กม. 0+000 - กม. 13+600 (ยาว 13.600 กม.)

- ☐ ผู้รับจ้าง บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด
- ☐ วงเงินสัญญา 2,854,822,739.00 บาท
- ☐ ระยะเวลา 1,800 วัน (เริ่มอายุสัญญา 23 มี.ย. 59 - 27 พ.ค. 64)
- ☐ ผลงาน 73.59% (แผนงาน 98.33%)

สัญญาที่ 2 กม. 13+600 - 25+624.378 (ยาว 12.024 กม.)

- ☐ ผู้รับจ้าง บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ☐ วงเงินสัญญา 2,134,000,000.00 บาท
- ☐ ระยะเวลา 1,800 วัน (เริ่มอายุสัญญา 23 มี.ย. 59 - 27 พ.ค. 64)
- ☐ ผลงาน 39.80% (แผนงาน 99.82%)

10



การดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด - แม่กวง

สัญญาที่ 1 กม.0+000 - 12+500 (ยาว 12.500 กม.)

- ☐ ผู้รับจ้าง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์
- ☐ วงเงินสัญญา 2,334,600,000.00 บาท
- ☐ ระยะเวลา 2,340 วัน (เริ่มสัญญา 24 มี.ค. 58 - 18 ส.ค. 64)
- ☐ ผลงาน 29.88% (แผนงาน 96.20%)

สัญญาที่ 2 กม.12+500 - 22+975 (ยาว 10.473 กม.)

- ☐ ผู้รับจ้าง บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น
- ☐ วงเงินสัญญา 1,880,800,000.00 บาท
- ☐ ระยะเวลา 1,609 วัน (เริ่มสัญญา 28 เม.ย. 58 - 22 ก.ย. 62)
- ☐ ผลงาน 99.90% (แผนงาน 100%)

11

ปัญหาอุปสรรค...

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
❖ ด้านเทคนิควิธีการทำงาน -กรณีวิทยาเกินกว่าคาดการณ์ (unseen problem) เช่น โพร่งถ้ำในอุโมงค์ น้ำใต้ดินสูง หินแข็ง (แกรนิตและรอยแตกมาก)	❖ ร่วมกับผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษา พิจารณาวิธีการก่อสร้าง ให้เหมาะสมตามข้อจำกัดของปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
❖ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ/ขาดสภาพคล่อง	❖ คณะกรรมการตรวจการจ้าง กำกับ ติดตาม เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา
❖ ปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ว่าจ้าง งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จิด สัญญาที่ 2 และงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จิด-แม่กวง สัญญาที่ 1 ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา	❖ การเร่งรัด ติดตามกระบวนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รมด.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาร่างประกาศแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศก่อนเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒน์ วศ.๑ พท.แทน ผสท.๑ รายงานความก้าวหน้าในความรับผิดชอบ โดยสรุป ดังนี้

งานที่ดำเนินการก่อสร้างในปี 2564

จำนวน 7 โครงการ

โครงการต่อเนื่อง

1. คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกันน้ำประจวบฯแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
2. ท่อรับดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บาวาง จังหวัดเชียงใหม่
3. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สละม ความยาว 6.690 กม. ต.ป่าคุ่ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บาวาง จังหวัดเชียงใหม่

กันเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563

1. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายบ้านใหม่ปางเดิม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2. อาคารป้องกันตลิ่งฝ่ายวังป่าน ความยาว 825 เมตร ตำบลหนองสอง อำเภอน้อยหนองสอง จังหวัดลำพูน
3. ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บาวาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการคันกันน้ำประจวบฯแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่



***เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564**

- งบประมาณ 19.9867 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 0.00 (0.00%)
- ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 87.75%

(สัญญาเลขที่ กจ.8/2561 (สพด.) เริ่มอายุสัญญา 23 พ.ค. 61 สิ้นสุดอายุสัญญา 7 พ.ย. 63) คาดว่าแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ท่านดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บาวาง จังหวัดเชียงใหม่



***เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564**

- งบประมาณ 21.4250 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 0.00 (0.00%)
- ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 0.13%

(สัญญาเลขที่ กจ.45/2563 (สพด.) เริ่มอายุสัญญา 15 ก.ค. 63 สิ้นสุดอายุสัญญา 31 ธ.ค. 65)



ระบบส่งน้ำ...

ระบบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลาม ความยาว 6.690 กม ตำบลป่าค้อ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



***เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564**

- งบประมาณ 93.8000 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 67.3465 ล้านบาท (68.51%)
- ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 73.56%

(แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว จังหวัดเชียงใหม่



***เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564**

- งบประมาณ 20.0000 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 3.5794 ล้านบาท (17.90%)
- ผลการดำเนินงาน 2.00%



ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว จังหวัดเชียงใหม่



***งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเหลื่อมปี)**

- งบประมาณ 28.0954 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 18.6513 ล้านบาท (66.39%)
- ผลการดำเนินงาน 20.00%



ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายบ้านใหม่ปางเดิม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่



***งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันเหลื่อมปี)**

- งบประมาณ 11.4938 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 11.4284 ล้านบาท (99.43%)
- ผลการดำเนินงาน 88.00%

แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





ที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑
นายวิราพงษ์ อัครรัตน์ วศ.จ.๑ แทน ผจก.๑ รายงานความก้าวหน้างานในความรับผิดชอบ

โดยสรุป ดังนี้



งานจัดระบบน้ำ...

 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2)
ตำบลคอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่



***งานปีงบประมาณ 2564**

- งบประมาณ 13.36 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 11.82 ล้านบาท (88.47%)
- ผลการดำเนินงาน 78.43 %



 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1)
ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน




***งานปีงบประมาณ 2563 เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา**

- งบประมาณ 2.18 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย 1.96 ล้านบาท (89.90%)
- ผลการดำเนินงาน 100.00 %



 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2)
ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



***งานปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม**

- งบประมาณ 7.00 ล้านบาท
- อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



ที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายนิธิ วรมงคล ผผ.ชป.๑ รายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสรุป ดังนี้

โครงการอันเนื่อง...

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - เสด็จฯ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันกรมชลประทาน จัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สขป.๑

วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ยกเลิกหมายกำหนดการเสด็จฯ เนื่องทรงพระประชวร

๒. โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๒.๑ งานประติรูปบายน้ำแม่ปุกา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันเตรียมความด้านวิศวกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอ งบประมาณโดยโครงการก่อสร้าง สขป.๑

๒.๒ การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า (การจัดหาน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า)

๒.๓ โครงการเกษตรวิชยา ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่

งานฎีกาของ สขป.๑

ราษฎรขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ต.แม่ตืน และ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกคำพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๙ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายณรงค์ อินทวัน)
๒. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แตบกพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๑๕ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายณรงค์ อินทวัน)
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๑๐ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายณรงค์ อินทวัน)
๔. โครงการทำนบกั้นน้ำห้วยเกียงพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๑๑ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายสาย อินตาแก้ว)
๕. โครงการทำนบกั้นน้ำห้วยหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๓ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายสาย อินตาแก้ว)
๖. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กืตพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๑๖ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายสาย อินตาแก้ว)
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอมป้าพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๙ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน (ฎีกา นายมงคล พุ่มบุญ)

งานฎีกาเพิ่มเติม

๑. งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายตอนบน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๒. ฎีกานายอดิศักดิ์ ดวงจินดา ในพื้นที่อำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
 - ๒.๑ ฝ่ายต้นน้ำขุนแม่รวม พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๒ ฝ่ายบ้านแม่ละอุป พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๓ ฝ่ายบ้านกัวโป่ง พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๔ ฝ่ายบ้านหนองเจ็ดหน่วย พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๕ ฝ่ายต้นน้ำบ้านห้วยฮ่อม ๑ พร้อมระบบส่งน้ำ และฝ่ายต้นน้ำบ้านห้วยฮ่อม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๖ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแดง สูง ๑๙ ม. ยาว ๑๙๐ ม. ความจุ ๑๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๗ ฝ่ายต้นน้ำบ้านแจ่มน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ
 - ๒.๘ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แดด สูง ๑๗ ม. ยาว ๙๐ ม. ความจุ ๑๙๐,๙๔๐ ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ

ประธาน : โครงการพระราชดำริเป็นงานที่มีความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ มอบ ผอ.สขป.๑ สรุปงานที่ ราษฎรถวายฎีกาต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้างาน ภายใน ๑ แผ่นเอกสาร และรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๙ การจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

นายจิรินทร์ คงศรีเจริญ ผอ.สขป.เชียงใหม่ รายงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุป ดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่รับน้ำ...

[illegible]

ลำดับ	ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคล่องแม่ข่ายและคลองสาขา	
	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินงาน (%)
แผนงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่จัน-แม่แตง (ปี2560-2566) ความยาว 21.355 กม. (งบ 2,000,000,000 บาท)	36.975% สพญ.1
1	แก้มลิงฝายแม่แตง แห่งที่ 1 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ความจุ 1.156 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 48,046,300 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
1	แก้มลิงฝายแม่แตง แห่งที่ 2 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ความจุ 1.807 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 49,250,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
2	แก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบแห่งที่ 1 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ความจุ 0.138 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 14,500,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
3	แก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ความจุ 0.190 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 9,500,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
4	แก้มลิงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอาคารประกอบ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ความจุ 0.249 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 9,800,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
5	แก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบแห่งที่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ความจุ 0.119 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 8,500,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% คป.แม่แตง
6	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่าย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (11L) วงเงิน 9,800,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% ผศ.ชป.1
7	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่าย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (14L) วงเงิน 7,800,000 บาท	ผลการดำเนินงาน 100% ผศ.ชป.1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ ผลดำเนินงาน 100% ผศ.ชป.1
2	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 21L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่1) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 49,000,000 บาท	ผลดำเนินงาน 100% ผศ.ชป.1

ลำดับ	ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคล่องแม่ข่ายและคลองสาขา	
	แผนงาน/โครงการ	การดำเนินงาน (%)
แผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการ		
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
1	ประตูปรับน้ำสบแม่ข่าย พร้อมโรงสูบน้ำ พลังไฟฟ้า สนับสนุน โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคล่องแม่ข่ายจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับ ประโยชน์ 800 ไร่ ต.สบแม่ข่าย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 55,946,000 บาท	งบกรมชลประทาน ผลการดำเนินงาน -ดำเนินการเอง 47% -จ้างเหมา 0%
3	แก้มลิงศูนย์ฝัก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ความจุ 0.400 ล้าน ลบ.ม.) วงเงิน 20,000,000 บาท	งบกรมชลประทาน ผลดำเนินงาน 40%
แผนงานในอนาคต		
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 2 (อาคารป้องกันตลิ่งแม่ข่ายน้อย) ต.สบแม่ข่าย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 23,200,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
2	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 21L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 40,000,000 บาท	งบกรมชลประทาน คป.แม่แตง
3	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 12L-RMC สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาคล่องแม่ข่าย ความยาว 1.050 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง วงเงิน 9,000,000 บาท	กรมชลประทาน คป.แม่แตง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
1	ปรับปรุงคลองแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 3 ต.สบแม่ข่าย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
2	แก้มลิงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ความจุ 0.200 ล้าน ลบ.ม.) ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบกรมชลประทาน คป.เชียงใหม่


แผนงานในอนาคต...

แผนงานในอนาคต

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2570		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2571		
1	ปรับปรุงระบบส่งน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 20,000,000 บาท	งบจังหวัดเชียงใหม่ คป.เชียงใหม่



งานปรับปรุงคลองระบายน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

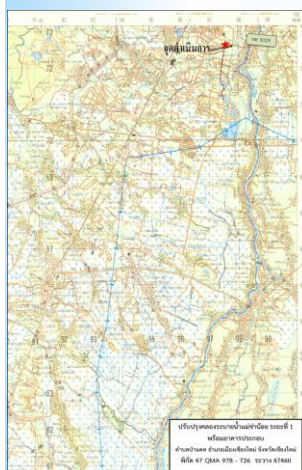

โครงการ ที่ตั้ง ปรับปรุงคลองระบายน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากคลองแม่ข่ายน้อย เป็นลำน้ำเดิมมีอัตราการรั่วซึมสูง และมีการพังทลายของตลิ่ง สภาพลำน้ำเดิมตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่ายน้อย โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เสนอขออนุมัติโครงการตามแบบปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักจัดหาและสนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่าย กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 2,632.00 เมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

วิธีการดำเนินการ

1. ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่ายน้อย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่คันพิศได้ของเมืองเชียงใหม่ได้
2. สามารถรักษาระบบนิเวศน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในลำคลองแม่ข่ายน้อยให้ดีขึ้นได้

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการอ้างสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน ทุกถ้ำคลองสาธารณะประโยชน์
2. ปัญหาประชาชนมีความต้องการใช้น้ำอยู่ตลอดเวลา ทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้า
3. ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)



งานปรับปรุงคลองระบายน้ำแม่ข่ายน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่




ปรับปรุงคลองส่งน้ำ...





ประตุน้ำสบแม่ฟ้า พร้อมโรงสูบน้ำ พลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคอขวดน้ำ
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลสบแม่ฟ้า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



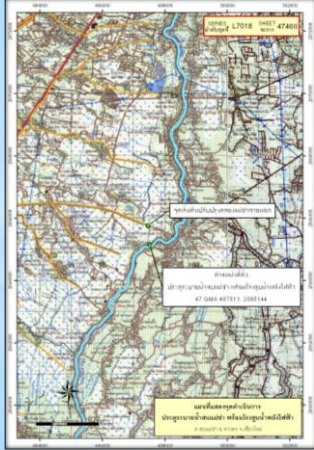

โครงการ ประตุน้ำสบแม่ฟ้าพร้อมโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคอขวดน้ำ
ปัญหาคอขวดน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 800 ไร่
ที่ตั้ง ต.สบแม่ฟ้า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 55,946,000 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) (ดำเนินการเอง+จ้างเหมา)

เหตุผลและความจำเป็น
 คอขวดแม่ฟ้า (สายนอก) เป็นคลองที่รับน้ำออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของถนน วงแหวนรอบกลาง (รอบที่ 2) ไหลผ่านตำบลป่าแดด อำเภอเมือง ลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ฟ้า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงมาก ทำให้น้ำในคลองแม่ฟ้า (สายนอก) ไหลลงแม่น้ำปิงได้ไม่สะดวก ขณะเดียวกันกระแสน้ำในแม่น้ำปิงก็ไหลย้อนกลับเข้าไปในคลองแม่ฟ้า เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของราษฎรในเขตตำบลสบแม่ฟ้า รวมถึงพื้นที่ทางด้านเหนือ น้ำ ทำให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำทุกปี


วิธีการดำเนินการ
 1. ก่อสร้างประตุน้ำ พร้อมอาคารประกอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สามารถบรรเทาทุกข์ในเขตตำบลสบแม่ฟ้า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 2. สามารถรองรับปริมาณน้ำจากโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน 47%





แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้านลบ.ม.
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



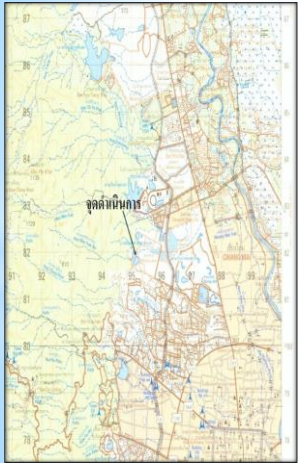

โครงการ แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้าน ลบ.ม.
ที่ตั้ง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) (ดำเนินการเอง)
เหตุผลและความจำเป็น
 เนื่องจากพื้นที่เดิมมีลักษณะเป็นแก้มลิงแคบติดกัน ขนาดพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ลึกประมาณ 4-5 เมตร รับน้ำฝนจากลำห้วยที่ไหลมาจากดอยสุเทพ มีอาคารส่งน้ำเชื่อมต่อกันและมีอาคารระบายน้ำ 2 จุด ปัจจุบันอาคารอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม บริเวณแก้มลิงทั้งสองมีวัชพืชปกคลุมตามบริเวณขอบและบางจุดมีตะกอนดินขึ้น ทุกๆปีน้ำจะไหลผ่านทางระบายน้ำสั้นเกินไป
วิธีการดำเนินการ
 1. ขุดลอก/ปรับปรุงสระเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง ปริมาตรความจุ 0.400 ล้าน ลบ.ม.
 2. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ คสล. จำนวน 1 แห่ง , ก่อสร้างอาคารระบายน้ำสั้นพร้อมบานควบคุม จำนวน 1 แห่ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สามารถเพิ่มเก็บปริมาณความจุของสระเก็บน้ำ และได้ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 0.100 ล้าน ลบ.ม.เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสภาพพื้นที่หากได้รับการพัฒนา ทำให้มีสภาพสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสถานที่ราชการรอบ แหล่งเก็บน้ำ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการระบายน้ำ
 2. สามารถเป็นแหล่งเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ราชการ และชุมชนใกล้เคียง
 3. สามารถส่งเสริมและขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาไปสู่ต่อไป
ผลการดำเนินงาน 47%

ปัญหา/อุปสรรค

การจัดหาเครื่องจักรกล (เช่าเครื่องจักร)



แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้านลบ.ม.
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่








ประธาน : โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคองแม่ข่า เป็นการพัฒนามตามแนวทางคลองสวยน้ำใส ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานถาวรเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว มีแนวทางการดำเนินการป้องกันน้ำเสียไหลลงสู่คลองแม่ข่าหรือไม่

ผคป.เชียงใหม่ : กรมควบคุมมลพิษและเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำ Master Plan ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธาน : มีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการป้องกันน้ำเสียไหลลงสู่คลองแม่ข่าควบคู่กันเพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงการฯ ทั้งนี้ ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงผู้บริหารกรมด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

ผคป.ลำพูน : ขอรายงานโครงการพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มเติมได้แก่โครงการก่อสร้างคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีปัญหาเรื่องที่ดินเพราะคันกันน้ำติดพื้นที่โรงเรียนเอกชน ซึ่งได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ให้สอบเขตที่ดินแต่โรงเรียนยังไม่ดำเนินการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญห

ประธาน : ให้ติดต่อหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อประสานการแก้ไขปัญหที่ดินกับโรงเรียนดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๐ การต้อนรับคณะกรรมการในการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ รายงานการต้อนรับคณะกรรมการในการ
ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยสรุป ดังนี้

จุดที่ ๑ รับฟังบรรยายความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน



จุดที่ ๒ เยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ



จุดที่ ๒ เยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ



จุดที่ ๓ เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ ๗



พูดคุย สอบถาม เกษตรกรและผู้มาต้อนรับ



ที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๑ การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายนิธิ วรมงคล ผผง.ขป.๑ รายงานตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุป ดังนี้ สขป.๑ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน ๒๑ แบ่งเป็นตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัดตามภารกิจ และ ๖ ตัวชี้วัดกลาง ซึ่งกองแผนงาน กำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

๑. รายงานผลรอบระยะเวลา ๖ เดือน โดยรายงานผลบนเว็บไซต์ สขป.๑ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
 ๒. รายงานผลรอบระยะเวลา ๗-๑๒ เดือน โดยรายงานผลในระบบ KPI Online ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
- ❖ ขอให้ทุกโครงการ ฯ ส่งผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

❖ ตัวชี้วัดตามภารกิจ ๑๕ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบโดย ผผง.ขป.๑ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

ขป.-1 : จำนวนบริษัทร่วมกับกับน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) เป้าหมาย 0.40 ล้าน ลบ.ม.

ชุดการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	รายการ	เป้าหมาย (ล้าน ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน
(จำนวนบริษัทร่วมกับกับน้ำที่เพิ่มขึ้น + จำนวนบริษัทร่วมกับกับน้ำที่ลดลง) × 100 (กรณีรายการมากกว่า 1 รายการ ให้ คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	9	ร้อยละ	1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน	(9) บริษัทร่วมกับกับน้ำ ๓๓.๓๓ บริษัทฯ/ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๔๐ ล้าน ลบ.ม. (๓.๔๐ ล้าน ลบ.ม.)	0.40	20,000,000	9,000	0.00	1.00 0.0900
				รวม	0.40	20,000,000	9	0.00	0.0900

ขป.-2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่) เป้าหมาย 5,730 ไร่

ชุดการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	รายการ	เป้าหมาย (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน
(จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น + จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ลดลง) × 100 (กรณีรายการมากกว่า 1 รายการ ให้ คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	9	ร้อยละ	1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน	โครงการชลประทาน 7 โครงการ	220	37,000,000	1,5466	0 0 1.00	0.0155
				1. (3) ฝ่ายทุ่งฉัตรพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งฉัตร อ.ทุ่งหว้า อ.ลำพูน (ค.ส.ขป.๑)	600	40,000,000	1,6720	0 0 1.00	0.0167
				ค.แม่มาลี อ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน (ค.ส.ขป.๑)	1,900	18,000,000	0.7524	0 0 1.00	0.0075
				3. (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากปลิง ค.หนองปลาทราย อ.บ้านสิงห์ อ.ลำพูน (ค.ส.ขป.๑)	2,020	42,000,000	1.7556	0 0 1.00	0.0176
				4. (2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สังก. ค.เจ้าแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ค.ส.ขป.๑)	150	40,000,000	1.6720	0 0 1.00	0.0167
				5. (3) ฝ่ายทุ่งฉัตรพร้อมระบบส่งน้ำ ค.แม่มาลี อ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน (ค.ส.ขป.๑)	140	15,000,000	0.6270	0 0 1.00	0.0063
				6. (58) ระบบส่งน้ำบ้านประจักษ์ ค.แม่มาลี อ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน (ค.ส.ขป.๑)	700	23,315,000	0.9745	0 0 1.00	0.0097
				7. (210) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่ากุ่ม 2 ค.บ้านแม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ค.ส.ขป.๑) (ค.ส.ขป.๑) (ค.ส.ขป.๑)	5,730	215,315,000	9	0 0 1.00	0.0900
				รวม	5,730	215,315,000	9	0 0 1.00	0.0900

ขป.-๕ ร้อยละ...

ขป.-5 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมาย 1,018 ครัวเรือน จาก 7 โครงการก่อสร้าง

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวน	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ผลคะแนน
(จำนวนครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์ ÷ จำนวนครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์ตามแผน) × 100	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ครัวเรือนในเขต ขป.	(ครัวเรือน)	(ร้อยละ)	ที่ได้
			60	70	80	90	100	1,018	1,018	1,018	- 1.00 0.0300

1. (3) ฝ่ายทุ่งนันทน์พร้อมระบบส่งน้ำ ค.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (คป.ขป.1)	100
2. (5) ฝ่ายบ้านจาลองพร้อมระบบส่งน้ำ ค.แม่บาตัง อ.ป่า จ.แม่ฮ่องสอน (คป.ขป.1)	220
3. (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากคอง ค.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (คป.ลำพูน)	85
4. (2) อาคารป้องกันน้ำท่วมพร้อมระบบส่งน้ำ ค.ช่วงป่า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (คป.ขป.1)	233
5. (3) ฝ่ายห้วยเหืองพร้อมระบบส่งน้ำ ค.แม่ลอบ อ.แม่อาย จ.ลำพูน (คป.ขป.1)	90
6. (58) ระบบส่งน้ำบ้านปรือเมือง ค.แม่ใจ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (คป.ขป.1)	75
7. (210) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่ากอเม้ง 2 ค.บ้านแม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้)	215
รวม	1,018

ขป.-10 : ร้อยละของจำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมาย 1,250 ไร่ จาก 4 โครงการ

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					แผน	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน		
(พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ÷ พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานตามแผนป้องกัน)	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	(ไร่)	(ล้านไร่)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ช่วงน้ำหนัก	
			60	65	70	75	80	1,250	1,250	-	1.00	0.0300	
ถ้าผู้สมัครการดำเนินการแล้วมีมากกว่า 80% จะให้คะแนนเพิ่มอีก 5													

เป้าหมาย

1. (13) ประตูระบายน้ำสบแม่ฟ้า พร้อมโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาดองแม่ฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ (คป.เชียงใหม่)	800
2. (1.22) อาคารป้องกันกรัดเซาะตลิ่งฝายแม่ปูลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (คป.แม่กวง)	350
3. (3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมดินสึบเซาะ พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติฝั่งซ้ายของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)	50
4. (2) ปรับปรุงโหลเขื่อนฝั่งซ้ายเขื่อนแม่จิมสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลซ้อแล อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)	50
รวมเป้าหมายพื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	1,250

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.

ขป.-16 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย กงบ.)

ใช้ตัวเลข GFMS

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)	ผลคะแนน
(จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ. ที่สำนัก กอมีผลการเบิกจ่ายในงบประมาณ ÷ จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) × 100	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ	ที่ได้
			8	11	14	17	20	1,089 520	47.75 5.00 0.4500

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบโดย ผจบ.ขป.๑ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด

ขป.-3 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (หน่วย : ร้อยละ) จากผลข้อมูล รอบ 6 เดือน คิดเฉพาะพื้นที่ดูแล

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					พื้นที่ทำการผลิตสินค้าเกษตร			พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ผลงาน	ผลคะแนน			
			ผลการเป็นผู้นำด้านปริมาณน้ำใช้ 4 - 5 %					ในเขตชลประทาน (ไร่)			ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี (ไร่)			(ร้อยละ)	ที่ใด	ตัวบ่งชี้
สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน 1. ผลการเป็นผู้นำด้านปริมาณน้ำใช้ 4 - 5 % 2. ผลการเป็นผู้นำด้านปริมาณน้ำใช้ 4 - 5 % 3. ผลการเป็นผู้นำด้านปริมาณน้ำใช้ 4 - 5 %	9	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	รวม	ฤดูฝน	ฤดูแล้ง	รวม	58.82	1.00	0.0900
			เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	-	298,171	298,171	-	253,473	253,473			
			±17.5%	±14.0%	±10.5%	±7%	±3.5%									

1. โครงการชลประทานเชียงใหม่	0	59,096	59,096	0	30,949	30,949
2. โครงการชลประทานลำพูน	0	77,400	77,400	0	67,893	67,893
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	0	10,218	10,218	0	10,790	10,790
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม	0	40,745	40,745	0	27,288	27,288
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแมกุ่มดอย	0	69,815	69,815	0	76,267	76,267
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแมกุ่มดอย	0	40,897	40,897	0	40,286	40,286
รวม	0	298,171	298,171	0	253,473	253,473

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \left[\frac{\text{พื้นที่บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง} + \text{พื้นที่บริหารจัดการน้ำในฤดูฝน}}{\text{พื้นที่เป้าหมายในฤดูแล้ง} + \text{พื้นที่เป้าหมายในฤดูฝน}} \right] \times 100$$

ขป.-4 : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (Cropping Intensity) (หน่วย : ร้อยละ) จากผลข้อมูล รอบ 6 เดือน คิดเฉพาะพื้นที่ดูแล

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					พท.บริหารจัดการน้ำ	ผลสำเร็จ	ผลคะแนน
(พื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ÷ พื้นที่ชลประทาน) × 100	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ฤดูแล้ง ฤดูฝน	(ไร่) (ร้อยละ)	ที่ได้
			น้อยกว่า 119% หรือ ไม่มากกว่า 151%	น้อยกว่า 123% หรือ ไม่มากกว่า 147%	น้อยกว่า 127% หรือ ไม่มากกว่า 143%	น้อยกว่า 131% หรือ ไม่มากกว่า 139%	135%	298,171 0	592,931 298,171	50.29 1.00 0.0300

การคำนวณผลสำเร็จ
(พื้นที่บริหารจัดการน้ำของโครงการทั้งหมด ÷ ในฤดูแล้งและฤดูฝน หาค่าด้วยพื้นที่ชลประทานทั้งหมด) × 100

โครงการ	พื้นที่ฤดูแล้ง		พื้นที่ฤดูฝน	
	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่บริหาร (ไร่)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่บริหาร (ไร่)
1. โครงการชลประทานเชียงใหม่	147,339	59,096	0	0
2. โครงการชลประทานลำพูน	101,600	77,400	0	0
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	22,250	10,218	0	0
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม	99,298	40,745	0	0
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแมกุ่มดอย	148,400	69,815	0	0
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแมกุ่มดอย	74,044	40,897	0	0
รวม	592,931	298,171	0	0

กรมฯ กำหนดค่า Cropping intensity 135% เนื่องจากเป็นค่าที่เหมาะสม ที่จะบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ และรักษาระบบนิเวศ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผจบ.ขป.1

ขป.-๖ ปริมาณน้ำ...

ขป.-6 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

จากผลข้อมูล รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำ	ผลสำเร็จ	ผลคะแนน		
(ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ตาม วัตถุประสงค์การจัดทำ × ปริมาณน้ำ ต้นทุน) × 100	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ที่จัดสรร	ต้นทุน	(ถ้า น.ม.) (ร้อยละ)	ที่ 5	ด้วยน้ำหนัก	
			60	70	80	90	100	314.42	294.86	314.42	106.63	5.00	0.1500

การคำนวณผลสำเร็จ = (นำปริมาณน้ำที่จัดสรร
รวมทุกโครงการ / ปริมาณน้ำต้นทุน) x 100

1. โครงการอบรมพัฒนาเชิงใหม่	59.02	31.80	185.60
2. โครงการอบรมฯพื้นฐาน	38.79	17.64	219.90
3. โครงการอบรมฯแบบสื่อการสอน	63.83	67.17	95.03
4. โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษามนั้แดง	43.77	40.52	108.02
5. โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษามังกรงอุดมสวรา	65.66	71.18	92.25
6. โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษามนั้แดง-เมฆี	43.35	66.55	65.14
รวมปริมาณน้ำทุกโครงการ	314.42	294.86	106.63

ขป.-7 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่มีคุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐานกลางของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนข้อ	ได้คะแนนมาตรฐาน		ผลคะแนน	
(จำนวนข้อที่นักเรียนและพหุบัน ขอประทานสิทธิ์การตรวจวัดได้ตาม เกณฑ์มาตรฐาน + จำนวนข้อที่นักเรียน และพหุบันขอประทานสิทธิ์การ ตรวจวัดทั้งหมด) x 100	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ที่ตรวจวัด	(แห่ง)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			80	85	90	95	100	38	38	100	5.00	0.1500

1. โครงการชลประทานเชิงใหม่ (13 แห่ง)	13	13	100
2. โครงการชลประทานลำพูน (7 แห่ง)	7	7	100
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (2 แห่ง)	2	2	100
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (4 แห่ง)	4	4	100
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะม่วงอุดมธรา (1 แห่ง)	1	1	100
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะม่วงแม่จิด (3 แห่ง)	3	3	100
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (8 แห่ง)	8	8	100
2564 รวม ทุกโครงการ มีจำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน (แห่ง)	38	38	100

ขป.-8 : อัตราการใช้น้ำในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำ (เลือก 1 โครงการ) (หน่วย : ร้อยละ)

ชุดการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ปริมาณค่า (ด้าน สม.บ.)			ผลงาน	ผลคะแนน		
((ปริมาณน้ำที่ถูกใช้เพื่อการเกษตรตามฤดูกาล + การรักษ - สิ่งใช้การ) x ปริมาณน้ำชลประทานที่จัดส่งให้เกษตรกร) x 100	1	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	ตามฤดูกาล	วิธีอื่น	ไม่ใช้การ	ใช้บางส่วน	(ร้อยละ)	ที่ 12	ส่วนน้ำหนัก
			20	30	40	50	60					1.00	0.0100	

$$\text{สูตรการคำนวณ} = (\text{ปริมาณน้ำสุกที่พืชต้องการตามทฤษฎี} + \text{การระเหย} - \text{ฝนใช้การ}) / \text{ปริมาณน้ำที่จัดส่งทั้งหมด} \times 100$$

ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
ผลงาน (ร้อยละ)	-	73.70 ต่ำกว่า	70.90 ไม่สอดคล้อง	82.54 ไม่คง	73.40 ต่ำกว่า

ได้คะแนน = 5.00 ทุกปี

ขป.-9 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง (หน่วย : ร้อยละ)

ชุดการคำนวณ	น้ำมันดิบ	หน่วยวัด	องค์ประกอบต้นทุน					ถลุงสี (บาท/ไร่)		ถลุงสี (บาท/ไร่)		ถลุงสี+ถลุงสี		ผลต่อแผน		
(พื้นที่ปลูกข้าวไร่ในเขตชลประทานที่เสียค่าใช้หว่าน - พื้นที่ไร่ปลูกข้าวไร่ในเขตชลประทานที่หว่าน) x 100	3	ร้อยละ	1.ต้นทุน	2.ต้นทุน	3.ต้นทุน	4.ต้นทุน	5.ต้นทุน	พื้นที่ปลูก	พื้นที่	พื้นที่ปลูก	พื้นที่เสียหาย	พื้นที่ปลูก	พื้นที่	ร้อยละ	ที่คิด	ค่าไร่/ไร่
			0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	100,765	-	-	-	100,765	-	-	5.00	0.1500

1. โครงการชลประทานเชิงใหม่	24,488	-	-	-
2. โครงการชลประทานสำกุน	9,507	-	-	-
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-
4. โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	12,872	-	-	-
5. โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	40,612	-	-	-
6. โครงการสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	13,286	-	-	-
รวม	100,765	-	-	-

ขป.-11 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวน	ผลสำเร็จ	ผลคะแนน		
(จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำของชลประทานอย่างทันต่อเหตุการณ์ ÷ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด) x 100	3	ร้อยละ	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	(กลุ่ม)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ด้วยน้ำหนัก
			80	85	90	95	100	28	28	100	5.00	0.1500

กลุ่มเป้าหมาย	1. โครงการชลประทานเชิงใหม่	4	4
	1. ผู้ว่าราชการจังหวัด		
	2. โครงการชลประทานลำพูน	4	4
	2. ป้องกัฒและบรรพตพลาสาธณอัยจังหวัด		
	3. โครงการชลประทานเมือสงอน	4	4
	3. สื่อนาชลนทีที่ควมรับผิดชอบ		
	4. โครงการสงนและบำรุงรักษาแมตง	4	4
	4. อปท.ที่อยู่ในที่ควมรับผิดชอบ		
	5. โครงการสงนและบำรุงรักษาแมทวงอุสมรา	4	4
	6. โครงการสงนและบำรุงรักษาแมฝกแมต	4	4
	7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร	4	4
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายรวมทุกโครงการ	28	28

ชป.-๑๒ ร้อยละ...

ขป.-12 : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายผู้ใช้เข้าทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ร้อยละ)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					แผน	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		(เครือข่าย) (ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
จำนวนเครือข่ายผู้ใช้เข้าทุกภาคส่วนที่ดำเนินการจัดตั้งไปแล้วเสร็จ ÷ จำนวนเครือข่ายตามแผน x 100	9	ร้อยละ	80	85	90	95	100	19	10	53	1.00	0.0900

1. โครงการชลประทานเชิงใหม่	16	10	
2. โครงการชลประทานลำพูน	3	-	
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน			
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง			
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา			
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แจ่ม-แม่จิด			
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้			
แผน จำนวนเครือข่ายใน ปี 2564 รวมทั้งหมด	19	10	53

*เครือข่ายผู้ใช้เข้า หมายถึง คณะกรรมการจัดการชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน กลุ่มผู้ใช้บริการชลประทาน(พื้นฐาน) ยุวชลกร

ขป.-14 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือบริหารงานจัดการน้ำในงานชลประทาน (ระดับ 4) และ/หรือระดับการเสริมอำนาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 5) (หน่วย : ร้อยละ) ข้อ มูล ปีปัจจุบัน รอบ 6 เดือน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					จำนวนโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		(โครงการ) (ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
(จำนวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการเสริมอำนาจประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 4 และ/หรือระดับ 5) ÷ จำนวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด) x 100	3	ร้อยละ	60	65	70	75	80	33	33	100.00	5.00	0.1500

การดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

ระดับ 4 ความร่วมมือ Collaboration

การให้กลุ่มประชาชน มีส่วนร่วม โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในทุกระดับของการตัดสินใจ และการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 การเสริมอำนาจแก่ประชาชน Empower

ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ

โครงการที่มีส่วนร่วมตามขบวนการ 14 ขั้นตอน

1. โครงการชลประทานเชิงใหม่	19	19
2. โครงการชลประทานลำพูน	9	9
3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	2	2
4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	1	1
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา	1	1
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แจ่ม-แม่จิด	1	1
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	0	0
เป้าหมาย ในปี 64 จำนวนโครงการ รวมทั้งหมด	33	33

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.ขป.

ขป.-15 : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) เป้าหมาย 229 รายการ

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					แผน	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		(โครงการ) (ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
(จำนวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ดำเนินงานได้จริง ÷ จำนวนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแผนทั้งหมด) x 100	3	ร้อยละ	92	94	96	98	100	229	36	15.72	1.00	0.0300

1. สำนักงานชลประทานที่ 1	1	0
2. โครงการชลประทานเชิงใหม่	46	7
3. โครงการชลประทานลำพูน	29	11
4. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	12	4
5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	50	3
6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา	51	1
7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แจ่ม-แม่จิด	38	9
8. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	2	1
รวม	229	36

❖ ตัวชี้วัดกลาง ๖ ตัวชี้วัด (ประเมินโดยส่วนกลาง)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ขป.-๑๗ ขป.-๑๘ ขป.-๑๙ : ทุกหน่วยงาน

ขป.-17 : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานชลประทาน (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย กสช.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลสำเร็จ	ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในรูปร้อยละ ÷ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	3	ร้อยละ	65	70	75	80	85	-	1.00	0.0300

ขป.-18 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของสำนัก (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย กงบ.)

ใช้ตัวเลข GFMS

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					งบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ล้านบาท)			
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ที่ได้
(จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายไปงบประมาณ ÷ จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรทั้งหมด) x 100	3	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 5				
			12	17	22	27	32				
			30	36	42	48	54				1.00
			49	56	63	70	77				
			72	79	86	93	100				

ขป.-19 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (หน่วย : ร้อยละ) (ประเมินโดย สบค.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลสำเร็จ	ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน ÷ ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จำนวนด้านทั้งหมด	3	ร้อยละ	65	70	75	80	85		1.00	0.0300

ขป.-๒๐ ความสำเร็จ...

ขป.-20 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (ประเมินโดย สบค.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	ผลคะแนน								
	3	ร้อยละ	1 คะแนน ระดับ 1	2 คะแนน ระดับ 2	3 คะแนน ระดับ 3	4 คะแนน ระดับ 4	5 คะแนน ระดับ 5	(ระดับ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก							
									1.00	0.0300							
			มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนัก/กองให้เป็นปัจจุบัน และได้นำเสนอตามแนวทางที่กำหนด								มีแผนการจัดการความรู้องค์ประกอบและรูปแบบตามที่กำหนดมาตรฐาน (ข้อกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการความรู้กรมชลประทาน)		แสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรม KM Day ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือฯ		ดำเนินการกิจกรรมตามแผนสำเร็จร้อยละ 100 และแสดงผลการดำเนินการตามแบบทางการกำหนดในคู่มือฯ		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : คณะทำงานจัดการความรู้

ขป.-21 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (หน่วย : ร้อยละ)(ประเมินโดย สทส.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน (คะแนน)	ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รายละเอียดการ ดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและ ไม่ซ้ำขั้นตอน	3	ร้อยละ	20	30	50	70	100		1.00	0.0300

ถ้าค่าในการคำนวณที่ได้ค่าเลข 100 % จะได้อัตราคะแนน = 5 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผปท.ขป.1

ขป.-22 : การปรับปรุงกระบวนการ/พัฒนานวัตกรรม (ประเมินโดย สบค.)

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลงาน	ผลคะแนน	
	3	ร้อยละ	1 คะแนน ระดับ 1	2 คะแนน ระดับ 2	3 คะแนน ระดับ 3	4 คะแนน ระดับ 4	5 คะแนน ระดับ 5	(ระดับ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			มีเอกสารสรุป บทเรียนของ สำนัก/กอง	ระบบการ ปรับปรุง กระบวนการ/ พัฒนา นวัตกรรม	ดำเนินการ ปรับปรุง กระบวนการ/ พัฒนา นวัตกรรมตาม แนวทางที่ กำหนด	ทดลองปฏิบัติ จริงและ ประเมินผล	สรุปผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง กระบวนการ/ พัฒนา นวัตกรรมและ บันทึกผลลง ความรู้อย่าง ครบถ้วนตาม กรอบเวลาที่ กำหนด		1.00	0.0300
								ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : คณะทำงานจัดการความรู้		

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด ๗ กิจกรรม

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/หลักฐาน	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑	CKO ลงนามคำสั่ง /แสดงไฟล์คำสั่งในเว็บคลังความรู้ สขป.๑ คณะทำงานจัดการความรู้ ได้ดำเนินการแล้ว	มี.ค. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๒	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของ สขป.๑	CKO ลงนามอนุมัติแผน /แสดงไฟล์แผนในเว็บคลังความรู้ สขป.๑ คณะทำงานได้ดำเนินการแล้ว ตามแผนที่ได้นำเสนอ	มี.ค. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๓	สื่อสารแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือจัดการความรู้	- แสดงหลักฐานช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ในคลังความรู้ สขป.๑ ได้แก่ ๑. ไปรษณีย์ Infographic KM ๒. กำหนดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการ ตามแผน KM ของ สขป.๑ ตามความเหมาะสม ๓. สื่อสารกิจกรรม KM ของ สขป.๑ ผ่านทาง Social Network ได้แก่ทาง Website หรือ facebook สขป.๑ หรือ Line Group : KM Team สขป.๑	ต่อเนื่องตลอดปี	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๔	จัดการความรู้ สำนัก/กอง ตามขั้นตอนตัวชี้วัดกลาง ขป.-๒๒ ดังนี้ ๑. CKO ร่วมกับบุคลากร ทบทวน สรุปบทเรียนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ได้ดำเนินการแล้ว) ๒. ร่วมกันหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน หรือ สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ๓. ทดลองใช้กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่/นวัตกรรม เพื่อประเมินผล และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน ๔. สรุปผลการดำเนินการ และบันทึกในคลังความรู้ สขป.๑ ตามรูปแบบที่กำหนด	ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ/สร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างน้อย ๑ รายการ โดยใช้กระบวนการตามข้อกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการออกผลงาน โดยเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงกระบวนการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน” ตามคู่มือฯ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้จริง เพื่อที่จะหาวิธีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด)	พ.ค. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๕	ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day 2021	- แสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในคลังความรู้ ได้แก่ - Info graphic ที่นำมาแสดงในกิจกรรม - ให้มีบุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	มี.ย. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๖	เสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ ๑. ส่งผลงานร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม กรมชลประทาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมบริหาร ๒. ส่งผลงานร่วมโครงการประกวด RID IDEA SEED (แนวคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดคนรุ่นใหม่) (ตัวชี้วัดกลาง ขป.-๒๒)	รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย ๑ ประเภท - คณะทำงานจัดการความรู้ ได้ส่งรายชื่อผลงานร่วมประกวด นวัตกรรมดีเด่นจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำแบบสปริงเกอร์ (ศป.ลำพูน) ๒. การพัฒนาระบบควบคุมบานประตูระบายน้ำขนาดเล็ก (ศป.เชียงใหม่) ที่ website สบค. http://person.rid.go.th/innobol๒๑/	การประกวด มี.ย. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑
๗	กำกับ / ติดตาม / ประเมินผลการจัดการความรู้ - ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง - ร่วมกิจกรรม KM AAR 2021	- สบค.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ระดับสำนัก/กอง ตามข้อกำหนดในตัวชี้วัดกลาง ขป.-๒๐ - ให้จัดทำรายงานผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ของ สขป.๑ - มีรายชื่อผู้แทน สขป.๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรม KM AAR 2021	ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๔	คณะทำงานจัดการความรู้ สขป.๑

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน : - สขป.๑ ได้มีคำสั่งที่ ข๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณاب้านพักข้าราชการ โดยมี ผส.ขป.๑ เป็นประธาน รอง ผส.ขป.๑ เป็นรองประธาน ผอ.ส่วน ฝบท.ขป.๑ ผง.ขป.๑ เป็นกรรมการ และ บส.ขป.๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ มอบ ฝบท.ขป.๑ นัดประชุมกรรมการหลังจากเทศกาลสงกรานต์

- มอบ ผง.ขป.๑ นัดประชุมกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ สขป.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางสาวลินจง คงตั้งมั่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จดยางานการประชุม
