



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๕๖ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ผง.

๑๒๓๔๓

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่น., ผอช.ลาด

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,116.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 44,643.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.43 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,444 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.03 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 567 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.22 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ จำนวน 8,558 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63.66 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,108 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.56 และยกเลิก จำนวน 207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.54 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 74,106.98 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 31,010.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.85 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,808.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,253.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.48 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 66,298.77 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 26,756.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.36 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,461 รายการ เป็นรายการ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,399 รายการ และรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 61 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.04 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขประมาณการ/อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ และให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน เป็นต้น อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.51 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานผูกพันใหม่ และติดปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติ ครม. วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,146 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,065 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.83 และยกเลิก จำนวน 198 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.09 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 154.50 ล้านบาท

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,833.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.88 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 619.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 2,685.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.96 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,557 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 334 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.45 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,218 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.23 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง/แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และติดปัญหาที่ดิน เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,170.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.17 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ได้แก่ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.99 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.45 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 642 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.98 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน งบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 893.70 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 88.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.87 มีจำนวนรายการ 1,637 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 518 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.64 เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอรับผลราคาจากสำนัก/กอง ส่งผลให้ยังไม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 951 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 168 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.26

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 541.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.86 มีจำนวนรายการ 91 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 75 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.42 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.48 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ได้แก่ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณ 5.82 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ มีความขัดแย้งในเรื่องแนวคูน้ำ และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต	ประเภทงาน	ลักษณะงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (บาท)	สถานะดำเนินงาน	หมายเหตุ
		รวม 4 รายการ				154,500,000		
1	สชป. 10	(1.2337) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก กม. 127+714 สถานีสูบน้ำบ้านหม้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการสูบน้ำ และบำรุงรักษาโครงข่าย ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหม้อ จังหวัด สระบุรี - [4873]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ น้ำชลประทาน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	2,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	จังหวัดยังไม่โอนความรับผิดชอบมาให้สำนัก
2	กพท.	(2) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9389]	โครงการบูรณะทางหลวงฝายเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	140,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
3	กพท.	(1) กำลั้วางออกแบบ - [9370]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	12,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างสำนักสำรวจฯ และ สำนัก ออกแบบฯ จัดทำประมาณการ เพื่อขอ จัดสรรงบประมาณ
4	สจค.	(1.185) ซ่อมแซมที่ทำทำการ จำนวน 1 แห่ง สำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [1552]	การจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	แก้ไขประมาณการและแผนจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว กำลังจะดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดข้อมูล

1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

3

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


4

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	94,116.43	44,643.71	47.43	13,444	4	567	8,558	4,108	ยกเลิก 2
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง)	74,106.98	31,010.21	41.85	9,461	4	48	7,146	2065	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,808.21	4,253.69	54.48	-	-	-	-	-	
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	66,298.77	26,756.52	40.36	9,461	4	48	7,147	2,064	รายการ พ.ร.บ. ราชการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง 61
2. งบเงินกู้ในวิสัยปี พ.ศ. 2563	11,209.80	7,833.86	69.88	1,557	-		334	1,218	- ยกเลิก 5 รว - เหลือจ่ายจา สามารถเบิก - นำไปโอนเป - เงินกู้ยืม ล้านบาท
3. งบกลาง ราชการเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563	6,970.95	5,170.45	74.17	698	-	1	52	642	
3.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับภัยพิบัติในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.86	2,325.08	90.79	266			2	264	
3.2 โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายจากคลื่นน้ำตื้นและน้ำหลาก ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.90	390.63	99.17	222				222	
3.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.59	479.80	66.68	79		-	11	67	ยกเลิก 1 รว
3.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.35	880.48	61.73	45		1	9	34	ยกเลิก 1 รว
3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.86	14.98	5.26	8			6	2	
3.6 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563	1,585.39	1,079.48	68.09	78			24	53	ยกเลิก 1 รว
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	893.70	88.19	9.87	1,637		518	951	168	
5. จัดรูปที่ดิน	935.00	541.00	57.86	91		-	75	15	ยกเลิก 1 รว

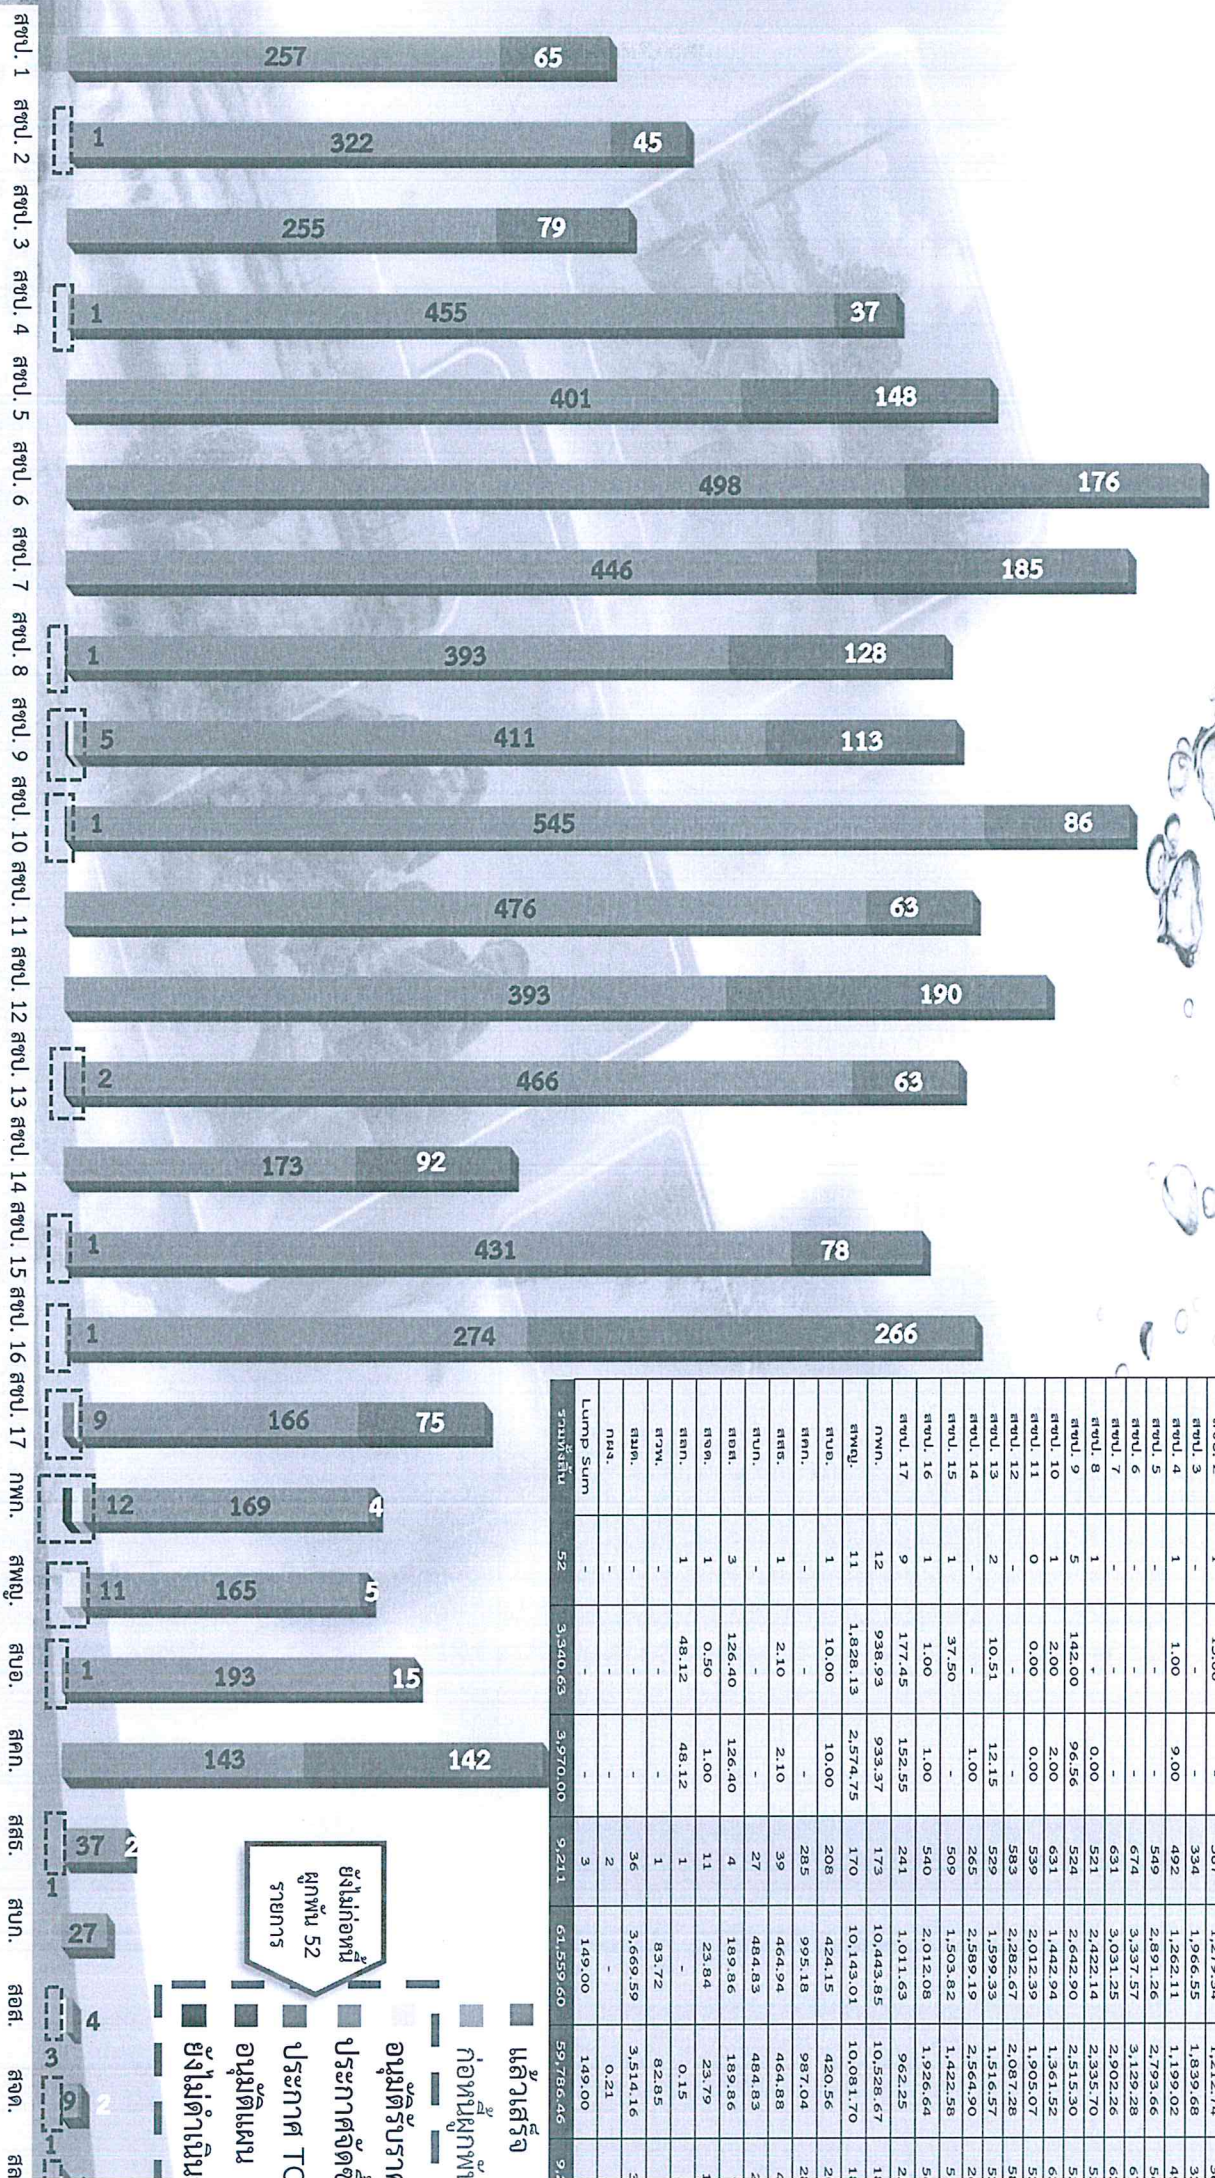

อนันต์ ฐปรางค์
ประกาศิต จิตต์
ประภาศ 52

อนึ่งแผน
ยี่สิบตำเนน

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการ	ทำข้อผูกพัน				
						จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	งบประมาณ		จำนวนรายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
													0-19 %	20-39 %	40-59 %
รวม	64,900.23	63,129.25	25,060.33	39.70	9,263	4	154.50	48	3,188.29	9,211	59,786.45	2,761	967	1,046	
สชป. 1	1,200.46	1,184.32	584.69	49.37	322					322	1,184.32	22	25	41	
สชป. 2	1,294.34	1,227.74	617.19	50.27	368			1	15.00	367	1,212.74	129	57	48	
สชป. 3	1,966.55	1,839.68	885.25	48.12	334					334	1,839.68	88	36	39	
สชป. 4	1,263.11	1,200.02	473.75	39.48	493			1	1.00	492	1,199.02	260	71	47	
สชป. 5	2,891.26	2,793.66	1,391.49	49.81	549					549	2,793.66	133	63	45	
สชป. 6	3,337.57	3,129.28	2,037.92	65.12	674					674	3,129.28	132	44	60	
สชป. 7	3,031.25	2,902.26	1,514.26	52.18	631					631	2,902.26	75	92	85	
สชป. 8	2,422.14	2,340.70	675.30	28.85	522			1	5.00	521	2,335.70	162	31	49	
สชป. 9	2,784.90	2,654.61	787.64	29.67	529			5	139.31	524	2,515.30	83	59	109	
สชป. 10	1,444.94	1,363.52	445.50	32.67	632	1	2.00			631	1,361.52	233	39	84	
สชป. 11	2,012.39	1,905.07	508.41	26.69	539					539	1,905.07	340	29	17	
สชป. 12	2,282.67	2,087.28	880.37	42.18	583					583	2,087.28	140	67	56	
สชป. 13	1,609.84	1,527.08	647.97	42.43	531			2	10.51	529	1,516.57	133	60	72	
สชป. 14	2,589.19	2,564.90	881.65	34.37	265					265	2,564.90	44	43	28	
สชป. 15	1,541.32	1,459.93	339.18	23.23	510			1	37.35	509	1,422.58	205	76	66	
สชป. 16	2,013.08	1,927.64	531.19	27.56	541			1	1.00	540	1,926.64	109	56	48	
สชป. 17	1,189.08	1,139.70	250.28	21.96	250			9	177.45	241	962.25	56	26	44	
สคก.	995.18	987.04	523.30	53.02	285					285	987.04	68	14	20	
สคก.	48.12	48.27	0.15	0.31	2			1	48.12	1	0.15				
สคก.	484.83	484.83	67.32	13.88	27					27	484.83	27			
สคก.	434.15	430.56	103.57	24.05	209			1	10.00	208	420.56	57	21	52	
สคก.	467.04	466.98	224.59	48.09	40			1	2.10	39	464.88	9	3	3	
สพญ.	11,971.14	11,909.83	3,620.20	30.40	181			11	1,828.13	170	10,081.70	120	21	7	
สวพ.	83.72	82.85	8.29		1					1	82.85	1			
สอธ.	316.26	316.26	62.53	19.77	7			3	126.40	4	189.86	4			
กพท.	11,382.77	11,467.59	5,115.07	44.60	185	2	152.00	10	786.93	173	10,528.67	111	28	18	
สผด.	3,669.59	3,514.16	1,854.59	52.77	36					36	3,514.16	17	6	2	
สจต.	24.34	24.29	17.76	73.14	12	1	0.50			11	23.79			6	
กรร.		0.21	0.19	92.42	2					2	0.21				
LUMP SUM	149.00	149.00	10.73	7.20	3					3	149.00	3			

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 198 รายการ งบประมาณ 1,609.81 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเพื่อจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

2. โครงการพัฒนามาตรฐานจากอสังหาริมทรัพย์หรือบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำขึ้นผูกพัน				
						จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวน รายการ	งบประมาณ	ทำขึ้นผูกพัน		
												0-19 %	20-39 %	
รวม	64,900.23	63,129.25	25,060.33	39.70	9,263	4	154.50	48	3,188.29	9,211	59,786.45	2,761	967	1
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	19,617.64	19,264.21	7,932.94	41.18	405			20	1,388.33	385	17,875.89	205	49	
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,140.30	8,212.32	2,493.14	30.36	221			3	160.84	218	8,051.48	132	33	
การจัดทำน้ำชลประทาน	2,178.62	2,148.89	1,156.89	53.84	1,636	1	0.50	4	71.53	1,631	2,076.86	395	199	
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,358.90	1,275.57	587.04	46.02	40			1	15.00	39	1,260.57	23	7	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	3,232.41	3,039.81	1,419.97	46.71	103			1	5.00	102	3,034.81	42	22	
โครงการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่น (ระยะที่ 1)	371.66	371.66	80.97	21.79	8	1	140.00			7	231.66	7		
โครงการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่น (ระยะที่ 2)	355.53	355.53	125.80	35.38	4	1	12.00			3	343.53	2		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	6,899.32	6,606.76	4,311.13	65.25	5,316	1	2.00	4	31.31	5,311	6,573.45	1,326	478	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นและภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,382.98	1,325.80	374.82	28.27	50					50	1,325.80	33	11	
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	2,142.58	2,039.74	812.52	39.83	600			1	37.35	599	2,002.39	166	44	
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,264.69	5,911.65	1,904.12	32.21	392			4	187.00	388	5,724.65	176	69	
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	1,125.27	1,037.75	302.82	29.18	39					39	1,037.75	21	11	
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด	1,987.28	1,804.05	365.33	20.25	183			1	18.00	182	1,786.05	96	17	
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	276.15	279.71	100.06	35.77	117					117	279.71	43	1	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำชลประทานให้มีความอุดมสมบูรณ์	160.63	160.55	2.13	1.33	9			4	82.65	5	77.90	5		
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาระบบชลประทานและสิ่งแวดล้อม	651.60	595.72	126.51	21.24	16					16	595.72	8	8	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงก์และเขื่อนลำนางรอง จังหวัดชัยภูมิ	1,045.99	895.68	479.35	53.52	10					10	895.68	4	3	
โครงการบรรเทาภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้งจากพายุไต้ฝุ่น จังหวัดน่าน	1,231.35	1,657.58	390.24	23.54	15			2	603.32	13	1,054.26	11		
โครงการพัฒนาฝายกั้นน้ำ - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	410.92	366.10	157.92	43.14	7					7	366.10	5	1	
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	284.71	168.75	36.76	21.78	4					4	168.75	4		
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน (ระยะที่ 2) จังหวัดอุดรธานี	331.98	204.44	54.80	26.80	6			1	120.00	5	84.44	2		
โครงการประจักษ์ศิลปาคม (ระยะที่ 1) จังหวัดอุดรธานี	266.59	185.12	6.91	3.73	5					5	185.12	4	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคัน จังหวัดเลย	349.82	349.82	169.56	48.47	4					4	349.82	3		
โครงการคลองระบายน้ำห้วยหลวง จังหวัดน่าน	2,159.25	2,159.25	887.23	41.09	12					12	2,159.25	8	3	
โครงการพัฒนาฝายกั้นน้ำห้วยหลวง จังหวัดน่าน	640.47	640.47	134.47	21.00	13			1	88.00	12	552.47	10	2	
โครงการประจักษ์ศิลปาคม (ระยะที่ 2) จังหวัดน่าน	213.40	213.40	80.67	37.80	5					5	213.40	2	2	
โครงการประจักษ์ศิลปาคม (ระยะที่ 3) จังหวัดน่าน	80.20	80.20	58.41	72.82	6					6	80.20	2	3	
โครงการเชื่อมถนนฝายกั้นน้ำห้วยหลวง จังหวัดน่าน	526.44	562.31	310.85	55.28	10					10	562.31	5		
โครงการปรับปรุงคลองฝายกั้นน้ำห้วยหลวง จังหวัดน่าน	412.62	412.62	12.74	3.09	5			1	379.97	4	32.65	3		
โครงการอ่างเก็บน้ำบ่อน้อยเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	123.62	123.62	10.83	8.76	5					5	123.62	4	1	
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น จังหวัดปทุมธานี	421.76	421.76	59.16	14.03	10					10	421.76	9	1	
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	255.60	258.42	114.26	44.22	7					7	258.42	5	1	


หมายเหตุ : 1. จำนวน 198 รายการ งบประมาณ 1,609.81 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัดอุดรธานี เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

2. โครงการสนับสนุนจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563

2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

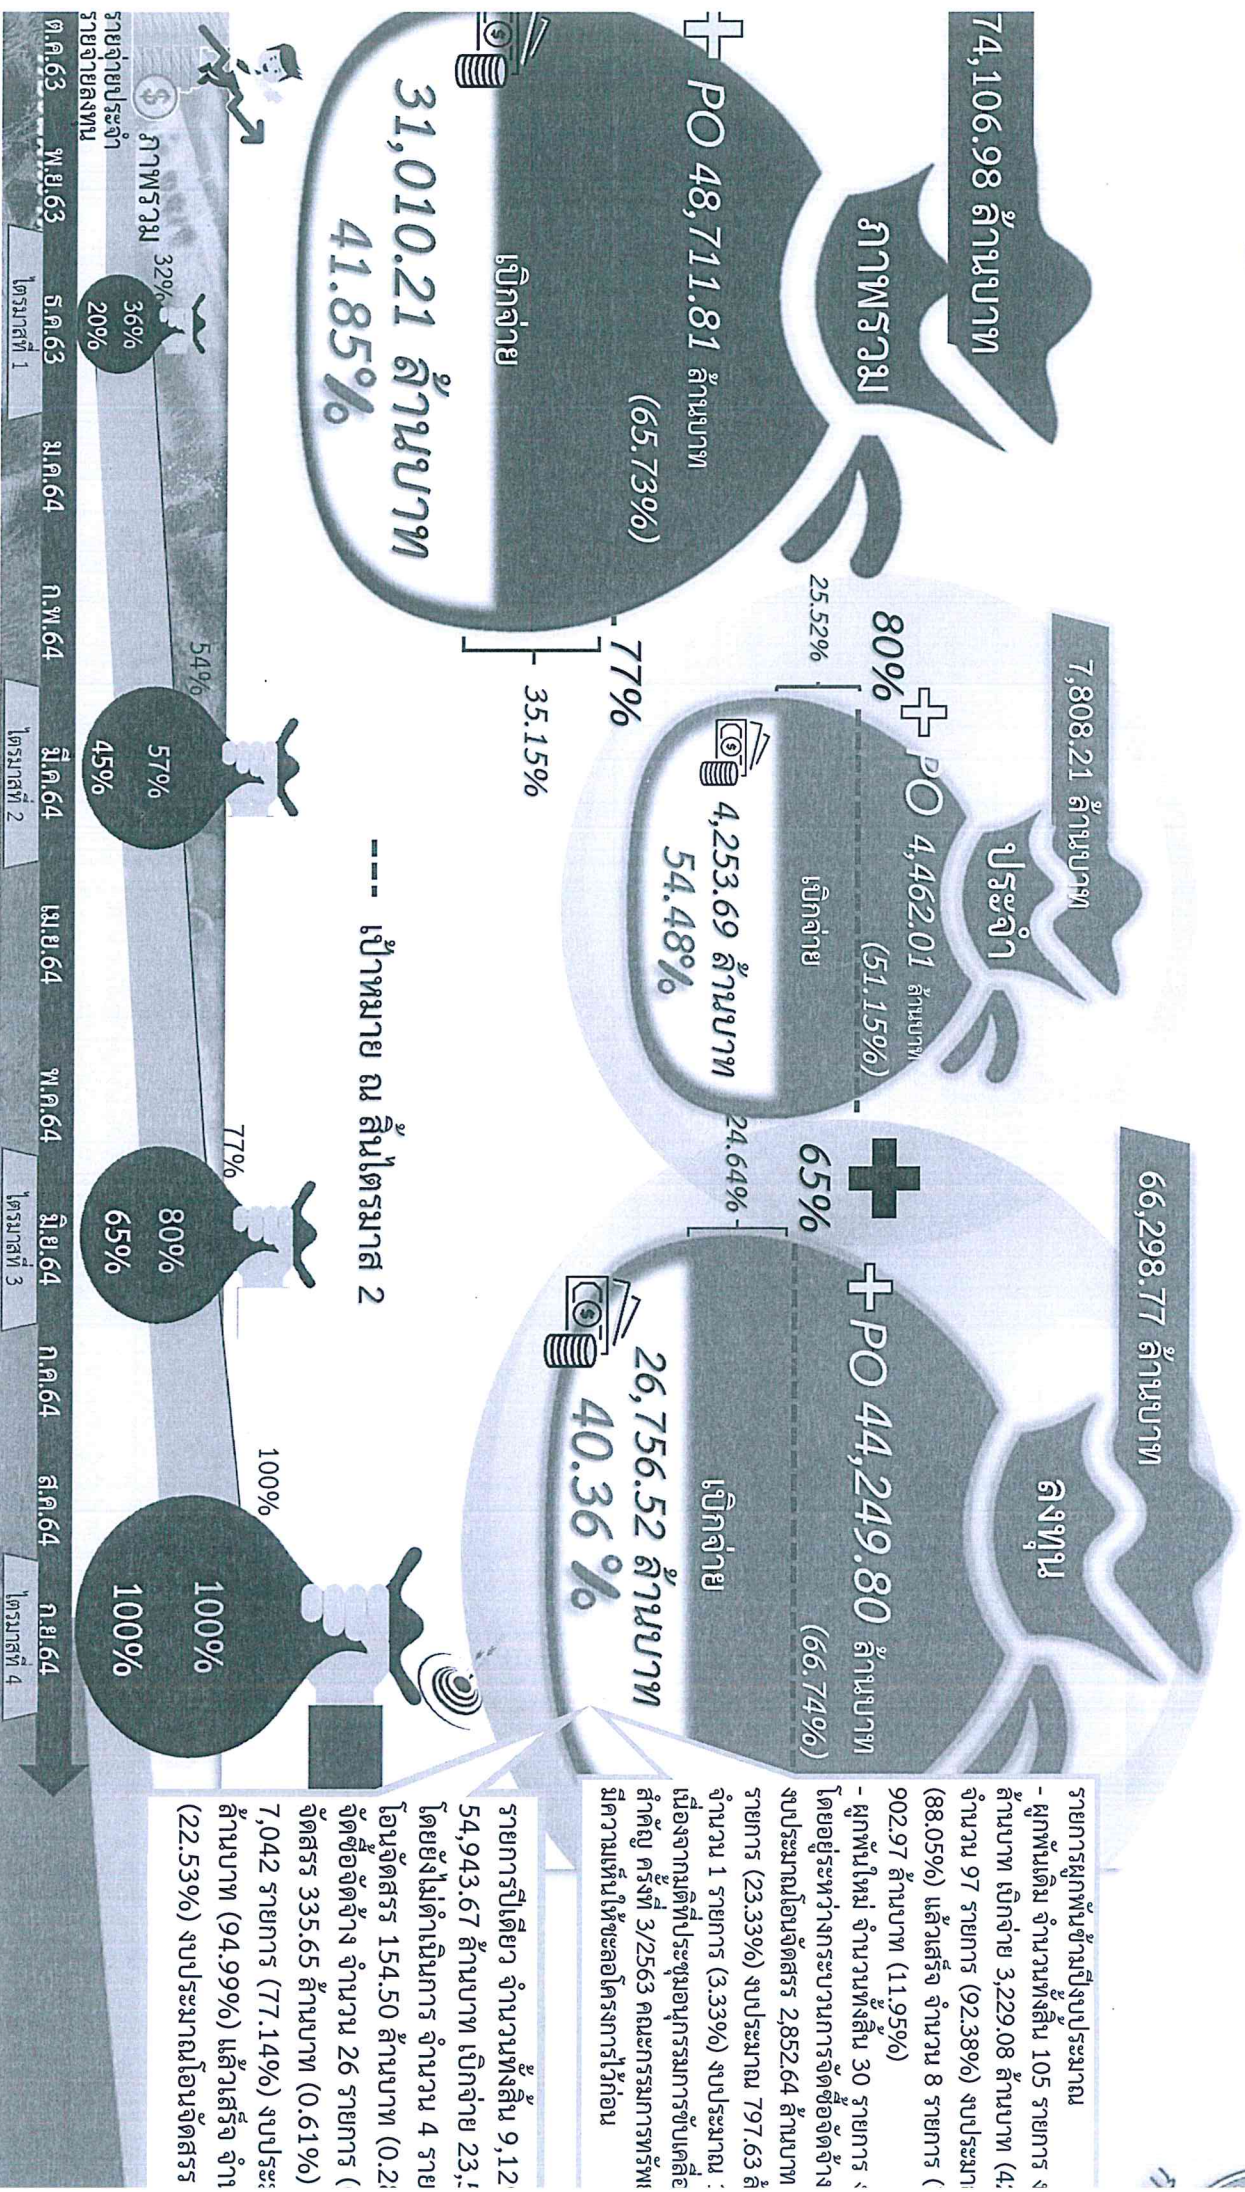


รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 105 รายการ
- จำนวน 97 รายการ (92.38%) งบประมาณ (88.05%) แล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ (902.97 ล้านบาท (11.95%))
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ
- โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณโอนจัดสรร 2,852.64 ล้านบาท
รายการ (23.33%) งบประมาณ 797.63 ล้านบาท
จำนวน 1 รายการ (3.33%) งบประมาณ :
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
สำคัญ ครั้งที่ 3/2563 คณะกรรมการบริหาร
มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,12
54,943.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 23,1
โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 ราย
โอนจัดสรร 154.50 ล้านบาท (0.2)
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 รายการ (335.65 ล้านบาท (0.61%))
จัดสรร 335.65 ล้านบาท (0.61%)
7,042 รายการ (77.14%) งบประมาณ (94.99%) แล้วเสร็จ จำนวน 22.53%) งบประมาณโอนจัดสรร

2.6


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

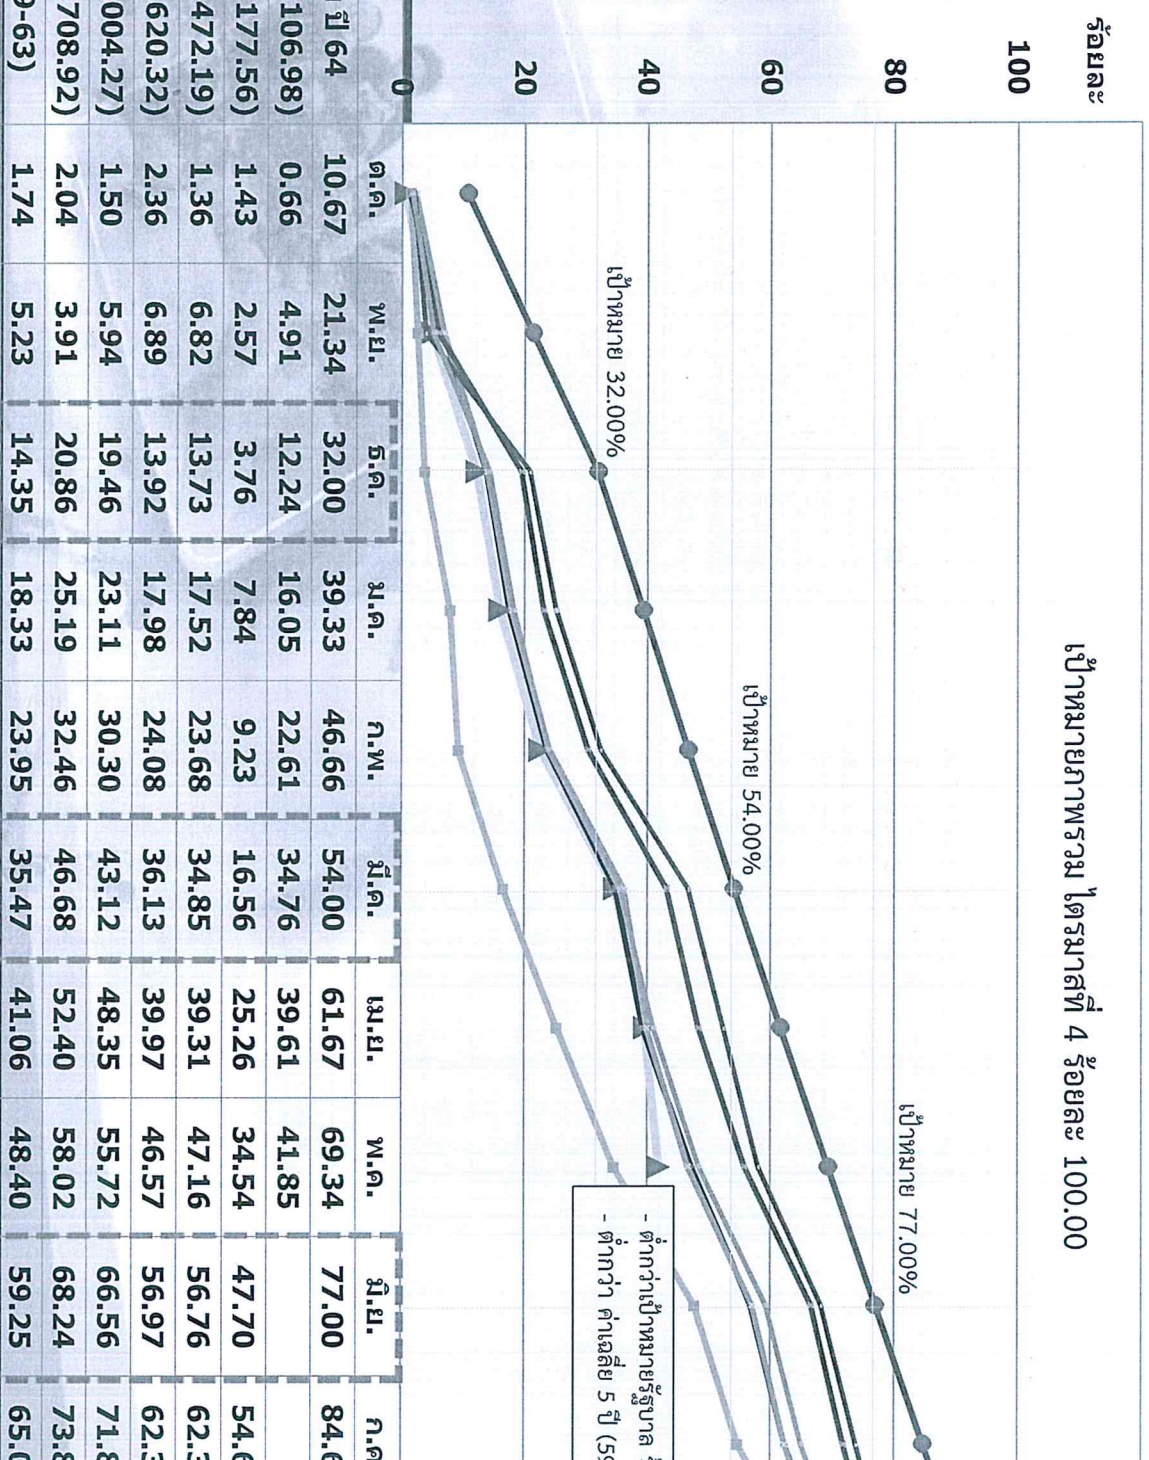




2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

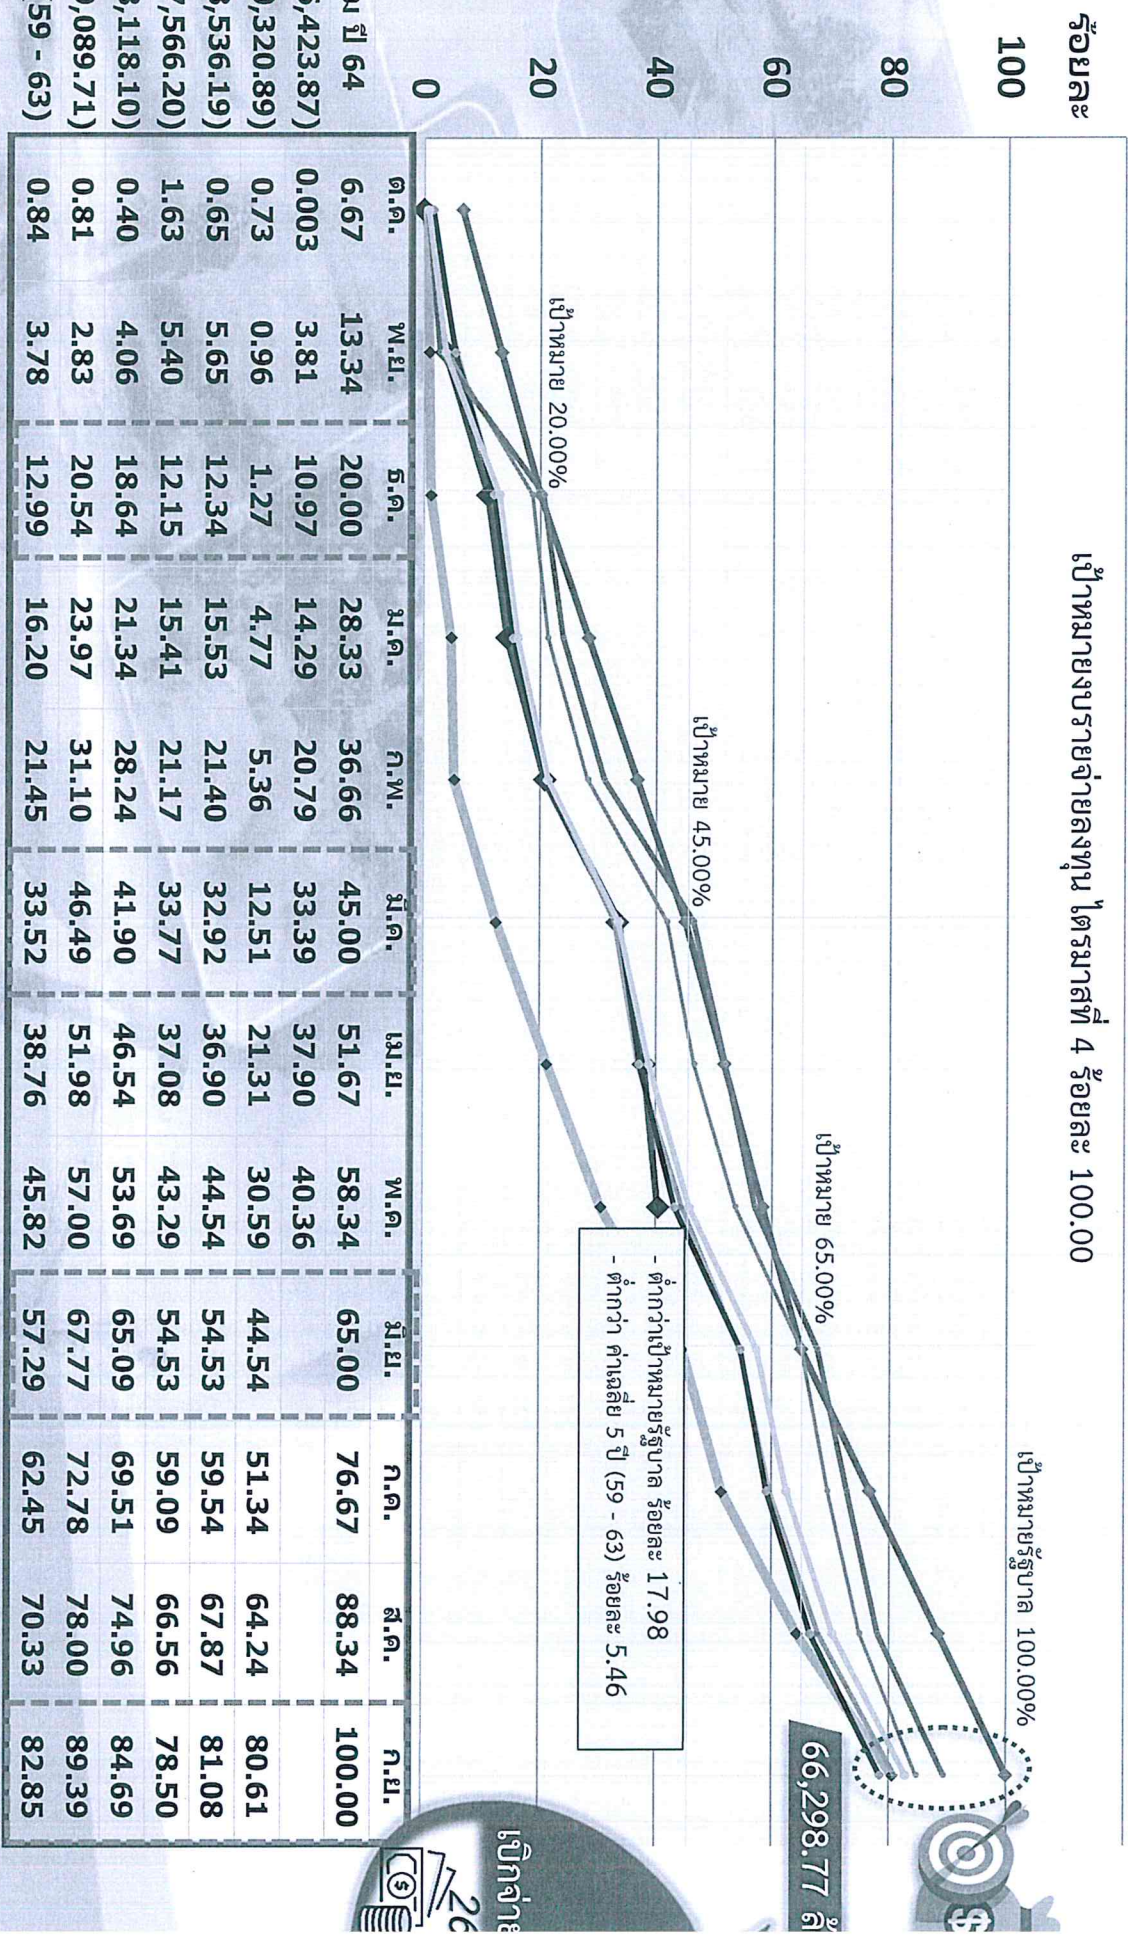

100

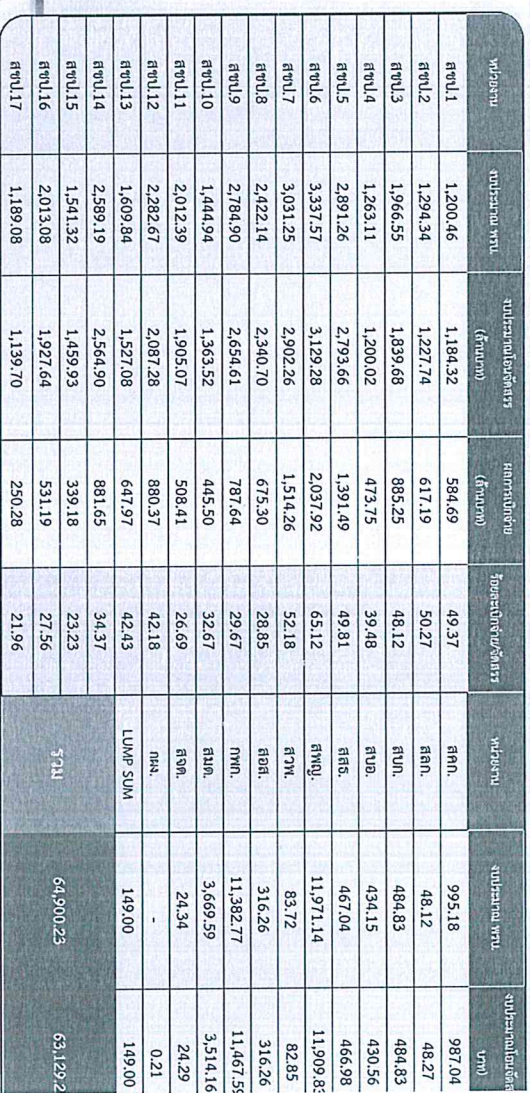

หมายเหตุ : 1. จบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 64,900.23 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิกจำนวน 198 รายการ จบประมาณ 1,609.81 ล้านบาท

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 62 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 156.59 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)
	<u>ระดับกระทรวง</u> (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)					
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	72,318.93	29,714.85	41.09	67,047.94	15,898.31
2	กระทรวงคมนาคม	177,396.95	63,665.20	35.89	163,542.53	29,568.36
3	กระทรวงมหาดไทย	80,605.81	17,647.27	21.89	80,105.59	8,990.25
	<u>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</u>					
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,114.51	1,318.18	62.34	2,346.04	701.41
2	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,159.16	502.97	43.39	1,265.74	200.88
3	กรมชลประทาน	66,298.77	26,756.52	40.36	60,109.20	14,380.66
	<u>ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)</u>					
1	กรมทางหลวง	120,129.57	48,588.16	40.45	108,032.86	23,790.05
2	กรมชลประทาน	66,298.77	26,756.52	40.36	60,109.20	14,380.66
3	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,512.17	9,623.57	34.98	24,893.33	7,385.01
4	กรมทางหลวงชนบท	47,151.29	12,993.71	27.56	45,881.20	4,788.48

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 34.75%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (47 หน่วยงาน) เฉลี่ย 33.62%

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563



สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

1,218 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

334 รายการ

ยกเลิกรายการ

5 รายการ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564

ล้านบาท

ณ	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	51
---	--------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	-------	----

ล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38					
---	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

ต่าง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43					
------	---	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--	--	--	--	--

ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	------

กองแผนงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

7,833.86 ล้านบาท 69.88 %

เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ งานยกเลิก และยังไม่สามารถเบิกได้ทัน

619.73 ล้านบาท 5.53 %

นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

70.27 ล้านบาท 0.63 %

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

2,685.94 ล้านบาท


23.96 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่โครงการอุทยานแห่งชาติ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

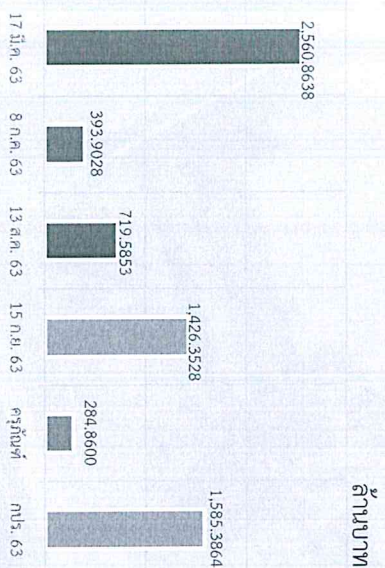รวม 6 ครั้ง 6,970.9511 ล้านบาท
จำนวน 698 รายการเบิกจ่าย 5,170.4526 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 74.17

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 52 รายการ

การก่อสร้าง

งานแล้วเสร็จ 642 รายการ

ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกหักตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย 2563 มาดำเนินการแล้ว และราชมารุณพื้นที่
คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

มติ ครม.
17 มี.ค.มติ ครม.
8 ก.ค.มติ ครม.
13 ส.ค.มติ ครม.
15 ก.ย.มติ ครม.
15 ก.ย.
ครุภัณฑ์

266 รายการ

222 รายการ

79 รายการ

45 รายการ

8 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท

393.9028 ล้านบาท

719.5853 ล้านบาท

1,426.3528 ล้านบาท

284.8600 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,325.0775 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.79เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.17เบิกจ่าย 479.8002 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 66.68เบิกจ่าย 880.4790 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61.73เบิกจ่าย 14,9800 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.26

89.20 %

100 %

91.05 %

66.58 %

45.00 %

• แล้วเสร็จ

• แล้วเสร็จ

• แล้วเสร็จ

• แล้วเสร็จ

• แล้วเสร็จ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ

264 รายการ

222 รายการ

67 รายการ

34 รายการ

2 รายการ

พื้นที่สะพาน 1,300 ไร่

ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่สะพาน 1,350 ไร่

ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโชชน์ 378,145 ไร่

พื้นที่รับประโชชน์ 38,250 ไร่

พื้นที่รับประโชชน์ 41,620 ไร่

พื้นที่รับประโชชน์ 65,738 ไร่

พื้นที่รับประโชชน์ 20,470 ไร่

รับประโชชน์ 79,624 ครัวเรือน

รับประโชชน์ 6,5657 ครัวเรือน

รับประโชชน์ 7,520 ครัวเรือน

รับประโชชน์ 20,470 ครัวเรือน

รับประโชชน์ 20 ปี

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยน้ำ
ในฤดูฝนปี 2563โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยน้ำ
ปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ
เสียหายจากดินถล่มน้ำตื้นเขินและน้ำไม่โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและ
น้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ธรรมชาติ
ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2564โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยและบรรเทา
อุทกภัย


(ข้อมูลจากแบบติดตาม Cen P

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Ce

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

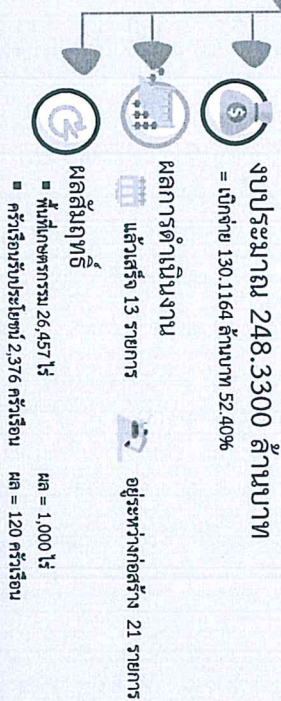

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

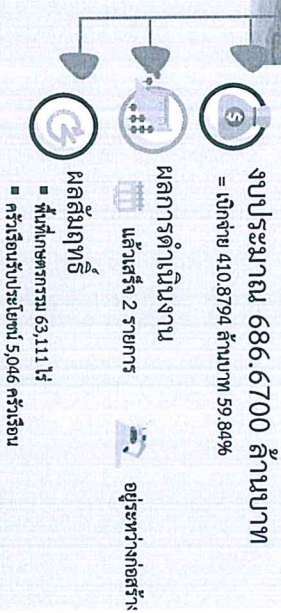

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน



ภาพรวม




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ 893.6955 ล้านบาท
งบจัดสรร 298.1035 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 88.1912 ล้านบาท 29.58%

ผลการดำเนินงาน : 1,637 รายการ

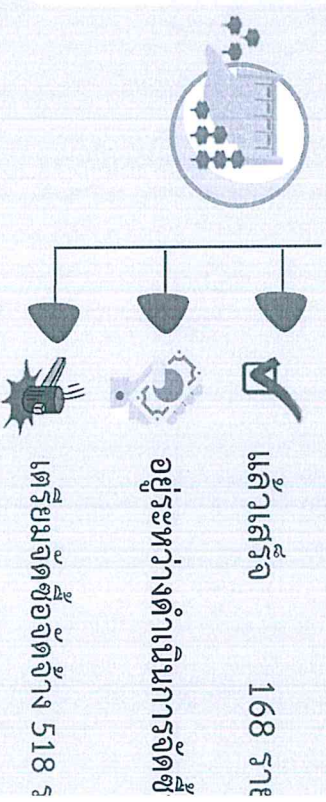

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

