



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๒๙๖/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.ผง.

๗๗ 3393

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผดป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๙ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

- ทบท

- เรียน ผอ.ส่วนฯ ออช. ทด

เพื่อไปลงทบท.

(นายวิเศษ พงษ์สม)

ผส.บอ

๙ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๙ ๗

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 97,418.86 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 34,201.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.11 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 12,632 รายการ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 430 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.40 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,595 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.05 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 3,540 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.02 และยกเลิก จำนวน 67 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 68,242.56 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 17,237.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.26 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 8,133.36 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,426.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.42 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 60,109.20 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 12,811.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.31 มีจำนวนรายการ 8,217 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 243 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.95 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,678 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.44 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 238 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.90 และยกเลิก จำนวน 58 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.71

2. เงินกู้ยืมเงิน/เงินกู้ยืมเงิน/เงินกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2555 – 2562 งบประมาณ จำนวน 13,878.55 ล้านบาท เบิกจ่ายและสลาย PO แล้ว จำนวน 7,865.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.67 (เบิกจ่าย 7,047.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.78 และสลาย PO แล้ว 817.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.89) มีจำนวนรายการ 1,391 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 334 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.01 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,055 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.85 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2559 – 2563 งบประมาณ จำนวน 13,664.86 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,444.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 มีจำนวนรายการ 1,618 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 87 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 233 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.40 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,291 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.79 และยกเลิก จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 697.89 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 328.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.11 มีจำนวนรายการ 1,328 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.53 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 272 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.48 และดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 956 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.99

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 143.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.38 มีจำนวนรายการ 78 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตุ้มเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือในปี/กันยายน พ.ศ. 2555 – 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563




1. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ		
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.)	97,418.86	34,201.63	35.11	12,632	430	8,595	3,540	ยกเลิก 67 รายการ	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	68,242.56	17,237.52	25.26	8,217	243	7,678	238		
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	8,133.36	4,426.51	54.42	-	-	-	-		
2. งบเงินกู้ยืม/เงินกู้ยืม/เงินยืม พ.ศ. 2555 - 2562	60,109.20	12,811.01	21.31	8,217	243	7,678	238		
2.1 ปี พ.ศ. 2555	13,878.55	7,047.22	50.78	1,391	-	334	1,055		
2.2 ปี พ.ศ. 2557	104.12	65.59	63.00	4	-	2	1		
2.3 ปี พ.ศ. 2558	61.20	1.28	2.09	5	-	4	1		
2.4 ปี พ.ศ. 2559	160.01	2.21	1.38	8	-	4	4		
2.5 ปี พ.ศ. 2560	139.37	22.98	16.48	12	-	6	5		
2.6 ปี พ.ศ. 2561	579.91	299.62	51.67	49	-	23	26		
2.7 ปี พ.ศ. 2562	2,391.97	708.77	29.63	180	-	90	90		
3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	10,441.97	5,946.77	56.95	1,133	-	205	928		
3.1 งบกลางปี 2563	13,664.86	9,444.31	69.11	1,618	87	233	1,291		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	2,880.44	134.16	4.66	300	87	213			
- งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง	319.57	63.36	19.83	34	20	14	-		
3.2 งบกลางปี 2562	2,560.86	70.80	2.76	266	67	199	-		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	1,824.26	1,542.04	84.53	134	-	14	119		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,635.46	1,373.34	83.97	70	-	14	56		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ	188.80	168.69	89.35	64	-	-	63		
3.3 งบกลางปี 2561 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	1,613.03	1,346.56	83.48	76	-	2	74		
3.4 งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล	1,590.54	1,407.02	88.46	58	-	3	54		
3.5 งบกลางปี 2559 รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางวิสัยทัศน์ เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	5,756.59	5,014.53	87.11	1,050	-	1	1,044		
4. เงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค	697.89	328.74	47.11	1,328	100	272	956		
5. จัดรูปที่ดิน	935.00	143.84	15.38	78	-	78	-		

จบลงทัน

2.1 สรุปผลการอภิปรายกลุ่มงาน ข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2563 ข้อมูลจาก ระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

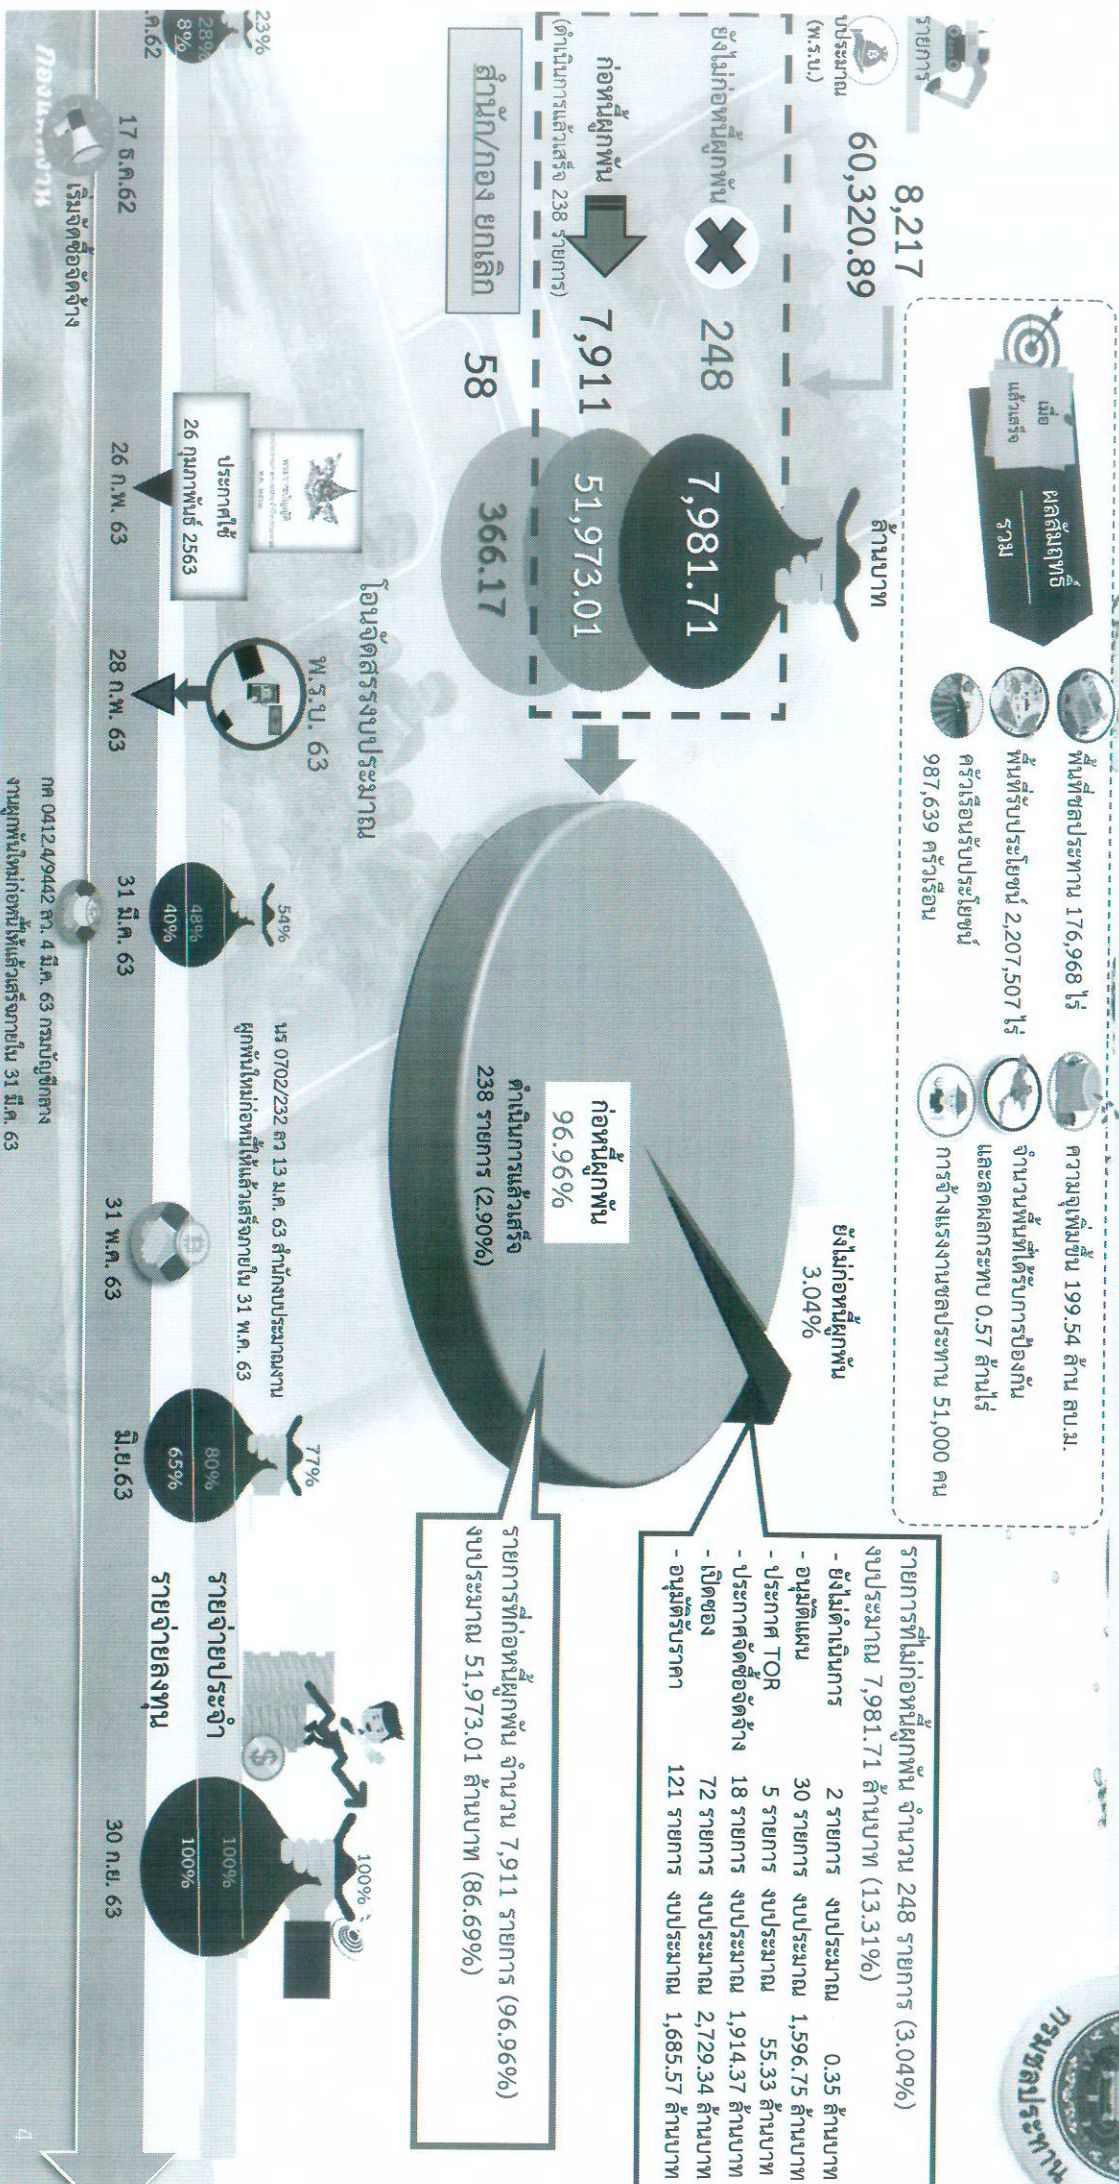


2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพรวม

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
3.04%

ก่อหนี้ผูกพัน
96.96%

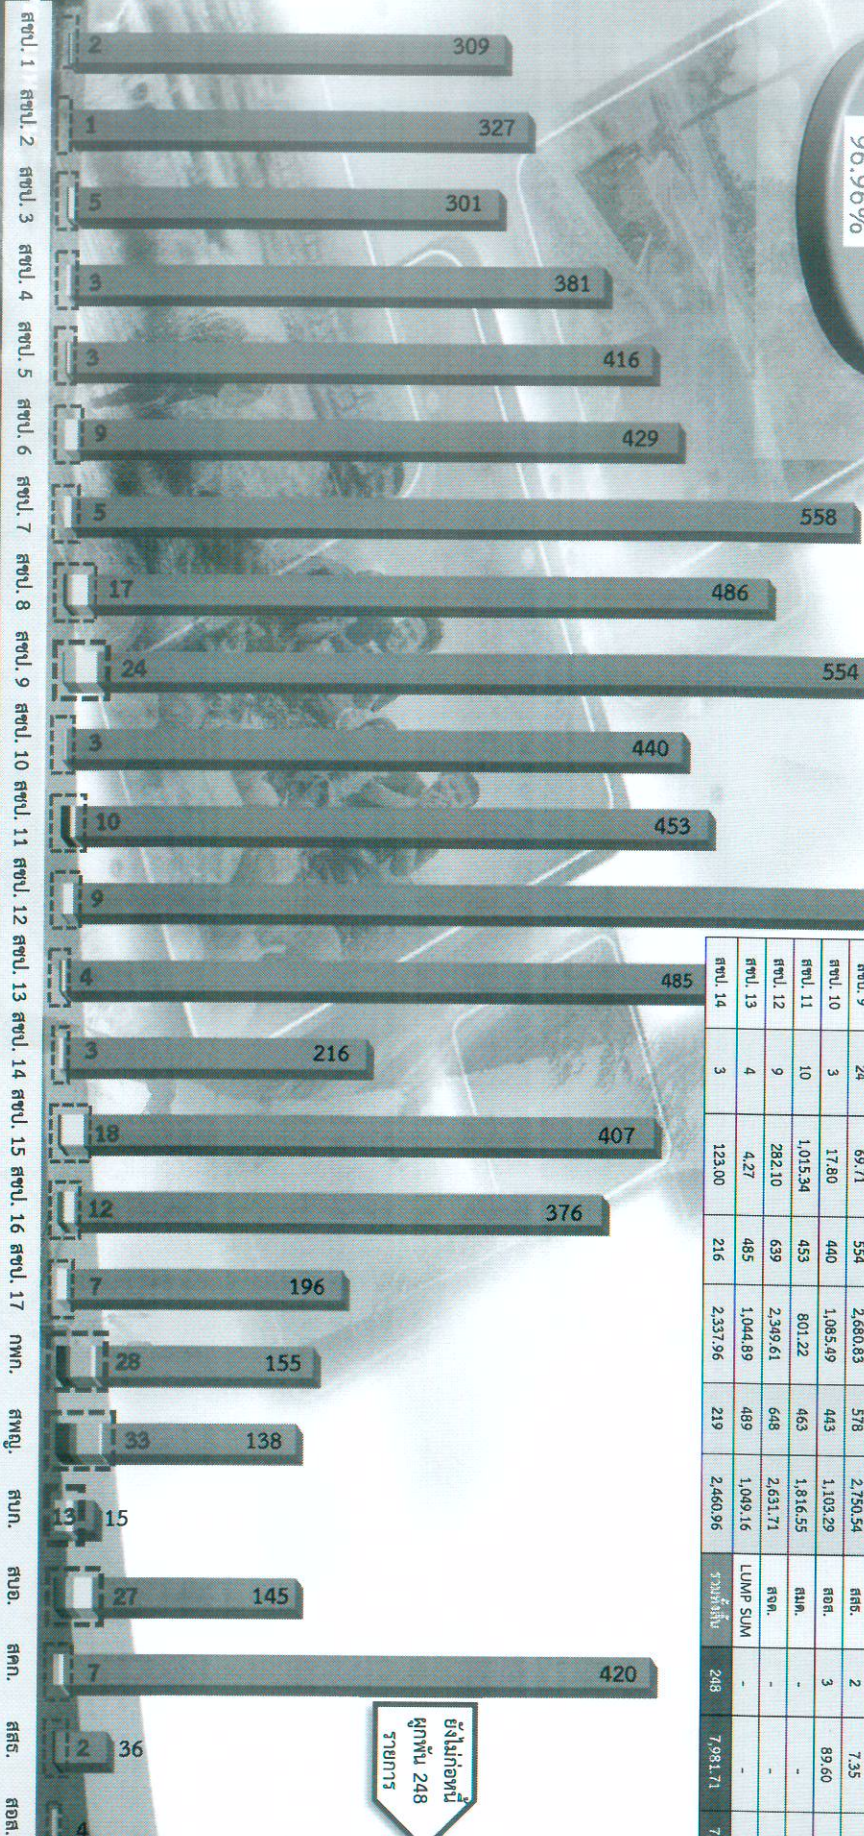

ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 248
รายการ

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 7,911 รายการ
- อนุมัติงบราคา 121 รายการ
- เปิดซอง 72 รายการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ
- ประกาศ TOR 3 รายการ
- อนุมัติแผน 30 รายการ
- ยังไม่ดำเนินการ 2 รายการ

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 เม.ย. 63
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เม.ย.

สำนัก/กอง	งบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำสัญญาแล้ว						
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)				
รวม	59,954.72	56,298.46	12,538.12	22.27	8,159	2	0.35	246	7,981.36	7,911	51,973.01	4,353	1,489	822	572	437	238			
สชบ. 1	1,162.97	1,079.44	178.18	16.51	311	-	-	2	69.84	309	1,093.13	188	84	18	13	5	1			
สชบ. 2	1,194.20	1,179.74	196.41	16.65	328	-	-	1	1.00	327	1,193.20	161	79	58	27	2	-			
สชบ. 3	1,122.89	1,026.96	149.65	14.57	308	-	-	5	62.38	303	1,060.52	168	54	32	23	23	3			
สชบ. 4	1,414.77	1,383.81	116.60	8.43	384	-	-	3	88.66	381	1,326.11	295	33	44	6	3	-			
สชบ. 5	2,259.70	1,715.82	316.15	18.43	419	-	-	3	184.95	416	2,074.75	221	65	65	51	7	7			
สชบ. 6	3,316.51	3,162.23	604.90	19.13	438	-	-	9	220.64	429	3,095.86	112	92	47	85	75	18			
สชบ. 7	2,809.33	2,894.24	559.81	19.34	563	-	-	5	28.54	558	2,780.79	231	148	79	55	30	15			
สชบ. 8	2,812.51	2,663.98	267.98	10.06	503	-	-	17	153.29	486	2,659.22	278	101	57	30	9	11			
สชบ. 9	2,750.54	2,698.41	411.47	15.25	578	-	-	24	69.71	554	2,680.83	298	112	54	23	60	7			
สชบ. 10	1,103.29	1,071.66	163.51	15.26	443	-	-	3	17.80	440	1,085.49	260	59	34	49	37	1			
สชบ. 11	1,816.49	1,819.73	140.06	7.70	462	1	0.05	9	1,015.29	452	801.15	283	86	13	30	37	3			
สชบ. 12	2,631.71	2,721.63	342.55	12.59	648	-	-	9	282.10	639	2,349.61	404	122	62	31	12	8			
สชบ. 13	1,049.23	1,010.08	220.66	21.85	490	-	-	4	4.27	486	1,044.96	225	129	56	36	16	24			
สชบ. 14	2,460.96	2,376.55	215.03	9.05	219	-	-	3	123.00	216	2,337.96	96	50	19	14	29	8			
สชบ. 15	1,341.46	1,223.53	96.64	7.90	425	-	-	18	316.82	407	1,024.64	299	48	33	19	5	3			
สชบ. 16	1,839.79	1,630.37	125.86	7.72	388	-	-	12	113.64	376	1,726.15	167	78	51	22	24	34			
สชบ. 17	912.79	857.75	57.36	6.69	203	-	-	7	81.40	196	831.39	133	32	10	7	8	6			
สทอ.	452.33	443.31	60.36	13.62	28	-	-	13	85.00	15	367.33	15	-	-	-	-	-			
สทอ.	460.63	460.30	33.91	7.37	172	-	-	27	245.17	145	215.46	55	38	32	12	5	3			
กพท.	12,221.35	11,533.88	3,208.20	27.82	183	1	0.30	27	1,594.81	155	10,626.23	124	14	7	3	-	7			
สพญ.	9,063.31	7,697.48	1,983.28	25.77	171	-	-	33	3,101.06	138	5,962.25	95	15	8	2	7	11			
สสธ.	475.27	449.41	68.72	15.29	38	-	-	2	7.35	36	467.92	21	-	8	5	-	2			
สธด.	149.93	127.53	26.74	20.97	7	-	-	3	89.60	4	60.33	4	-	-	-	-	-			
สธค.	3,626.50	3,626.50	2,621.06	72.28	20	-	-	-	-	20	3,626.50	3	3	4	3	3	4			
สคก.	1,356.19	1,294.05	366.51	28.32	425	-	-	7	25.05	418	1,331.14	214	47	30	26	39	62			
สจต.	1.06	1.06	0.84	78.93	2	-	-	-	-	2	1.06	-	-	1	-	1	-			
Lump Sum	149.00	149.00	5.67	3.80	3	-	-	-	-	3	149.00	3	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ดำเนินการ 2 รายการ งบ 0.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าควบคุมงานทั้งสิ้น ได้แก่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนนทบุรี งบ 0.05 ล้านบาท ของ สชบ. 1 และค่าควบคุมงานจ้างเหมางานการจัดทำงานชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ งบ 0.30 ล้านบาท ของ กพท.)



งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ


ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 เม.ย. 63
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 เม.ย.

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)					สัญญาจ้าง			สัญญาจ้าง			สัญญาจ้าง			การใช้จ่ายเงิน						
	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา
รวม	59,954.72	56,298.46	12,538.12	22.27	8,159	2	0.35	246	7,981.36	7,911	51,973.01	4,353	1,489	822	572	437	238				
ผลิตภัณฑ์/โครงการ	2,066.03	2,030.65	561.69	27.66	1,580	-	-	21	85.14	1,559	1,980.89	883	348	109	70	64	85				
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	1,940.39	1,818.62	296.41	16.30	457	-	-	6	145.84	451	1,794.55	229	95	58	45	15	9				
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	2,119.81	2,021.07	26.91	1.33	205	-	-	17	360.52	188	1,759.29	163	16	6	3	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	6,080.97	5,979.75	1,643.85	27.49	4,559	2	0.35	78	220.20	4,479	5,860.43	2,179	874	586	430	297	113				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	1,248.07	1,213.39	201.04	16.58	29	-	-	1	70.00	28	1,178.07	21	7	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	66.50	66.50	0.18	0.27	3	-	-	-	-	3	66.50	3	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	624.79	624.79	92.02	14.73	9	-	-	-	-	9	624.79	9	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	1,402.22	1,377.54	63.06	4.58	23	-	-	3	176.00	20	1,226.22	19	1	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	3,022.91	2,677.45	520.08	19.42	98	-	-	5	128.00	93	2,894.91	60	27	4	-	-	2				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	1,066.52	991.81	77.97	7.86	25	-	-	-	-	25	1,066.52	23	2	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	537.64	507.75	315.50	62.14	11	-	-	-	-	11	537.64	5	1	2	-	-	3				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	407.68	296.12	161.31	54.47	7	-	-	2	41.00	5	366.68	2	1	1	1	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	437.29	387.68	206.31	53.22	10	-	-	1	196.00	9	241.29	3	3	2	-	1	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	223.81	210.31	42.96	20.43	7	-	-	2	55.00	5	168.81	4	-	-	-	1	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	265.74	265.74	162.48	61.14	10	-	-	-	-	10	265.74	8	-	-	1	-	1				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	737.92	420.60	359.03	85.36	9	-	-	-	-	9	737.92	3	1	1	-	2	2				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	193.48	193.48	18.96	9.80	5	-	-	2	50.50	3	142.98	2	-	1	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	42.76	123.12	0.01	0.01	2	-	-	-	-	2	42.76	2	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	6,074.39	5,889.86	359.34	6.10	344	-	-	20	1,159.95	324	4,914.43	256	46	18	-	4	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	18,377.16	17,271.40	5,379.12	31.14	393	-	-	40	1,629.87	353	16,747.29	270	40	20	11	5	10				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	8,056.79	7,536.68	1,109.01	14.71	210	-	-	28	1,288.00	182	6,768.79	141	22	5	1	1	9				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	158.32	144.08	3.43	21.81	109	-	-	-	-	109	158.32	38	2	9	10	47	3				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	103.59	101.79	6.25	6.14	6	-	-	-	-	6	103.59	5	1	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	134.92	134.92	77.97	57.79	4	-	-	-	-	4	134.92	2	1	-	-	-	1				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	1,056.64	947.46	118.65	12.52	12	-	-	6	400.80	6	655.84	6	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	1,866.23	1,582.07	257.33	16.27	8	-	-	2	1,136.64	6	729.59	5	1	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	630.00	630.00	427.98	67.93	2	-	-	-	-	2	630.00	2	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	108.40	88.40	0.19	0.22	5	-	-	3	97.00	2	11.40	2	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	286.90	238.45	0.12	0.05	5	-	-	3	274.51	2	12.39	2	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	387.60	298.76	0.20	0.07	6	-	-	4	381.38	2	6.22	2	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	159.24	159.24	20.77	13.05	5	-	-	1	15.00	4	144.24	4	-	-	-	-	-				
โครงการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตร	70.00	70.00	-	-	1	-	-	1	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-				




2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

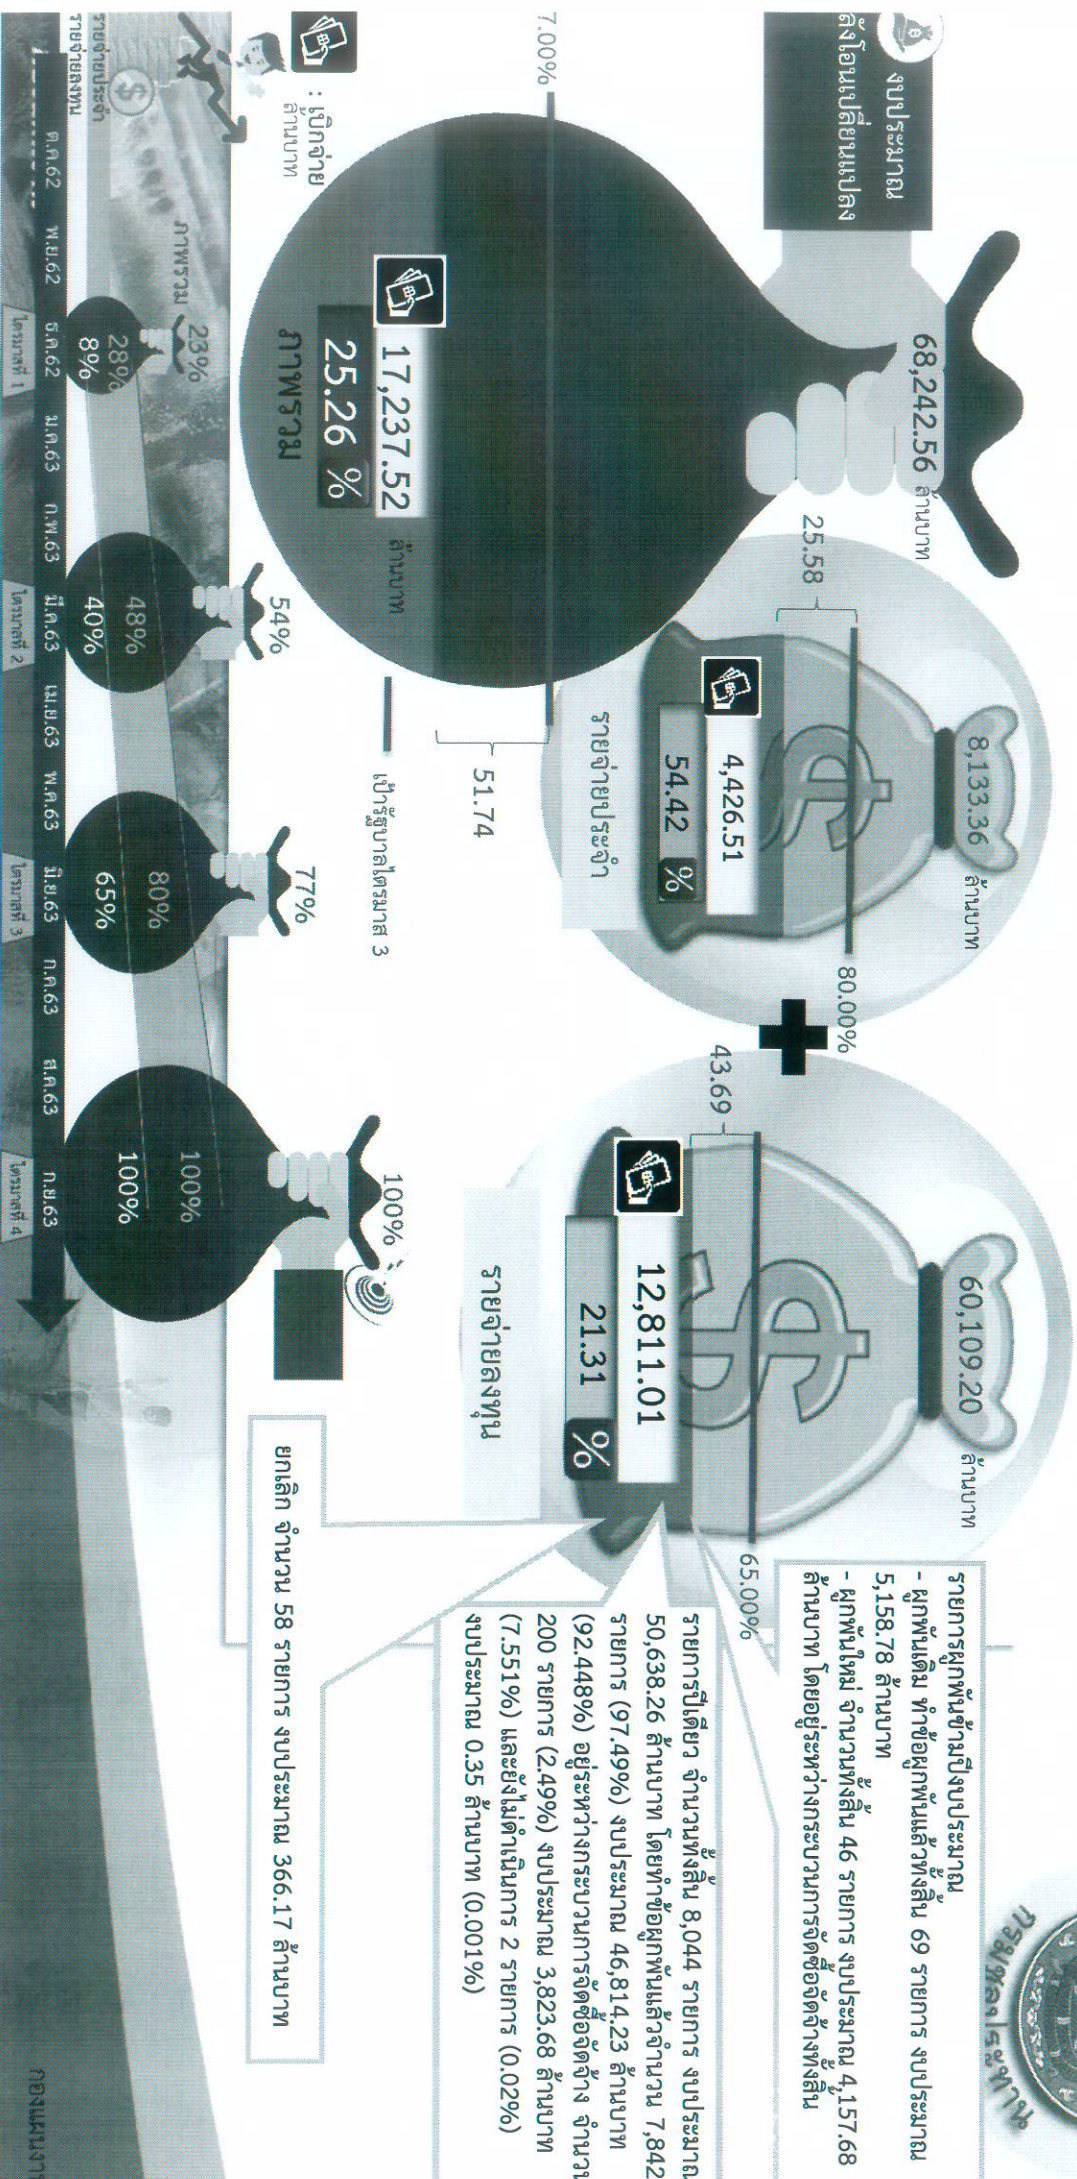

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

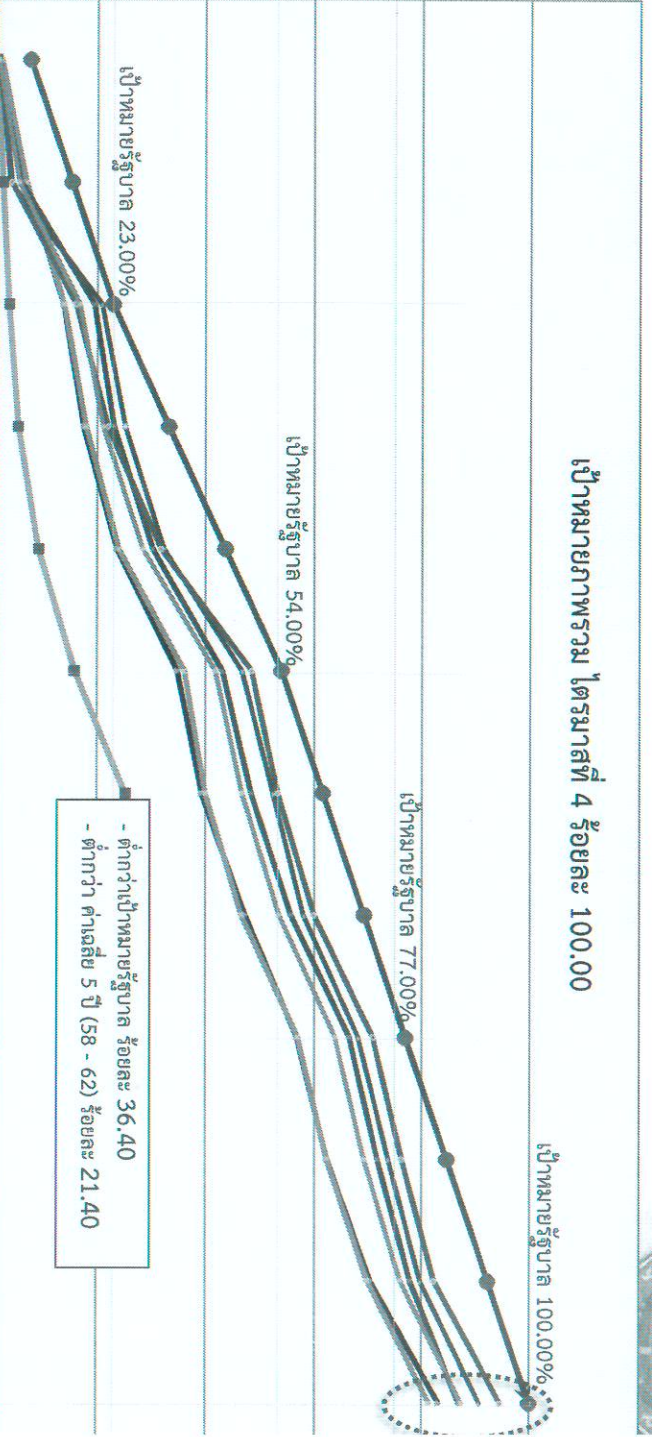


	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายรัฐบาลปี 63	7.66	15.33	23.00	33.33	43.66	54.00	61.66	69.33	77.00	84.66	92.33	100.00
ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	5.50	9.23	15.88	25.26					
ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
เฉลี่ย 5 ปี (58-62)	1.80	5.55	16.81	21.17	28.48	41.84	46.66	53.50	63.91	69.32	76.04	87.37

-ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 36.40
-ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี (58 - 62) ร้อยละ 21.40

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

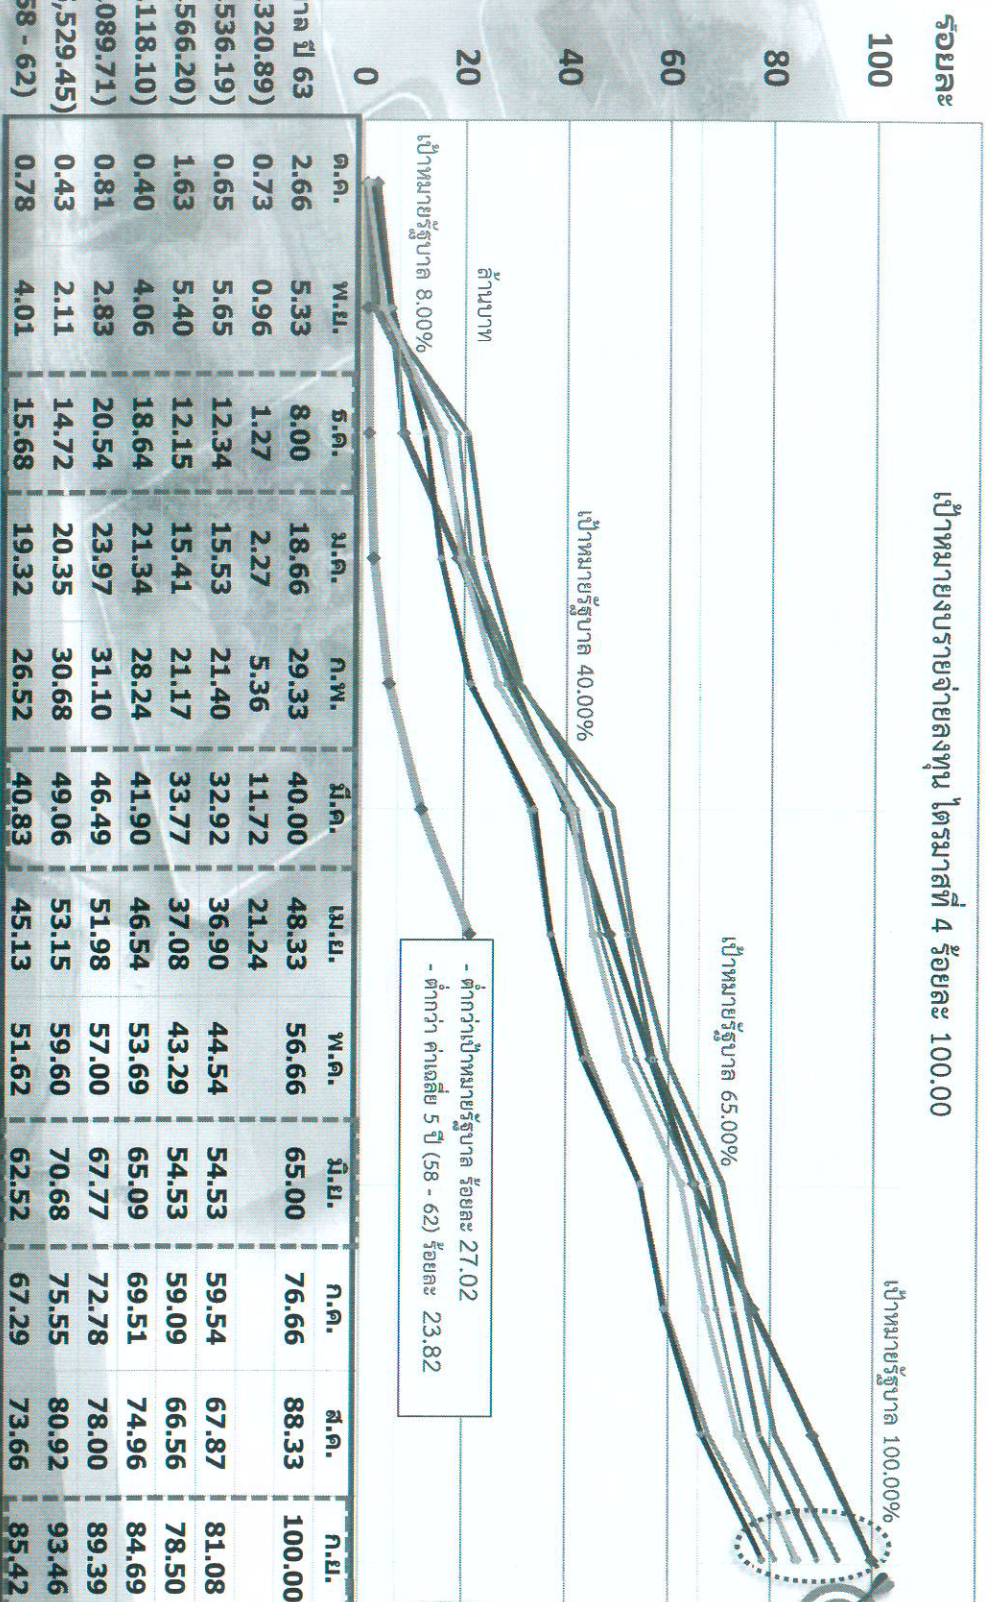

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หน่วยงาน	งบประมาท งบ	งบประมาทโดยสังเขป (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร	หน่วยงาน	งบประมาท งบ	งบประมาทโดยสังเขป (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/จัดสรร
สขบ.1	1,162.97	1,079.44	178.18	16.51	สขบ.15	1,341.46	1,223.53	96.64	7.90
สขบ.2	1,194.20	1,179.74	196.41	16.65	สขบ.16	1,839.79	1,630.37	125.86	7.72
สขบ.3	1,122.89	1,026.96	149.65	14.57	สขบ.17	912.79	857.75	57.36	6.69
สขบ.4	1,414.77	1,383.81	116.60	8.43	สขบ.	452.33	443.31	60.36	13.62
สขบ.5	2,259.70	1,715.82	316.15	18.43	สขบ.	460.30	460.30	33.91	7.37
สขบ.6	3,316.51	3,162.23	604.90	19.13	กพท.	12,221.35	11,533.88	3,208.20	27.82
สขบ.7	2,809.33	2,894.24	559.81	19.34	สพท.	9,063.31	7,697.48	1,983.28	25.77
สขบ.8	2,812.51	2,663.98	267.98	10.06	สขบ.	475.27	449.41	68.72	15.29
สขบ.9	2,750.54	2,698.41	411.47	15.25	สขบ.	149.93	127.53	26.74	20.97
สขบ.10	1,103.29	1,071.66	163.51	15.26	สขบ.	3,626.50	3,626.50	2,621.06	72.28
สขบ.11	1,816.49	1,819.73	140.06	7.70	สขบ.	1,356.19	1,294.05	366.51	28.32
สขบ.12	2,631.71	2,721.63	342.55	12.59	สขบ.	1.06	1.06	0.84	78.93
สขบ.13	1,049.23	1,010.08	220.66	21.85	สขบ.	149.00	149.00	5.67	3.80
สขบ.14	2,460.96	2,376.55	215.03	9.05	รวม	59,954.72	56,298.46	12,538.12	22.27

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 58 รายการ งบประมาณ 366.17 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

เป้าหมายรัฐบาลเดือนเม.ย. 63 : 48.33 %
เฉลี่ย 5 ปี (58-62) : 45.13 %

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	67,055.94	14,141.32	21.09	65,634.73	24,659.15	35.62	-14.53
2	กระทรวงคมนาคม	163,555.32	27,894.71	17.06	167,014.22	69,496.81	39.65	-22.59
3	กระทรวงมหาดไทย	80,108.43	8,544.87	10.67	66,658.55	14,352.59	19.30	-8.63
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,354.04	551.30	23.42	2,981.16	1,403.18	47.07	-23.65
2	กรมชลประทาน	60,109.20	12,811.01	21.31	58,195.50	21,474.76	36.90	-15.66
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,265.74	200.88	15.87	1,411.19	241.64	17.12	-1.25
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,902.83	7,231.05	29.04	24,489.16	7,333.73	29.95	-0.91
2	กรมชลประทาน	60,109.20	12,811.01	21.31	58,195.50	21,474.76	36.90	-15.66
3	กรมทางหลวง	108,045.65	22,636.41	20.95	111,312.78	44,306.48	39.80	-18.85
4	กรมทางหลวงชนบท	45,881.20	4,341.10	9.46	45,070.70	22,807.87	50.60	-41.14

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563


2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 20.79%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 19.14%

3. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ/กู้ยืม พ.ศ. 2555 – 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งบประมาณเงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ/กู้ยืม ปี 2555 – 2562 ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือ

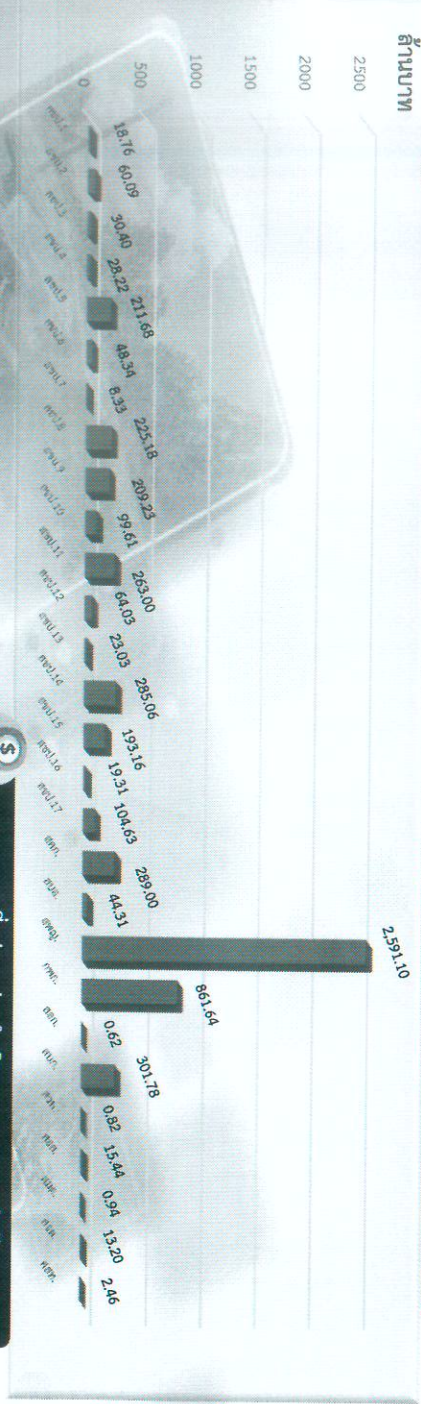

5 สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ พ.ศ. 2555-2562 (ล้านบาท)			
		งบเงินกู้	เงินกู้	ร้อยละ	พัก/ไม่ยอม ยอดเงินกู้
รวมทั้งสิ้น	1,391	13,878.5527	7,047.2208	50.78	817.9818 6,013.3501
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,055	5,650.0406	5,220.3309	92.40	429.5096 -
ยกเลิกรายการ	2	61.9599	-	-	61.9599 -
อยู่ระหว่างดำเนินการ	334	8,166.5523	1,826.8899	22.37	326.5123 6,013.3501

5 รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (แยกรายสำนัก)

สำนัก/กอง	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือ (ล้านบาท)	สำนัก/กอง	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยอดเงินกู้ยืมคงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	334	6,013.3501	สบ.15	11	193.1580
สบ.1	4	18.7585	สบ.16	4	19.3122
สบ.2	8	60.0861	สบ.17	16	104.6295
สบ.3	6	30.4011	สบ.18	1	289.0000
สบ.4	6	28.2162	สบ.19	8	44.3101
สบ.5	16	211.6752	สบ.20	56	2,591.0992
สบ.6	9	48.3436	สบ.21	36	861.6372
สบ.7	4	8.3285	สบ.22	1	0.6167
สบ.8	28	225.1816	สบ.23	45	301.7786
สบ.9	14	209.2318	สบ.24	1	0.8239
สบ.10	9	99.6110	สบ.25	1	15.4409
สบ.11	12	262.9995	สบ.26	6	0.9360
สบ.12	3	64.0262	สบ.27	2	13.2027
สบ.13	4	23.0269	สบ.28	2	2.4571
สบ.14	21	285.0618			

งบประมาณเงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ/กู้ยืม ปี 2555 – 2562

เงินกู้ใหม่ต่อปี/ปีขยาย พ.ศ. 2555 - 2562 (ล้านบาท)							
ปี พ.ศ.	จำนวนรายการ	งบเงินกู้	เงินจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยาย	ยอดเงินกู้	
		ยอด (30ก.ม.62)	เงินกู้		(กลาง PO)	คงเหลือ	
รวมทั้งสิ้น	1,391	13,878.5527	7,047.2208	50.78	817.9818	6,013.3501	
2555	4	104.1163	65.5924	63.00	19.7435	18.7804	
2557	5	61.1966	1.2816	2.09	-	59.9150	
2558	8	160.0131	2.2131	1.38	0.1101	157.6898	
2559	12	139.3739	22.9756	16.48	42.2902	74.1080	
2560	49	579.9094	299.6200	51.67	2.6831	277.6063	
2561	180	2,391.9749	708.7700	29.63	62.6885	1,620.5164	
2562	1,133	10,441.9684	5,946.7681	56.95	690.4663	3,804.7340	

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ทันไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
2. มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
3. ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และบางรายการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีงบประมาณคงเหลือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอสลาย PO

กองแผนงาน



4. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ จบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 เม.ย. 63)

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง จำนวน 5 ประเภท 7 โครงการ โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 รายละเอียด ดังนี้

ล้านบาท

5,756.59					
1,590.54	1,613.03	1,824.26	2,880.44		

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,664.86 ล้านบาท

ผลเบิกจ่ายรวม 9,444.31 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวมปี พ.ศ. 2559 - 2563

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 87 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 233 รายการ

งานแล้วเสร็จ 1,291 รายการ

ยกเลิก 7 รายการ

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,618 รายการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ผลการดำเนินงานรวมปี พ.ศ. 2559 - 2563 รายละเอียดดังนี้


1	เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางปฏิรูปเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน และอุทกภัย (ระยะเวลา ค.ย. 59 - ก.ย. 63)	จำนวน 1,050 รายการ	งบประมาณ	เงิน งบ. 5,765,5918 ล้านบาท (87.11%)
	ลักษณะการดำเนินงาน : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางปฏิรูปในการสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	จำนวน 1,050 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	
		งานแล้วเสร็จ 1,044 รายการ	ยกเลิก 5 รายการ	
2	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล (ระยะเวลา ก.ย. 60 - มิ.ย. 63)	จำนวน 58 รายการ	งบประมาณ	เงิน งบ. 1,590,443 ล้านบาท (88.46%)
	ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างระบบผันน้ำ และค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดิน	จำนวน 58 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ	
		งานแล้วเสร็จ 54 รายการ	ยกเลิก 1 รายการ	
3	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2561 (ระยะเวลา ค.ย. 60 - ก.ย. 63)	จำนวน 76 รายการ	งบประมาณ	เงิน งบ. 1,613,0343 ล้านบาท (83.48%)
	ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน 76 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 74 รายการ	
		งานแล้วเสร็จ 2 รายการ		
4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2562 (ระยะเวลา ค.ย. 60 - ก.ย. 63)	จำนวน 70 รายการ	งบประมาณ	เงิน งบ. 1,635,4584 ล้านบาท (83.05%)
	ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน 70 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ	
		งานแล้วเสร็จ 56 รายการ		
5	โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ	จำนวน 64 รายการ	งบประมาณ	เงิน งบ. 188,7996 ล้านบาท (89.35%)
	ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน 64 รายการ	งานแล้วเสร็จ 63 รายการ	
		ยกเลิก 1 รายการ		

4. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานงบกลาง ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้



- งบกลางปี 2563 ลักษณะการดำเนินงาน 2 โครงการ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2563
 2. งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง



จำนวน = 300 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	213 รายการ
งานแล้วเสร็จ	- รายการ

กรมชลประทาน

6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2563 (ระยะเวลา ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : การก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการติดตั้งโรงพยาบาล จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การริยศาสตร์และวัฒนธรรม และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



จำนวน = 34 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	14 รายการ
งานแล้วเสร็จ	- รายการ

7 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง (ระยะเวลา มี.ค. 63 - มิ.ย. 63)


เมื่อ เป้าหมาย แล้วเสร็จ

พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 3,781.45 ไร่

ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม.

ลักษณะการดำเนินงาน : กักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน โดยแบ่งเป็น

แก้มลิง	83 รายการ	เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ	116 รายการ
ขุดลอกคลอง	36 รายการ	ฝาย/อาคารบังคับน้ำ	31 รายการ



จำนวน = 266 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	199 รายการ
งานแล้วเสร็จ	- รายการ

จ้างแรงงานชลประทาน



แผนการจ้างแรงงาน	7,300 คน	จังหวัดที่มีการจ้างแรงงาน มากที่สุด 3 ลำดับ คือ
ผลจ้างแรงงานแล้ว	834 คน	1 อุบลราชธานี = 433 คน
เบิกจ่าย 6,074 ล้านบาท		2 เชียงใหม่ = 178 คน
		3 ร้อยเอ็ด = 110 คน

5. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 เม.ย. 63)

					
ประเภท		การเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	
รายละเอียด					
รวมทั้งสิ้น		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	697.89	328.74	47.11	1,328	100
				272	956
เป็นเงินทุนสนับสนุนงานของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไข ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำอย่างมีศักยภาพ ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
เป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียงในไร่นาปรับระดับพื้นที่ดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางแผนจัดรูปที่ดินใหม่					
งานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	935.00	143.84	15.38	78	-
				78	-

