



เลขที่เอกสารในระบบ E..... ๑๕๐๐๖/๒๑๗/๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ศชส./๑๕๐๐๖ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔๓๓๘๕๔

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

— ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.กท

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ.

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,116.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 48,290.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.31 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,444 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 501 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.73 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ จำนวน 7,923 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.93 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,809 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.77 และยกเลิก จำนวน 208 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.55 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 74,106.98 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 34,411.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.44 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,823.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,826.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.69 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 66,283.77 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 29,585.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,461 รายการ เป็นรายการ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,399 รายการ และรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 62 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.03 เนื่องจากมีการแก้ไขประมาณการ/อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ อยู่ระหว่างถ่ายโอนสถานีสูบน้ำมายังกรม และให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานผูกพันใหม่ และติดปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เป็นป่ารก้างไม่มีเจ้าของ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาตแล้ว อยู่ระหว่างรออนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ เป็นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,510 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,710 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.64 และยกเลิก จำนวน 199 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.10 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 154.00 ล้านบาท

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,030.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.63 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 654.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 2,454.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,557 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 308 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.78 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,244 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.90 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 0.32 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง/แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และติดปัญหาที่ดิน เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,171.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.19 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ได้แก่ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.99 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 648 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.84 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน งบประมาณถูกตัดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 893.70 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 95.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.71 มีจำนวนรายการ 1,637 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 461 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.16 เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอรับผลราคาจากสำนัก/กอง ส่งผลให้ยังไม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 988 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 188 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.49

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 580.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.13 มีจำนวนรายการ 91 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 71 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.02 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.88 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ได้แก่ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณ 5.82 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ มีความขัดแย้งในเรื่องแนวคูน้ำ และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	สำนัก/กอง	รายการงาน	ผลผลิต	ประเภทงาน	ลักษณะงาน	งบประมาณโอนจัดสรร (บาท)	สถานะดำเนินงาน	หมายเหตุ
		รวม 4 รายการ						
1	สพป. 10	(1.2337) ขอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.127+714 สถานีสูบน้ำบ้านหม้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโรงราง ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี - [4873]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	154,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติและถ่ายโอนจากจังหวัดมาใหักรม เนื่องจากสถานีสูบน้ำใช้งบกลุ่มจังหวัดในการก่อสร้าง
2	กพท.	(2) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [9389]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	140,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
3	กพท.	(1) ค่าสำรวจออกแบบ - [9370]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	12,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างสำนักสำรวจฯ และ สำนักออกแบบฯ จัดทำประมาณการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)			หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อแล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น	94,116.43	48,290.30	51.31	13,444	3	501	4,809
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง)	74,106.98	34,411.75	46.44	9,461	3	39	2,710
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,823.21	4,826.22	61.69				
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	66,283.77	29,585.53	44.63	9,461	3	39	2,710
2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563	11,209.80	8,030.04	71.63	1,557			1,244
3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563	6,970.95	5,171.85	74.19	698	1		648
3.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยและน้ำท่วมในฤดูฝนปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.86	2,325.08	90.79	266			264
3.2 โครงการเพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.90	390.63	99.17	222			222
3.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.59	480.88	66.83	79		9	69
3.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.35	880.79	61.75	45	1	9	34
3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.86	14.98	5.26	8		6	2
3.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นปร.) ประจำปี 2563	1,585.39	1,079.48	68.09	78		20	57
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	893.70	95.72	10.71	1,637		461	188
5. จัดรูปที่ดิน	935.00	580.94	62.13	91		71	19






2

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

งบลงทุน

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการก่อหนี้ผูกพัน



ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ (0.03%)

งบประมาณโอนจัดสรร 154.00 ล้านบาท (0.25%)

- โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ 1 รายการ
- อยู่ระหว่างโอนสแตนด์บายน้ำมายังกรม 1 รายการ
- แก้ไขประมาณการ/อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ 1 รายการ

อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 39 รายการ (0.42%)

งบประมาณโอนจัดสรร 2,806.36 ล้านบาท (4.50%)

อนุมัติแผน 8 รายการ งบประมาณ 60.44 ล้านบาท


ประกาศ TOR 1 รายการ งบประมาณ 10.00 ล้านบาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ งบประมาณ 45.00 ล้านบาท

อนุมัติรับราคา 28 รายการ งบประมาณ 2,690.92 ล้านบาท

ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,220 รายการ (99.55%)

งบประมาณโอนจัดสรร 59,382.26 ล้านบาท (95.25%)

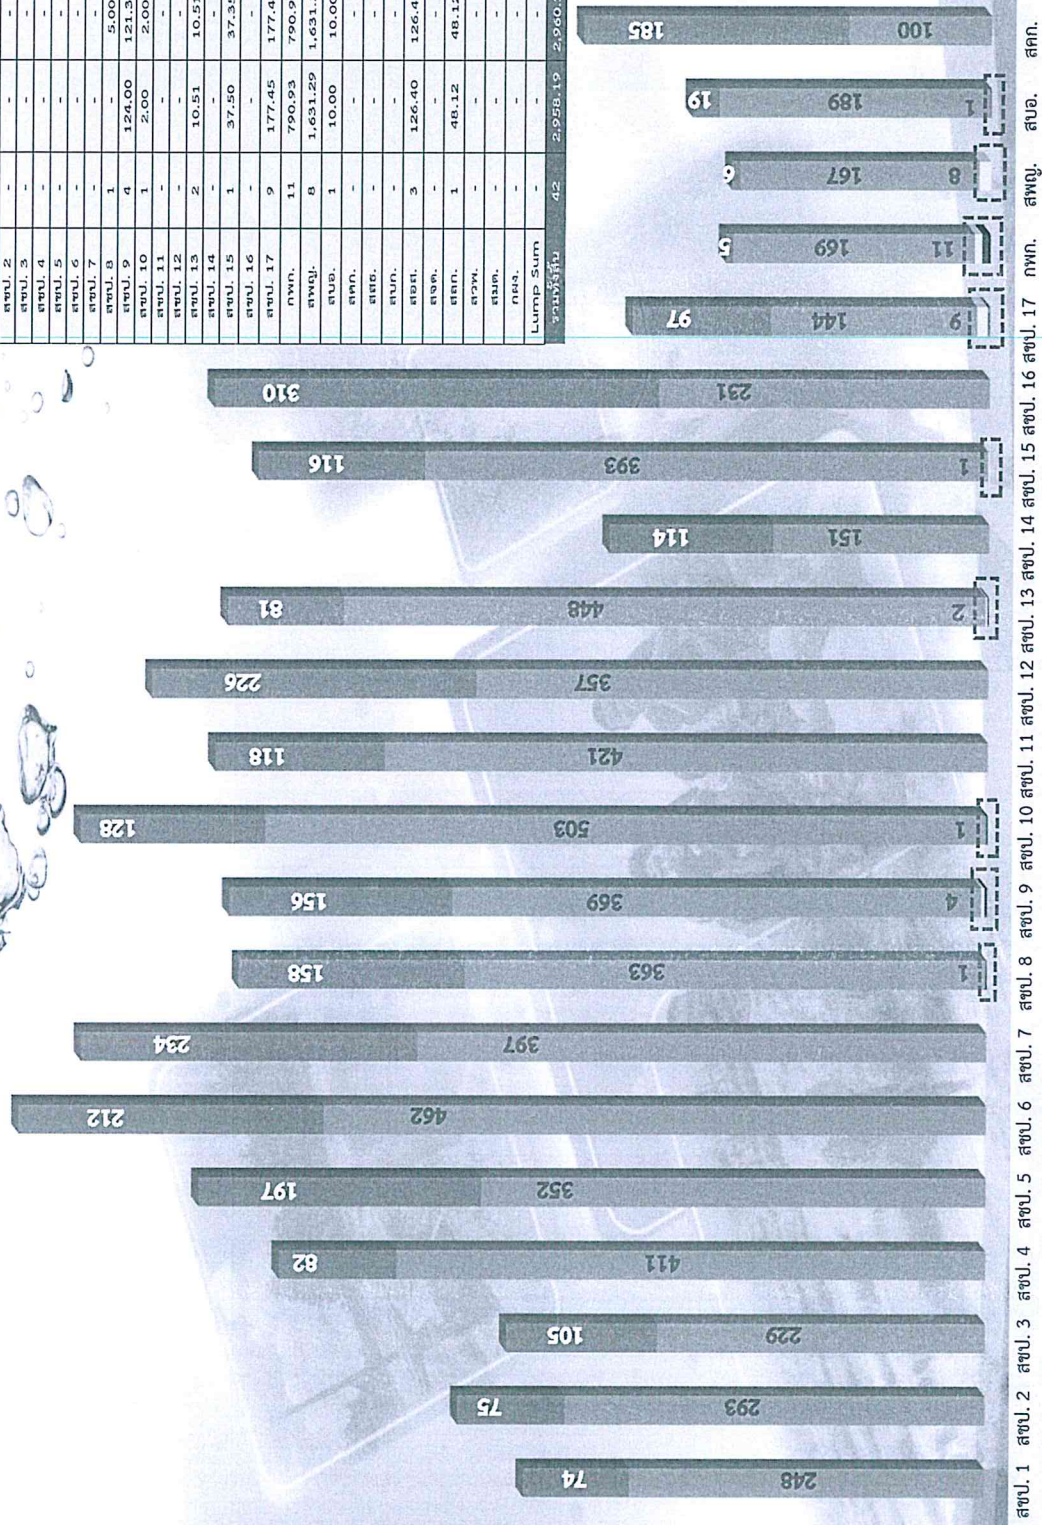[illegible]

แล้วเสร็จ	2,710 รายการ
ก่อนขึ้นผูกพัน	6,510 รายการ
อนุมัติรับราคา	28 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	2 รายการ
ประกาศ TOR	1 รายการ
อนุมัติแผน	8 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ	3 รายการ

ยังไม่ก้อหนີ
ผูกพัน 42
รายการ

แล้วเสร็จ

กำหนดแผนผัง

อนุมัติรับราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ TOR

อนมัติแผน

■ ยังไม่ดำเนินการ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,710 รายการ

6,510 ရာယဂාර်

28 รายการ

2 รายการ

1 รายการ

8 รายการ

3. ฐานการ

1
2
3
4
5

[illegible]

2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการ	งบประมาณ	ทำข้อมูลพ้น					
						จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	งบประมาณ			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	64,898.23	62,342.62	27,415.93	43.98	9,262	3	154.00	39	2,806.35	9,220	59,382.26	1,970	535	726	1,083	2,196	2,710
สชบ. 1	1,200.46	1,152.08	642.38	55.76	322					322	1,152.08	15	15	39	32	147	74
สชบ. 2	1,294.34	1,203.73	677.85	56.31	368					368	1,203.73	86	17	24	46	120	75
สชบ. 3	1,966.55	1,815.59	985.14	54.26	334					334	1,815.59	59	27	25	39	79	105
สชบ. 4	1,263.11	1,177.46	544.17	46.22	493					493	1,177.46	210	22	23	29	127	82
สชบ. 5	2,891.26	2,778.24	1,504.03	54.14	549					549	2,778.24	88	35	47	63	119	197
สชบ. 6	3,337.57	3,102.14	2,146.17	69.18	674					674	3,102.14	74	15	40	72	261	212
สชบ. 7	3,031.25	2,854.15	1,705.07	59.74	631					631	2,854.15	45	45	43	78	186	234
สชบ. 8	2,422.14	2,325.13	759.37	32.66	522			1	5.00	521	2,320.13	116	19	40	46	142	158
สชบ. 9	2,784.90	2,585.85	965.36	37.33	529			4	121.31	525	2,464.54	51	43	55	82	138	156
สชบ. 10	1,444.94	1,355.82	501.03	36.95	632	1	2.00			631	1,353.82	157	22	38	92	194	128
สชบ. 11	2,012.39	1,888.01	642.19	34.01	539					539	1,888.01	290	20	17	17	77	118
สชบ. 12	2,282.67	2,035.08	1,010.49	49.65	583					583	2,035.08	100	38	44	47	128	226
สชบ. 13	1,609.84	1,474.50	713.67	48.40	531			2	10.51	529	1,463.99	100	28	39	94	187	81
สชบ. 14	2,589.19	2,523.05	1,030.77	40.85	265					265	2,523.05	31	25	26	34	35	114
สชบ. 15	1,541.32	1,445.09	403.53	27.92	510			1	37.35	509	1,407.74	120	40	64	98	71	116
สชบ. 16	2,013.08	1,888.86	637.34	33.74	541					541	1,888.86	46	18	44	58	65	310
สชบ. 17	1,189.08	1,130.62	294.97	26.09	250			9	177.45	241	953.17	30	25	21	34	34	97
สคก.	995.18	986.24	594.56	60.29	285					285	986.24	51	9	11	12	17	185
สคณ.	48.12	48.27	0.15	0.31	2			1	48.12	1	0.15						1
สณก.	484.83	484.83	73.36	15.13	27					27	484.83	27					
สอ.	434.15	430.19	114.94	26.72	209			1	10.00	208	420.19	39	15	47	62	26	19
สธ.	467.04	466.98	253.81	54.35	40					40	466.98	10	2	3	18	5	2
สชญ.	11,971.14	11,841.20	3,796.85	32.06	181			8	1,631.29	173	10,209.92	103	24	10	12	18	6
สจพ.	83.72	82.85	8.29		1					1	82.85	1					
สธส.	316.26	316.26	63.36	20.03	7			3	126.40	4	189.86	4					
กวก.	11,382.77	11,361.62	5,443.15	47.91	185	2	152.00	9	638.93	174	10,570.69	95	25	23	15	11	5
สผด.	3,667.59	3,415.30	1,870.17	54.76	35					35	3,415.30	18	6	2	2	3	4
สจด.	24.34	24.29	18.91	77.87	12					12	24.29	1		1	1	5	4
กษ.		0.21	0.19	92.42	2					2	0.21					1	1
LUMP SUM	149.00	149.00	14.66	9.84	3					3	149.00	3					

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 199 รายการ งบประมาณ 1,611.81 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น
2. โครงการที่สนับสนุนจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองก่อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จากระบบติดตาม Cen Protect ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลำดับ/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ โอนจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลกัน							
						จำนวนรายการ	งบประมาณ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)							
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %		
รวม	64,898.23	62,342.62	27,415.93	43.98	9,262	3	154.00	39	2,806.35	9,220	59,382.26	1,970	535	726	1,083	2,196	2,710
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และเพิ่มพื้นที่โฆษณา	19,615.63	18,935.67	8,518.87	44.99	404			19	1,348.33	385	17,587.35	176	46	45	69	38	11
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,140.30	8,136.61	2,760.45	33.93	221			2	92.00	219	8,044.61	117	35	24	18	16	9
การดำเนินงานชลประทาน	2,178.62	2,148.89	1,254.26	58.37	1,636			3	69.43	1,633	2,079.46	283	107	229	243	222	549
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,358.90	1,236.21	659.89	53.38	40					40	1,236.21	20	6	3	8	3	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำ	3,232.41	3,039.81	1,606.58	52.85	103			1	5.00	102	3,034.81	30	20	14	27	10	1
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เชิงรุก	371.66	362.79	91.10	25.11	8	1	140.00			7	222.79	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะแรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	355.53	344.80	141.03	40.90	4	1	12.00			3	332.80	2			1		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	6,899.32	6,570.55	4,677.12	71.18	5,316	1	2.00	2	29.31	5,313	6,539.24	893	172	279	565	1,608	1,796
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,382.98	1,281.23	437.89	34.18	50					50	1,281.23	26	6	9	3	6	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,142.58	2,007.57	949.47	47.29	600			1	37.35	599	1,970.21	89	40	31	63	155	221
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,264.69	5,884.10	2,178.77	37.03	392			3	39.00	389	5,845.10	118	58	57	60	76	20
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	1,125.27	983.25	348.48	35.44	39					39	983.25	17	6	11	3	2	
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ	1,987.28	1,763.39	442.36	25.09	183					183	1,763.39	76	9	13	10	28	47
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	276.15	279.71	108.73	38.87	117					117	279.71	38	3		5	20	51
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์	160.63	160.55	3.60	2.24	9			4	82.65	5	77.90	3	2				
โครงการอนุรักษ์ ป่าปลูกและพัฒนารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	651.60	551.54	151.72	27.51	16					16	551.54	5	8	3			
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งรองอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่	1,045.99	895.68	484.76	54.12	10					10	895.68	1	1	3	2	1	2
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	1,231.35	1,657.58	424.66	25.62	15			2	603.32	13	1,054.26	11			2		
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ - พุนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	410.92	366.10	170.53	46.58	7					7	366.10	4	1	1		1	
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่า	284.71	165.18	45.41	27.49	4					4	165.18	1	1		2		
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	331.98	204.44	57.24	28.00	6			1	120.00	5	84.44	1	1		2		
โครงการประจวบคีรีขันธ์สร้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชิงตะกอน จังหวัดเลย	266.59	185.12	7.59	4.10	5					5	185.12	4	1				1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	349.82	349.82	173.19	49.51	4					4	349.82	3		1			
โครงการคลองชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	2,159.25	2,157.44	909.79	42.17	12					12	2,157.44	7	3		1		1
โครงการพัฒนาฝัมน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	640.47	640.47	136.46	21.31	13					13	640.47	11	1	1			
โครงการประจวบคีรีขันธ์สร้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	213.40	213.40	86.82	40.68	5					5	213.40	2	1	1		1	
โครงการประจวบคีรีขันธ์สร้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	80.20	75.99	58.68	77.22	6					6	75.99	2	1		1	2	
โครงการเขื่อนแม่งรอง จังหวัดอุตรดิตถ์	526.44	562.31	319.53	56.82	10					10	562.31	4	1	1	2	1	1
โครงการปรับปรุงคลองมะขาม จังหวัดสุโขทัย	412.62	412.62	13.61	3.30	5			1	379.97	4	32.65	3			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดห้วยยา	123.62	119.28	11.88	9.96	5					5	119.28	4	1				
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบราบังบุรี	421.76	421.76	60.66	14.38	10					10	421.76	7	3				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	255.60	228.76	124.80	54.56	7					7	228.76	5	1				

หมายเหตุ : 1. จำนวน 198 รายการงบประมาณเงินได้รั้งงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น เงินหัวดี เงินให้อำนาจจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น
2. โครงการสนับสนุนจากอำเภอกับน้ำประเศ-หนองคาย-บางพระ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมการขึ้นเลื้อนโครงการงบ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

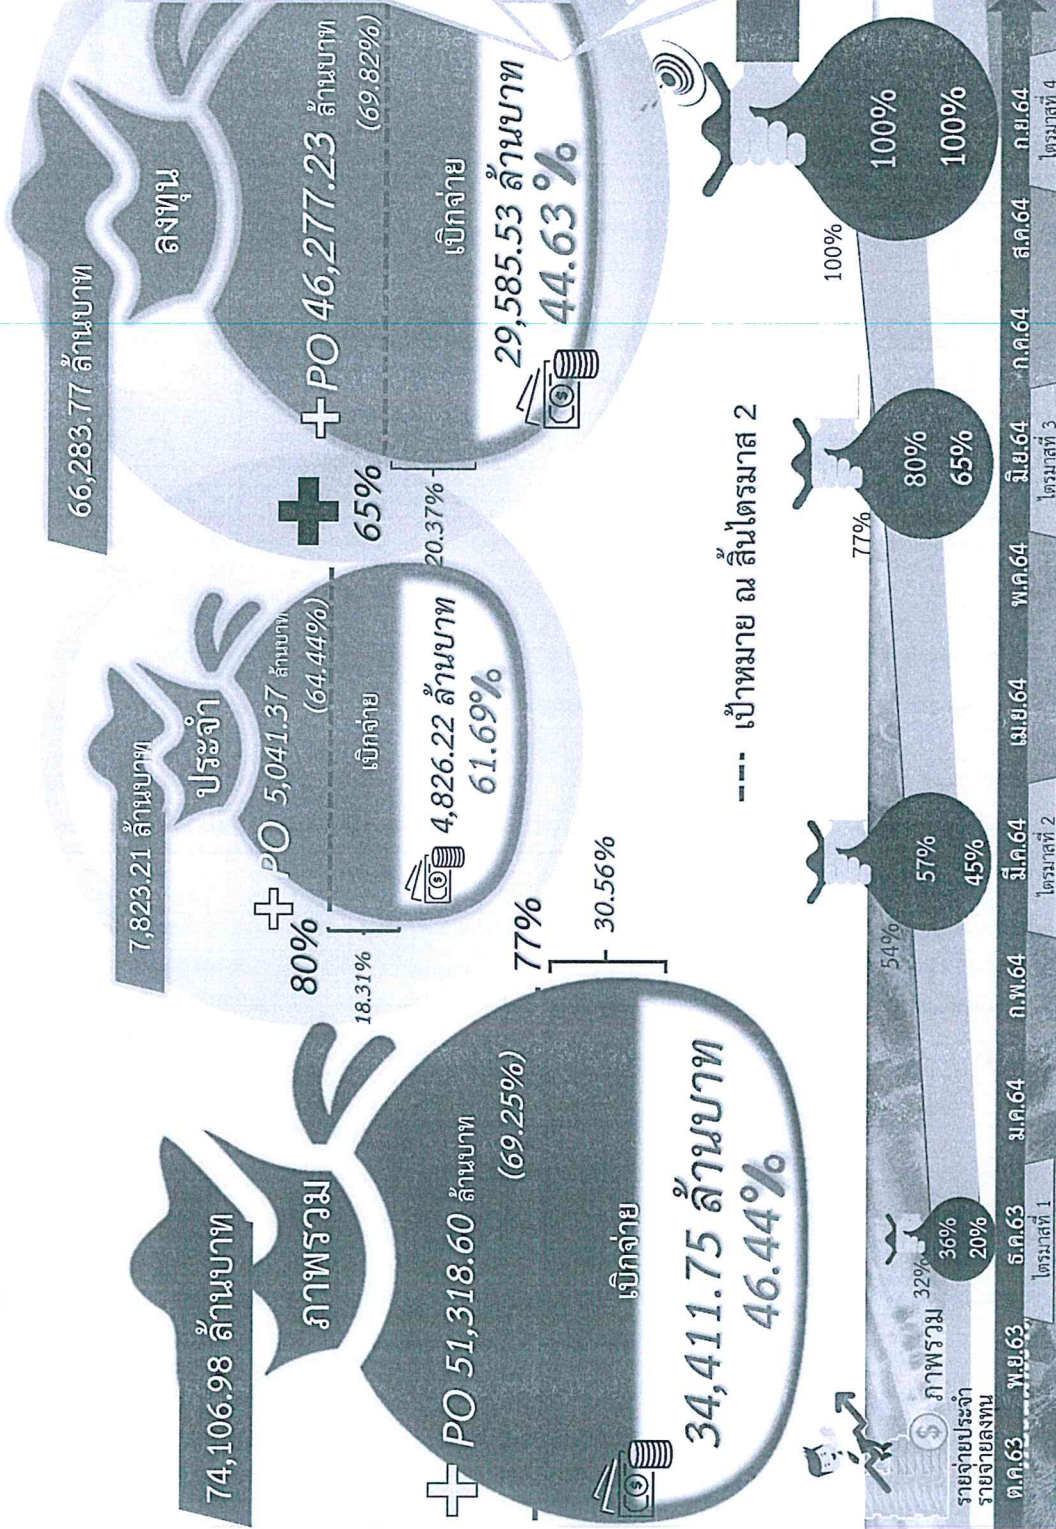

2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

74,106.98 ล้านบาท


ภาพรวม

เบิกจ่าย

34,411.75 ล้านบาท
46.44%

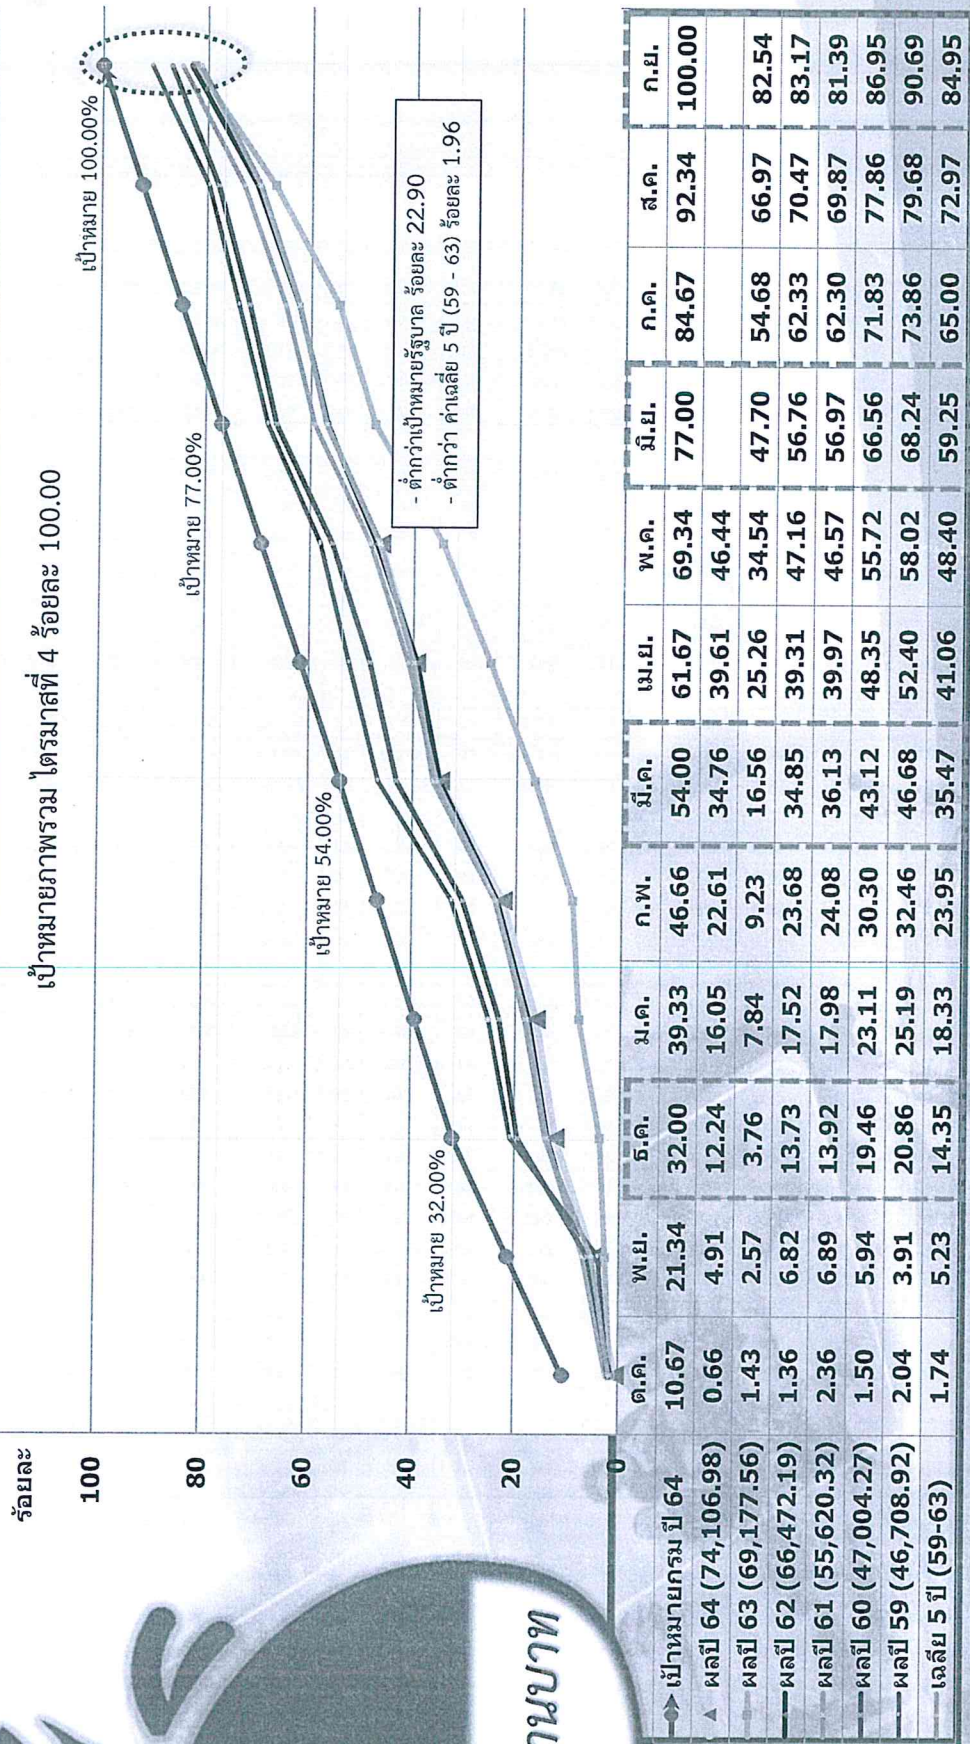

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564


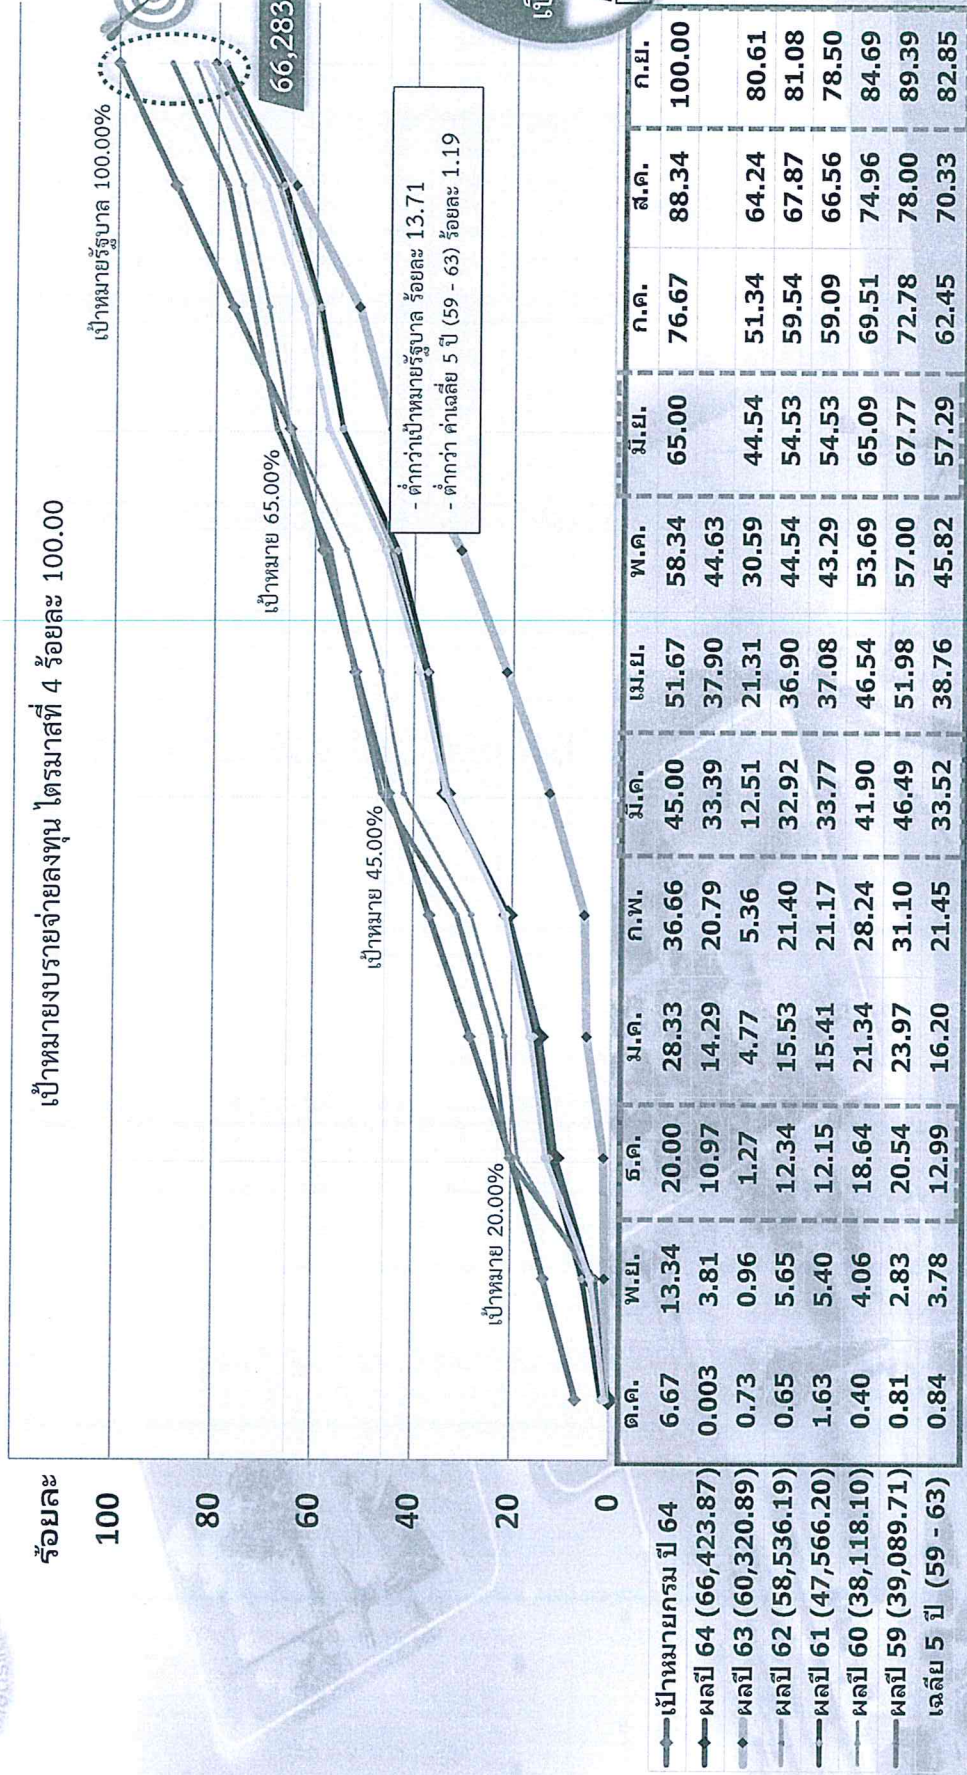


2.8

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564


ร้อยละ



เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายลงทุน
ณ เดือน พ.ค. 64 : 58.34 %

หน่วยนับ	งบประมาณรวม	งบประมาณใช้การ (เงินบาท)	ผลการเบิกจ่าย (เงินบาท)	ผลการเบิกจ่าย/ใช้การ	หน่วยนับ	งบประมาณรวม	งบประมาณใช้การ (เงินบาท)	ผลการเบิกจ่าย (เงินบาท)	ผลการเบิกจ่าย/ใช้การ
สพป.1	1,200.46	1,152.08	642.38	55.76	สทท.	995.18	986.24	594.56	60.29
สพป.2	1,294.34	1,203.73	677.85	56.31	สทค.	48.12	48.27	0.15	0.31
สพป.3	1,966.55	1,815.59	985.14	54.26	สทอ.	484.83	484.83	73.36	15.13
สพป.4	1,263.11	1,177.46	544.17	46.22	สทอ.	430.15	430.19	114.94	26.72
สพป.5	2,891.26	2,778.24	1,504.03	54.14	สทอ.	467.04	466.98	253.81	54.35
สพป.6	3,337.57	3,102.14	2,146.17	69.18	สทอ.	11,971.14	11,841.20	3,796.85	32.06
สพป.7	3,031.25	2,854.15	1,705.07	59.74	สทอ.	83.72	82.85	8.29	10.00
สพป.8	2,422.14	2,325.13	759.37	32.66	สทอ.	316.26	316.26	63.36	20.03
สพป.9	2,784.90	2,585.85	965.36	37.33	สทอ.	11,382.77	11,361.62	5,443.15	47.91
สพป.10	1,444.94	1,355.82	501.03	36.95	สทค.	3,667.59	3,415.30	1,870.17	54.76
สพป.11	2,012.39	1,888.01	642.19	34.01	สทค.	24.34	24.29	18.91	77.87
สพป.12	2,282.67	2,035.08	1,010.49	49.65	สทค.	-	0.21	0.19	92.42
สพป.13	1,609.84	1,474.50	713.67	48.40	LUMP SUM	149.00	149.00	14.66	9.84
สพป.14	2,589.19	2,523.07	1,030.77	40.85					
สพป.15	1,541.32	1,445.09	403.53	27.92					
สพป.16	2,013.08	1,888.86	637.34	33.74					
สพป.17	1,189.08	1,130.62	294.97	26.09					
					รวม	64,898.23	62,342.62	27,415.93	43.98

เฉลี่ย 5 ปี (59-63) : 45.82 %

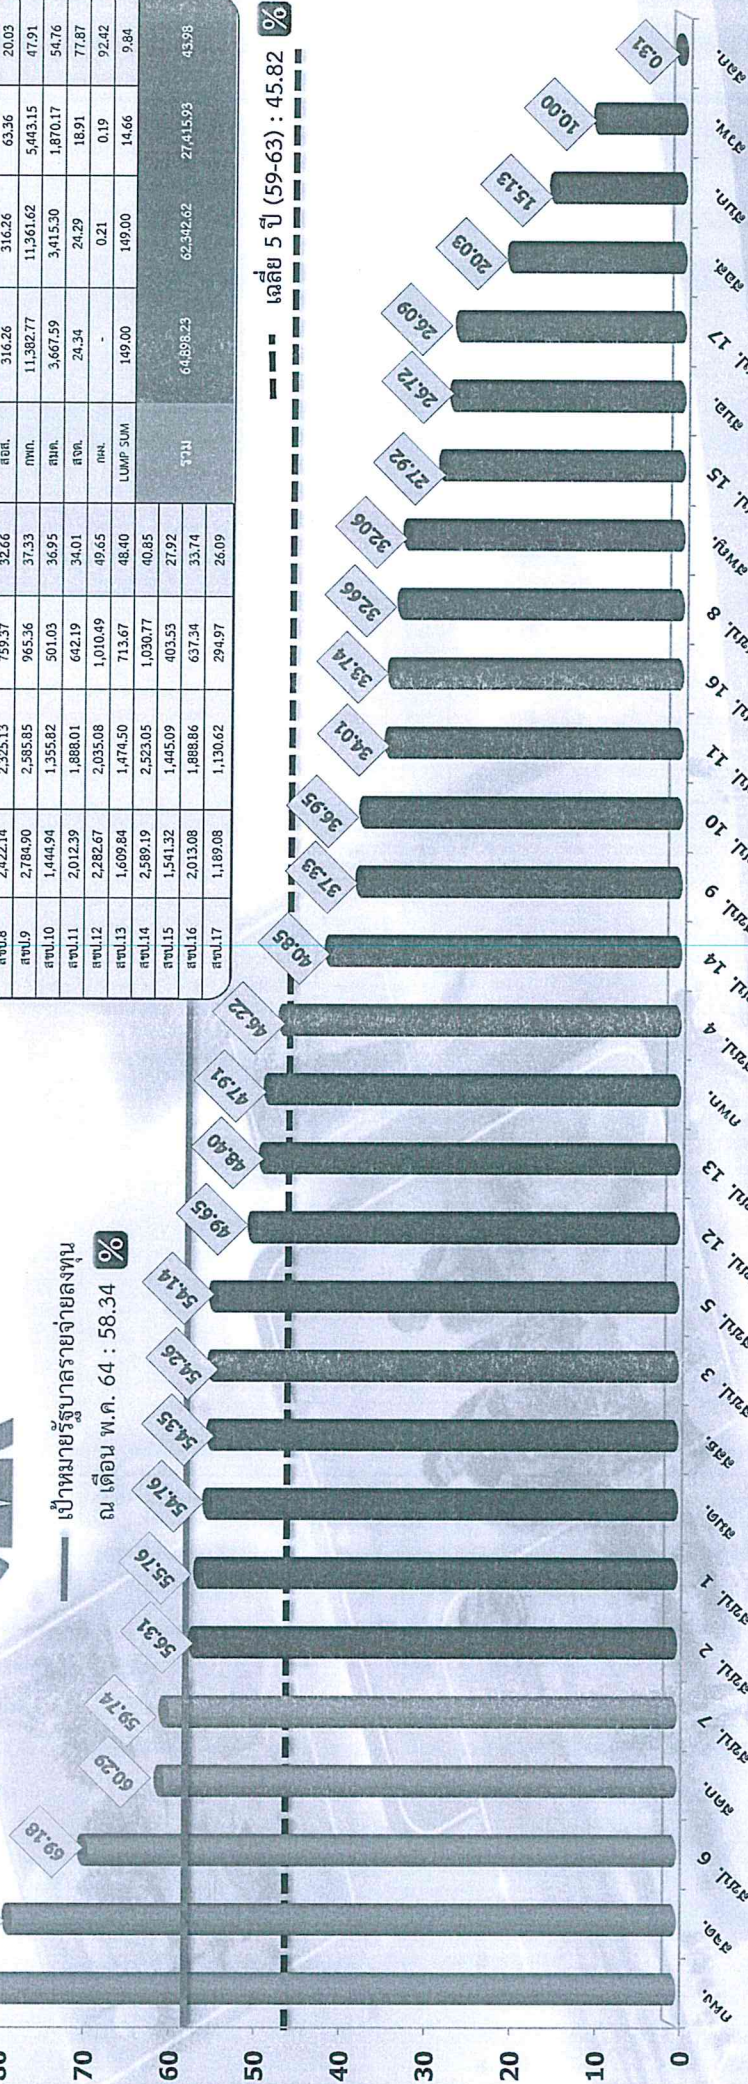

หมายเหตุ : 1. งบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 64,898.23 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิกจำนวน 199 รายการ งบประมาณ 1,611.81 ล้านบาท
2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน จำนวน 62 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 156.59 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

กองแผนงาน

2.9


ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการมคู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	72,304.19	32,813.76	45.38	67,029.35	18,488.01	27.58	17.80
2	กระทรวงคมนาคม	177,309.47	70,333.81	39.67	163,526.42	34,225.71	20.93	18.74
3	กระทรวงมหาดไทย	80,631.45	19,694.26	24.43	80,065.29	9,907.02	12.37	12.06
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,114.26	1,445.40	68.36	2,345.64	973.08	41.48	26.88
2	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,159.16	547.26	47.21	1,265.74	204.17	16.13	31.08
3	กรมชลประทาน	66,283.77	29,585.53	44.63	60,104.62	16,557.29	27.55	17.08
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเดียวกัน)							
1	กรมชลประทาน	66,283.77	29,585.53	44.63	60,104.62	16,557.29	27.55	17.08
2	กรมทางหลวง	120,044.00	52,696.42	43.90	108,024.86	26,956.32	24.95	18.95
3	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,512.17	9,968.06	36.23	24,893.33	7,765.25	31.19	5.04
4	กรมทางหลวงชนบท	47,151.29	15,443.54	32.75	45,881.20	6,198.26	13.51	19.24

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 38.07%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (47 หน่วยงาน) เฉลี่ย 36.88%





1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

สถานการณ์ด้านพลังงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

1,244 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

308 รายการ

การ

5 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2564

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2563

รวม	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	196.19
ค่าคง	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.44	-75.79

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

ไตรมาสที่ 1

James M. Smith

ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2

พ.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64

ไดรเวสท์ 3

ไตรมาสที่ 3

กฤษ ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
--------	---------	---------	---------

१३५१८२७४

ไตรมาสที่ 4


100%
เบิกง่าย



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง จำนวน	6,970.9511 ล้านบาท 698 รายการ
เบิกจ่าย	5,171.8473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.19

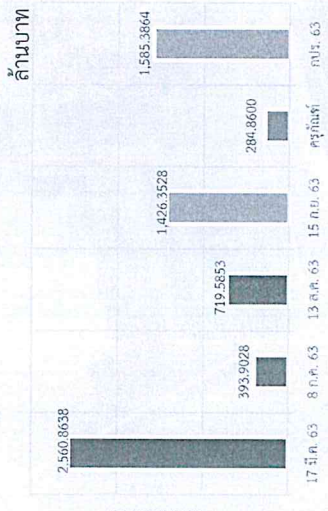

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	46 รายการ
การก่อสร้าง	648 รายการ
งานแล้วเสร็จ	3 รายการ
ยกเลิก	698 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกพัฒนา พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และรายงานให้พื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

มติ ครม. 17 มี.ค.	มติ ครม. 8 ก.ค.	มติ ครม. 13 ส.ค.	มติ ครม. 15 ก.ย.	มติ ครม. 15 ก.ย. ครุภัณฑ์	กปร. ปี 2563
266 รายการ	222 รายการ	79 รายการ	45 รายการ	8 รายการ	78 รายการ
2,560.8638 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,325.0775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.79	393.9028 ล้านบาท เบิกจ่าย 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17	719.5853 ล้านบาท เบิกจ่าย 480.8815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.63	1,426.3528 ล้านบาท เบิกจ่าย 880.7925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75	284.8600 ล้านบาท เบิกจ่าย 14,980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26	1,585.3864 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,079,4827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.09
• แล้วเสร็จ 264 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ	• แล้วเสร็จ 222 รายการ	• แล้วเสร็จ 69 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ	• แล้วเสร็จ 34 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ • อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ	• แล้วเสร็จ 2 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ	• แล้วเสร็จ 57 รายการ • อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ • ยกเลิก 1 รายการ
89.20 %	100 %	91.05 %	66.66 %	60.00 %	60.26 %
โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในฤดูฝนปี 2563	โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับ ปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความ เสียหายจากฝนน้ำท่วมอุทกภัยและโรค	โครงการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ ในฤดูฝนปี 2563	โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ปรอท ปริมาณน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพ เก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 256	โครงการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย	ดำเนินการก่อสร้างอาคารสะพาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ขาดแคลน และโครงการศูนย์ศึกษา เนื่องมาจากพระราชดำริ

(ข้อมูลการงบประมาณตาม Cen Project ณ วันที่ 21 พ.ค. 64)

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และการลงทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายละเอียดผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 21 พ.ค. 64)

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ 248.3300 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 139.7885 ล้านบาท 56.29%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 13 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 21 รายการ

ผลสัมฤทธิ์

พื้นที่เกษตรกรรม 26,457 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,376 ครัวเรือน

ผล = 4,965 ไร่

ผล = 636 ครัวเรือน

ภาพรวม

งบประมาณ 935.0000 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 580.9444 ล้านบาท 62.13%

ผลการดำเนินงาน : 91 รายการ

แล้วเสร็จ 19 รายการ

ก่อสร้าง 71 รายการ

* ยกเลิก 1 รายการ

ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่เกษตรกรรม 63,111 ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,046 ครัวเรือน

ผล = 2,380 ไร่

ผล = 270 ครัวเรือน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 893.6955 ล้านบาท

งบจัดสรร 307.3212 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 95.7177 ล้านบาท 31.15%



ผลการดำเนินงาน : 1,637 รายการ

แล้วเสร็จ 188 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 988 รายการ

เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง 461 รายการ

