



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๓๒๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๒ 3670
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓

ทราบ / รับ ผอ. อธช. ออธ.ผ.ผ.
เพื่อโปรดทราบและแจ้ง

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 96,686.29 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 37,892.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.19 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 12,974 รายการ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 234 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.80 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,666 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.80 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 4,006 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.88 และยกเลิก จำนวน 68 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.52 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 67,157.77 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 20,296.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.22 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 8,092.57 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,946.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.12 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 59,065.20 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15,350.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.99 มีจำนวนรายการ 8,559 รายการ เป็นรายการ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 8,217 รายการ และรายการ โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 342 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 205 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.40 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,860 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.83 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 436 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.09 และยกเลิก จำนวน 58 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.68

2. งบเงินกู้/กู้ยืม/เงินกู้ยืม/เงินกู้ยืม พ.ศ. 2555 – 2562 งบประมาณ จำนวน 13,878.55 ล้านบาท เบิกจ่ายและสลาย PO แล้ว จำนวน 8,041.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 (เบิกจ่าย 7,226.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 และสลาย PO แล้ว 820.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.91) มีจำนวนรายการ 1,391 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 324 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.29 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,064 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.49 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.22

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2559 – 2563 งบประมาณ จำนวน 14,017.08 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,626.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.67 มีจำนวนรายการ 1,618 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.87 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 305 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.85 ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,292 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.85 และยกเลิก จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 697.89 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 513.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.57 มีจำนวนรายการ 1,328 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.13 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 99 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.45 และดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1,214 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.42

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 230.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.68 มีจำนวนรายการ 78 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกู้ยืม/เงินกู้ยืม/เงินกู้ยืม/เงินกู้ยืม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)				หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	96,686.29	37,892.88	39.19	12,974	234	8,666	4,006	ยกเลิก 68 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ.)	67,157.77	20,296.37	30.22	8,559	205	7,860	436	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	8,092.57	4,946.33	61.12	-	-	-	-	
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	59,065.20	15,350.04	25.99	8,559	205	7,860	436	รายการ พ.ร.บ. 63 ไม่รวมโอนเป็นงบลงทุน 8,217 รายการ ยกเลิก 58 รายการ และรายการโอนงบลงทุน 342 รายการ
2. งบเงินกู้/เงินกู้ยืม/เงินยืม พ.ศ. 2555 - 2562	13,878.55	7,226.15	52.07	1,391	-	324	1,064	- สลย PO สำนับท 820.31 สำนับท - ยอดเงินคงเหลือ 5,832.10 สำนับท
2.1 ปี พ.ศ. 2555	104.12	65.59	63.00	4	-	2	1	ยอดเงินคงเหลือ 18.78 สำนับท (ยกเลิก 1 รายการ สลย PO แล้ว)
2.2 ปี พ.ศ. 2557	61.20	1.28	2.09	5	-	4	1	ยอดเงินคงเหลือ 59.92 สำนับท
2.3 ปี พ.ศ. 2558	160.01	2.21	1.38	8	-	4	4	ยอดเงินคงเหลือ 157.69 สำนับท
2.4 ปี พ.ศ. 2559	139.37	22.98	16.48	12	-	6	5	ยอดเงินคงเหลือ 74.11 สำนับท (ยกเลิก 1 รายการ สลย PO แล้ว)
2.5 ปี พ.ศ. 2560	579.91	299.67	51.67	49	-	23	26	ยอดเงินคงเหลือ 277.56 สำนับท
2.6 ปี พ.ศ. 2561	2,391.97	775.97	32.44	180	-	89	90	ยอดเงินคงเหลือ 1,551.50 สำนับท (ยกเลิก 1 รายการ สลย PO แล้ว)
2.7 ปี พ.ศ. 2562	10,441.97	6,058.45	58.02	1,133	-	196	937	ยอดเงินคงเหลือ 3,692.54 สำนับท
3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	14,017.08	9,626.22	68.67	1,618	14	305	1,292	
3.1 งบกลางปี 2563	3,214.38	314.95	9.80	300	14	286	-	
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	653.51	73.53	11.25	34	14	20	-	
- งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง	2,560.86	241.42	9.43	266	-	266	-	
3.2 งบกลางปี 2562	1,842.53	1,539.55	83.56	134	-	14	120	
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	1,653.73	1,373.34	83.05	70	-	14	56	
- ค่าใช้จ่ายไม่โครงการอื่นและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเหตุภัยพิบัติพื้นที่ภาคเหนือ	188.80	166.21	88.03	64	-	-	63	ยกเลิก 1 รายการ
3.3 งบกลางปี 2561 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	1,613.03	1,350.18	83.70	76	-	1	75	รายการที่ล่าช้า เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิก เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้จ่ายโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี ทั้งที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและอยู่ใต้งบอุดหนุน
3.4 งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล	1,590.54	1,407.02	88.46	58	-	3	54	ยกเลิก 1 รายการ รายการที่ล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
3.5 งบกลางปี 2559 รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของ ประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	5,756.59	5,014.53	87.11	1,050	-	1	1,044	ยกเลิก 5 รายการ และ 1 รายการที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างทั้งงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	697.89	513.42	73.57	1328	15	99	1,214	
5. จัดรูปที่ดิน	935.00	230.73	24.68	78	-	78	-	

งบลงทุน

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง


ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาพรวม

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
2.41%

ก่อหนี้ผูกพัน
97.59%

หมายเหตุ : รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 342 รายการ
งบประมาณ 722.87 ล้านบาท

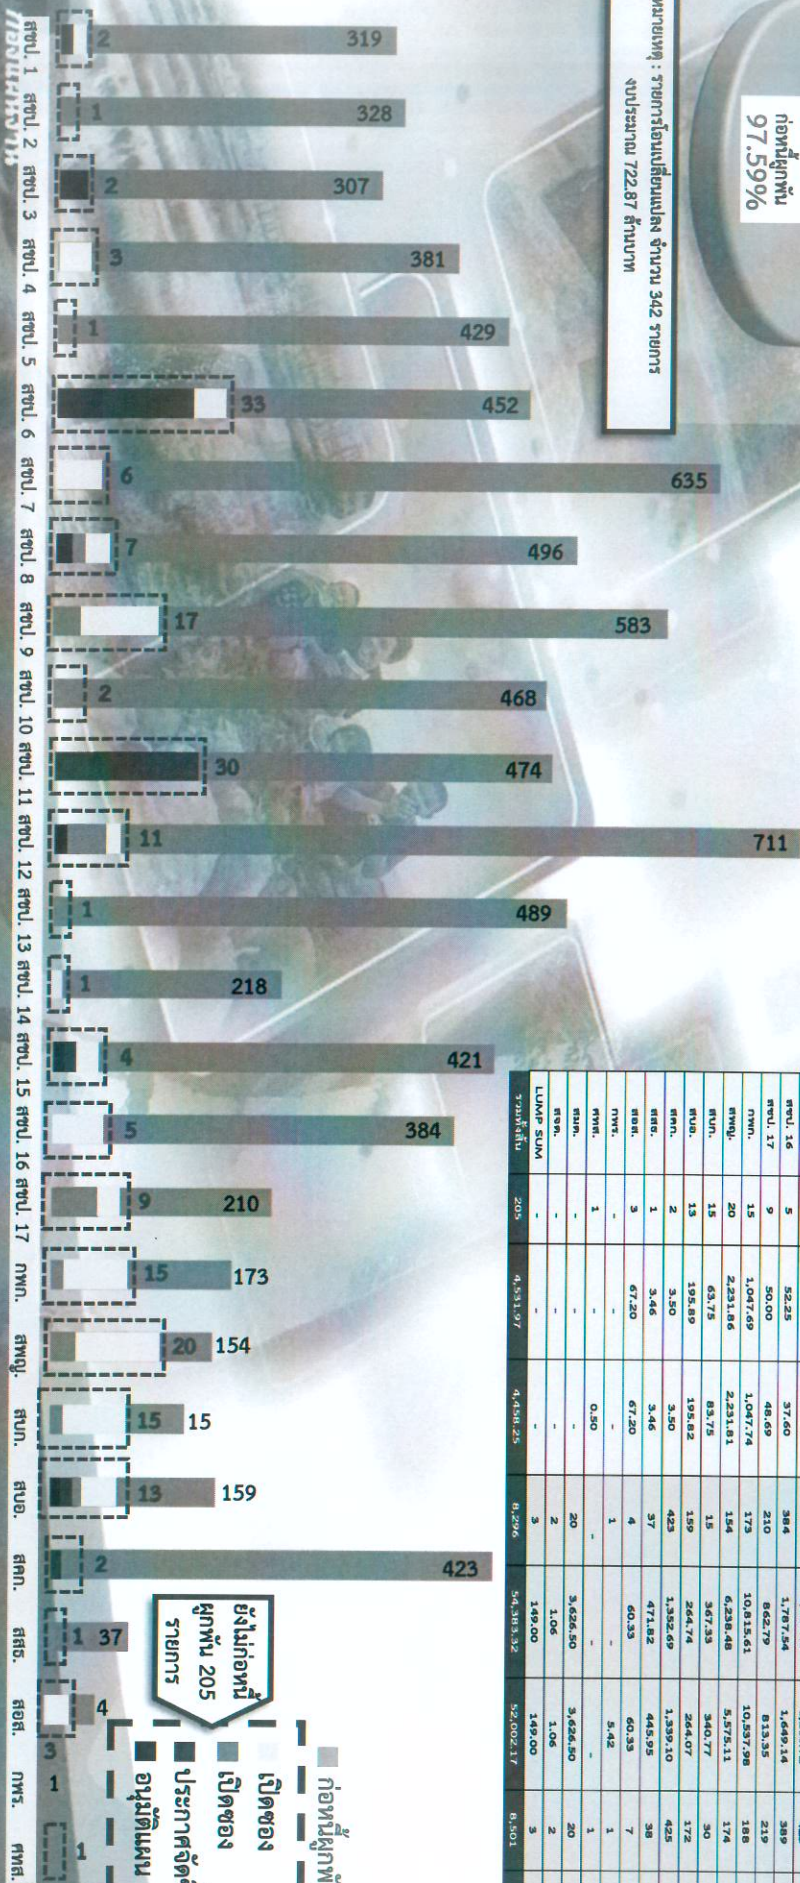

ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 205
รายการ

เปิดซอง 95 รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ
อนุมัติแผน 26 รายการ
47 รายการ

งบลงทุน 8,296 รายการ

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พ.ค. 63
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 พ.ค. 63

สำนัก/กอง	งบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการทั้งหมด	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนรายการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ทำสัญญา						
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวนรายการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)					จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
														0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %
รวม	58,915.30	56,460.41	15,287.84	27.08	8,501	205	4,458.25	8,296	52,002.17	3,451	1,622	1,168	829	790	436			
สชบ. 1	1,162.97	1,071.50	245.22	22.89	321	2	56.16	319	1,015.34	130	85	56	29	18	1			
สชบ. 2	1,194.20	1,172.16	273.45	23.33	329	1	1.00	328	1,171.16	121	61	58	72	15	1			
สชบ. 3	1,122.89	1,029.04	223.90	21.76	309	2	8.19	307	1,020.86	117	47	62	29	42	10			
สชบ. 4	1,414.77	1,379.60	213.89	15.50	384	3	88.66	381	1,290.95	226	62	67	23	2	1			
สชบ. 5	2,214.95	1,709.38	427.13	24.99	430	1	134.25	429	1,575.13	130	98	73	68	48	12			
สชบ. 6	3,316.51	3,158.06	947.17	29.99	485	33	77.36	452	3,080.71	88	75	73	87	100	29			
สชบ. 7	2,809.33	2,890.75	782.46	27.07	641	6	7.52	635	2,883.23	239	144	81	67	64	40			
สชบ. 8	2,812.51	2,664.01	365.96	13.74	503	7	44.26	496	2,619.75	214	88	90	37	47	20			
สชบ. 9	2,750.54	2,629.69	506.72	19.27	600	17	53.75	583	2,575.94	199	140	76	58	94	16			
สชบ. 10	1,103.29	1,064.75	236.89	22.25	473	2	11.00	468	1,053.75	217	57	60	70	60	4			
สชบ. 11	1,816.49	1,819.75	188.49	10.36	504	30	12.25	474	1,807.51	225	103	70	14	57	5			
สชบ. 12	2,631.71	2,730.28	492.61	18.04	719	11	108.95	711	2,621.33	376	163	51	65	41	15			
สชบ. 13	1,049.23	1,008.41	307.37	30.48	490	1	1.45	489	1,006.97	150	118	99	43	49	30			
สชบ. 14	2,460.96	2,375.06	356.07	13.73	219	1	120.00	218	2,255.06	65	54	22	20	25	32			
สชบ. 15	1,341.46	1,230.12	139.24	11.32	425	4	13.41	421	1,216.72	236	83	35	44	17	6			
สชบ. 16	1,839.79	1,686.74	171.07	10.14	389	5	37.60	384	1,649.14	118	84	56	32	30	64			
สชบ. 17	912.79	862.03	99.31	11.52	219	9	48.69	210	813.35	96	53	20	10	19	12			
สทบ.	431.08	424.51	66.99	15.78	30	15	83.75	15	340.77	15	-	-	-	-	-			
สทบ.	460.63	459.89	47.52	10.33	172	13	195.82	159	264.07	62	29	40	17	8	3			
กวม.	11,863.30	11,585.72	3,704.29	31.97	188	15	1,047.74	173	10,537.98	134	14	12	3	1	9			
สทบ.	8,470.34	7,806.93	2,292.56	29.37	174	20	2,231.81	154	5,575.11	88	28	14	4	9	11			
สทบ.	475.27	449.41	102.57	22.82	38	1	3.46	37	445.95	12	2	12	7	2	2			
สทบ.	127.53	127.53	27.61	21.65	7	3	67.20	4	60.33	4	-	-	-	-	-			
กทบ.	-	0.50	-	-	1	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-			
สทบ.	3,626.50	3,626.50	2,661.40	73.39	20	-	-	20	3,626.50	3	3	3	4	3	4			
สทบ.	1,356.19	1,342.60	423.80	31.57	425	2	3.50	423	1,339.10	182	31	37	26	38	109			
สทบ.	1.06	1.06	0.93	87.18	2	-	-	2	1.06	-	-	1	-	1	-			
กทบ.	-	5.42	-	-	1	-	-	1	5.42	1	-	-	-	-	-			
Lump Sum	149.00	149.00	13.23	8.88	3	-	-	3	149.00	3	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 58 รายการ งบประมาณ 366.17 ล้านบาท


2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 342 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 722.87 ล้านบาท

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พ.ค. 63
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 พ.ค. 63


ผลผลิต/โครงการ	งบรวม	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวนรายการ ที่มอบ รางวัล	งบรวมที่จัดตั้งไว้		จำนวน รายการ	งบประมาณ ที่จัดตั้งไว้ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ						
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่รับแจ้ง	เบิกจ่าย	งบสะสม แจ้งจ่าย		งบประมาณ ที่จัดตั้งไว้	งบประมาณ ที่รับแจ้ง				งบประมาณ						
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่รับแจ้ง	เบิกจ่าย	งบสะสม แจ้งจ่าย		งบประมาณ ที่จัดตั้งไว้	งบประมาณ ที่รับแจ้ง				งบประมาณ	งบประมาณ ที่รับแจ้ง	งบประมาณ	งบประมาณ ที่รับแจ้ง	งบประมาณ	งบประมาณ ที่รับแจ้ง	งบประมาณ
ผลผลิตการจัดทำงบประมาณ	รวม	58,915.30	56,460.41	15,287.84	27.08	8,501	205	4,458.25	8,296	52,002.17	3,451	1,622	1,168	829	790	436		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,066.03	2,029.24	709.79	34.98	1,583	8	42.85	1,575	1,986.38	645	392	216	87	93	142		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1,940.39	1,819.57	400.11	21.99	471	2	82.54	470	1,737.03	169	107	64	70	39	21		
โครงการสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ		2,119.81	2,030.71	34.20	1.68	214	4	53.15	210	1,977.55	154	31	17	4	2	2		
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		6,080.97	6,061.63	2,299.07	37.93	4,827	109	228.19	4,715	5,853.45	1,683	840	761	615	587	229		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		1,248.07	1,207.02	238.97	19.80	31	1	3.50	30	1,203.52	22	6	2	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		66.50	66.50	0.23	0.23	3	-	-	3	66.50	3	-	-	-	-	-		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		624.79	624.79	102.92	16.47	9	-	-	9	624.79	5	4	-	-	-	-		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,402.22	1,377.54	79.88	5.80	30	8	139.31	22	1,238.23	17	5	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		3,022.91	2,677.45	777.49	29.04	102	4	38.16	98	2,639.29	51	30	13	2	-	2		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		1,066.52	997.18	113.68	11.40	25	-	-	25	997.18	18	6	1	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		537.64	507.25	348.70	68.74	11	-	-	11	507.25	5	1	2	-	-	3		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		407.68	296.12	163.75	55.30	7	1	40.00	6	256.12	2	1	1	1	1	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		388.29	386.43	206.73	53.50	10	1	147.00	9	239.43	3	3	2	-	1	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		210.31	207.94	45.82	22.04	7	1	40.50	6	167.44	3	-	2	-	-	1		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		265.74	261.89	164.89	62.96	10	-	-	10	261.89	4	4	-	-	1	1		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		737.92	390.60	360.10	92.19	9	-	-	9	390.60	2	2	-	-	1	2		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		193.48	193.48	20.83	10.77	5	-	-	5	193.48	4	-	1	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		42.76	123.12	0.01	0.01	2	-	-	2	123.12	2	-	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		5,987.64	5,889.86	545.83	9.27	358	11	284.49	349	5,604.97	220	79	34	10	6	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		18,163.16	17,232.85	6,085.51	35.31	404	28	714.47	376	16,518.47	242	55	43	16	9	11		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		7,863.39	7,686.68	1,449.76	18.86	220	16	941.00	204	6,745.68	139	44	4	4	1	12		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		158.32	144.08	40.79	28.31	109	-	-	109	144.08	24	5	4	19	47	10		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		103.59	99.71	10.80	10.83	6	-	-	6	99.71	5	1	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		134.92	134.42	77.99	58.02	4	-	-	4	134.42	2	1	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		1,015.27	947.46	150.61	15.90	12	3	297.71	9	649.75	7	2	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		1,582.12	1,582.07	378.38	23.92	8	2	852.48	6	729.59	4	1	1	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		630.00	630.00	435.95	69.20	2	-	-	2	630.00	1	1	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		88.40	88.40	0.90	1.01	5	1	60.00	4	28.40	4	-	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		238.45	238.45	0.12	0.05	5	3	226.06	2	12.39	2	-	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		298.76	298.76	0.22	0.07	6	2	266.54	4	32.22	4	-	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		159.24	159.24	43.84	27.53	5	-	-	5	159.24	4	1	-	-	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและสุขภาพจิต		70.00	70.00	-	-	1	-	-	1	70.00	1	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 58 รายการ งบประมาณ 366.17 ล้านบาท 2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 342 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 722.87 ล้านบาท



2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

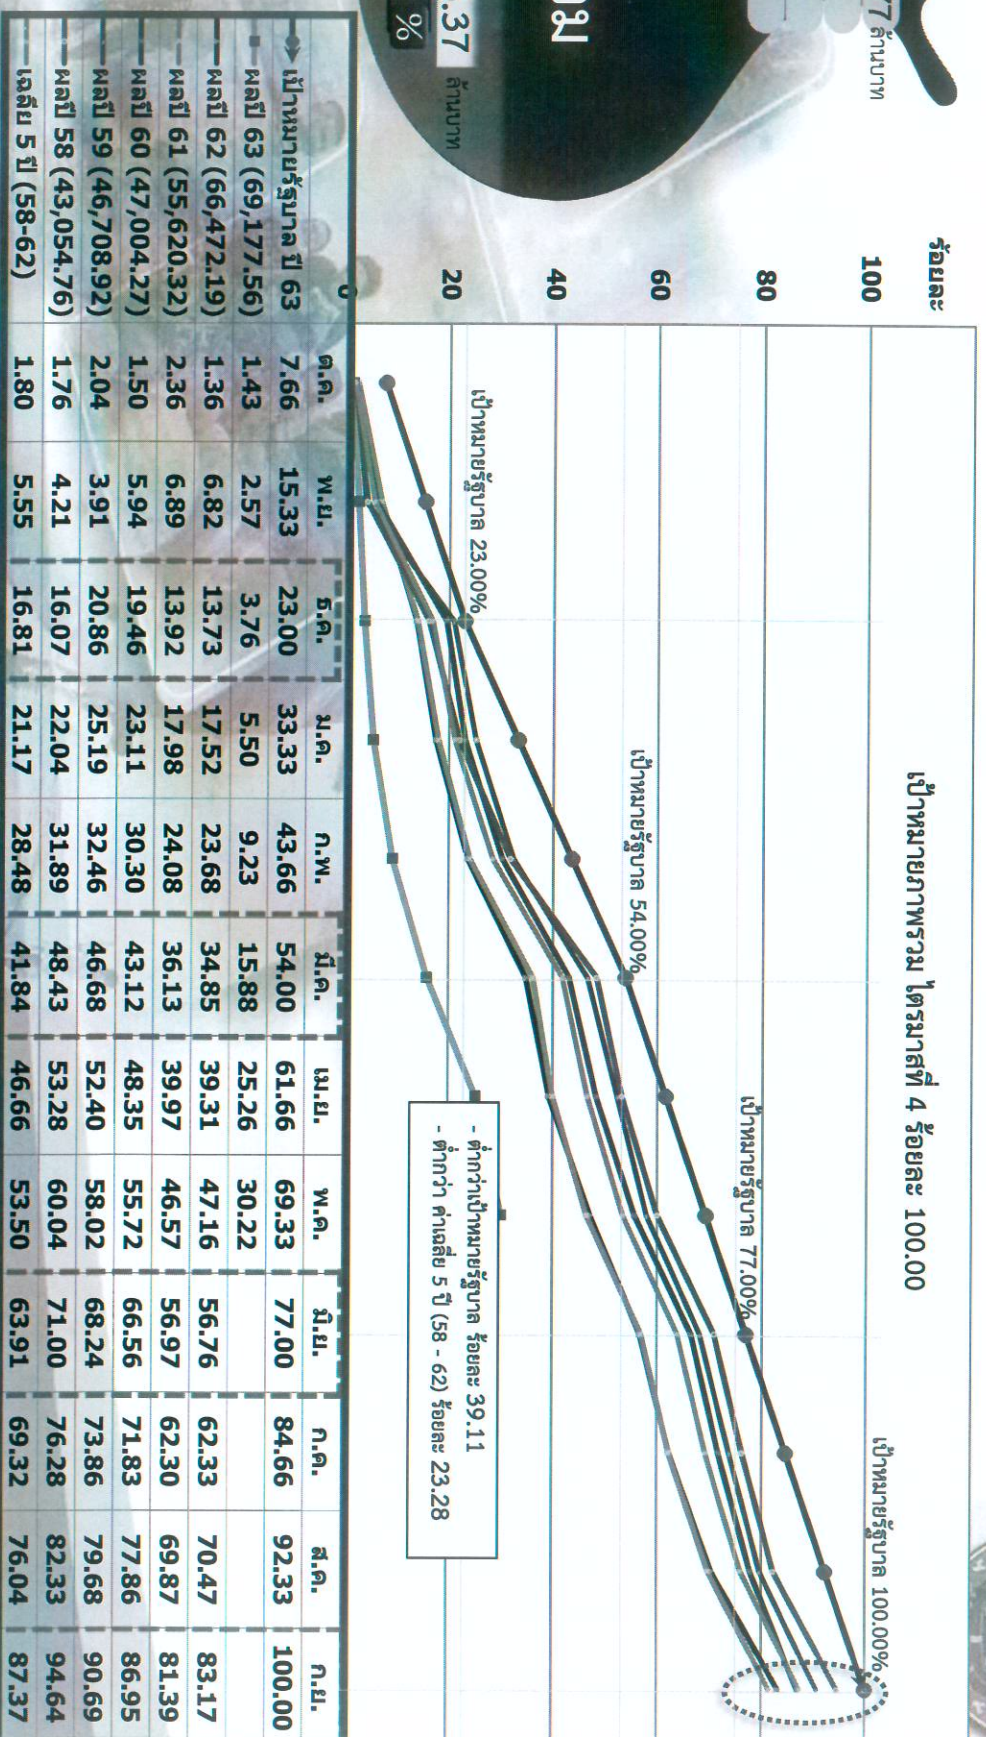

งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

67,157.77 ล้านบาท

ภาพรวม



20,296.37 ล้านบาท


30.22 %



งบลงทุน

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

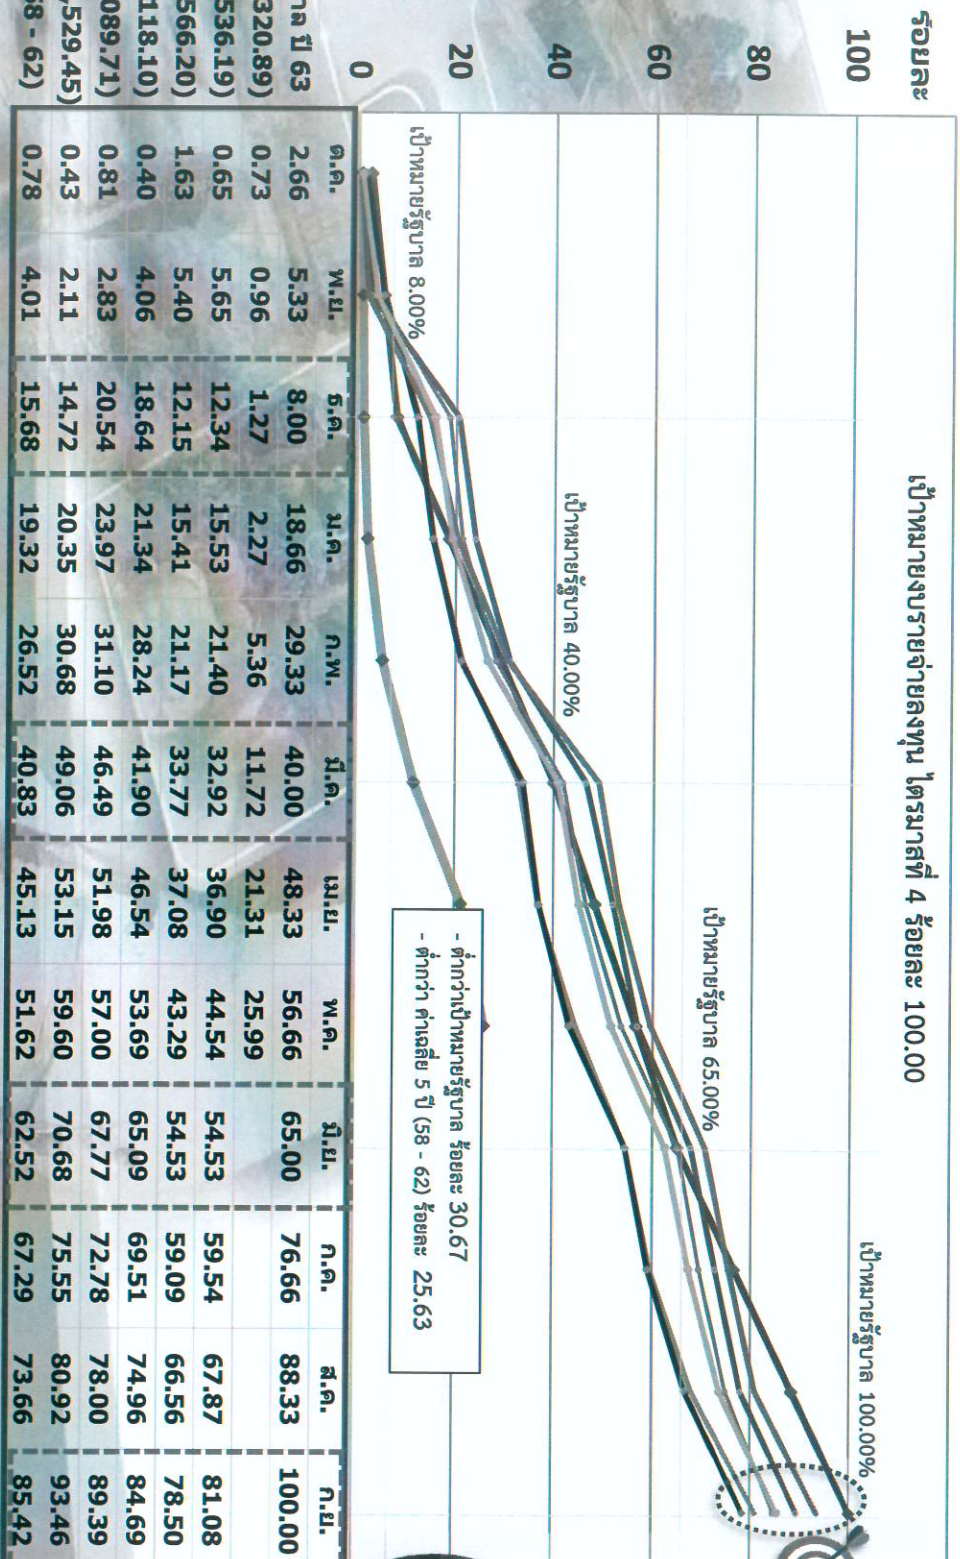

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.บ.	งบประมาณโอนใช้การ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/ใช้การ	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.บ.	งบประมาณโอนใช้การ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/ใช้การ
สขบ.1	1,162.97	1,071.50	245.22	22.89	สขบ.16	1,839.79	1,686.74	171.07	10.14
สขบ.2	1,194.20	1,172.16	273.45	23.33	สขบ.17	912.79	862.03	99.31	11.52
สขบ.3	1,122.89	1,029.04	223.90	21.76	สขบ.	431.08	424.51	66.99	15.78
สขบ.4	1,414.77	1,379.60	213.89	15.50	สขบ.	460.63	459.89	47.52	10.33
สขบ.5	2,214.95	1,709.38	427.13	24.99	สขบ.	11,863.30	11,585.72	3,704.29	31.97
สขบ.6	3,316.51	3,158.06	947.17	29.99	สขบ.	8,470.34	7,806.93	2,292.56	29.37
สขบ.7	2,809.33	2,890.75	782.46	27.07	สขบ.	475.27	449.41	102.57	22.82
สขบ.8	2,812.51	2,664.01	365.96	13.74	สขบ.	127.53	127.53	27.61	21.65
สขบ.9	2,750.54	2,629.69	506.72	19.27	สขบ.	-	0.50	-	-
สขบ.10	1,103.29	1,064.75	236.89	22.25	สขบ.	3,626.50	3,626.50	2,661.40	73.39
สขบ.11	1,816.49	1,819.75	188.49	10.36	สขบ.	1,356.19	1,342.60	423.80	31.57
สขบ.12	2,631.71	2,730.28	492.61	18.04	สขบ.	1.06	1.06	0.93	87.18
สขบ.13	1,049.23	1,008.41	307.37	30.48	รวม	-	-	-	-
สขบ.14	2,460.96	2,375.06	326.07	13.73	LUMP SUM	149.00	149.00	13.23	8.88
สขบ.15	1,341.46	1,230.12	139.24	11.32	รวม	58,915.30	56,460.41	15,287.84	27.08

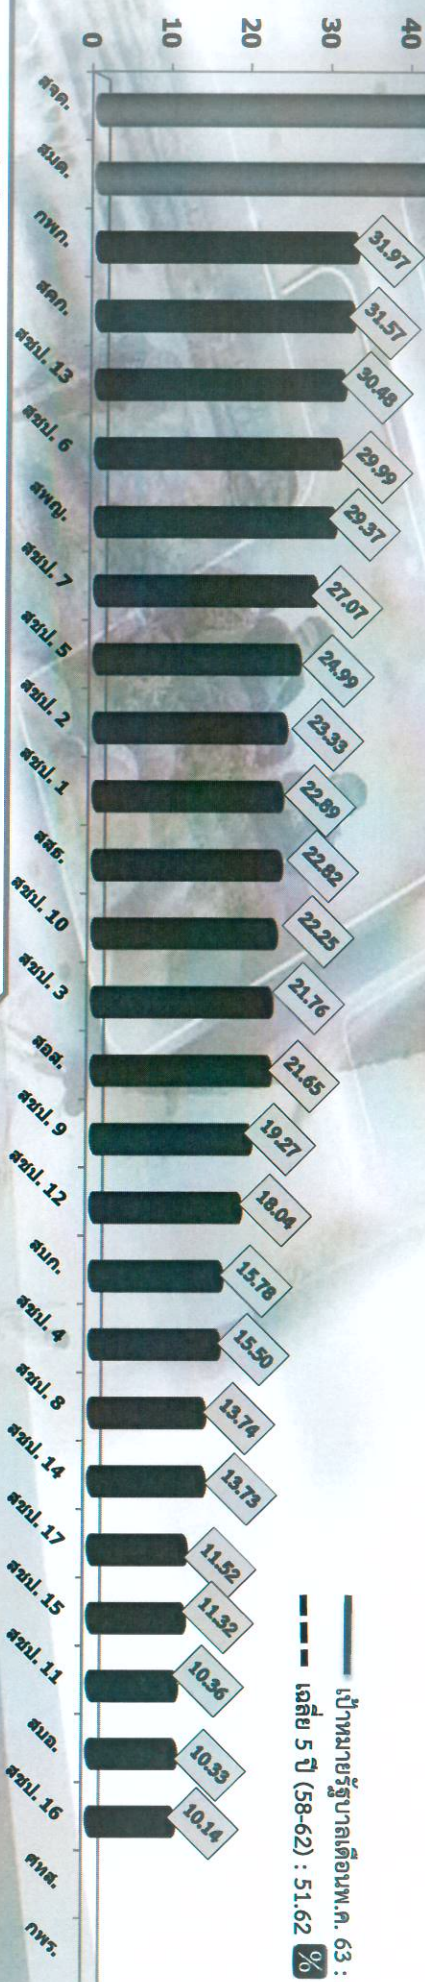

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 58 รายการ งบประมาณ 366.17 ล้านบาท

2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 342 รายการ งบประมาณทั้งสิ้นโอนเปลี่ยนแปลง 722.87 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ☒ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	67,043.30	17,082.75	25.48	65,640.65	27,507.18	41.91	-16.43
2	กระทรวงคมนาคม	163,534.84	31,690.93	19.38	166,987.40	75,804.31	45.40	-26.02
3	กระทรวงมหาดไทย	80,106.33	9,399.53	11.73	66,632.13	16,709.94	25.08	-13.35
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,346.04	837.46	35.70	2,980.09	1,536.96	51.57	-15.87
2	กรมชลประทาน	59,095.57	15,350.04	25.99	58,193.50	24,038.86	41.31	-15.32
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,265.74	200.88	15.87	1,410.41	289.18	20.50	-4.63
	ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,893.33	7,578.06	30.44	24,489.16	8,433.06	34.44	-4.00
2	กรมชลประทาน	59,065.20	15,350.04	25.99	58,193.50	24,038.86	41.31	-15.77
3	กรมทางหลวง	108,025.39	25,426.80	23.54	111,286.01	48,819.80	43.87	-20.33
4	กรมทางหลวงชนบท	45,881.20	5,246.16	11.43	45,070.70	24,357.40	54.04	-42.61

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากการบัญชีกลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 22.95%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (42 หน่วยงาน) เฉลี่ย 21.39%

3. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือปี/กันขยาย พ.ศ. 2555 – 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

งบประมาณเงินกู้ยืม/เงินช่วยเหลือ/กันขยาย ปี 2555 – 2562 ยอดเงินคงเหลือ



สถานการณ์ดำเนินงานปัจจุบัน

เงินกู้ยืม/กันขยาย พ.ศ. 2555 - 2562 (ล้านบาท)				
สถานะดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบเงินกู้	เงินกู้	ร้อยละ (สาย PO) คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,391	13,878.5527	7,226.1494	52.07
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,064	5,730.4222	5,300.4134	92.50
ยกเลิกรายการ	3	63.7852	-	63.7852
อยู่ระหว่างดำเนินการ	324	8,084.3454	1,925.7360	23.82



กองแผนงาน

รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (แยกรายสำนัก)

สำนัก/กอง	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยอดเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	สำนัก/กอง	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยอดเงินคงเหลือ (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	324	5,832.0968	สทป.15	11	188.6772
สทป.1	4	18.7469	สทป.16	4	18.8190
สทป.2	8	60.0861	สทป.17	15	102.8808
สทป.3	6	29.2720	สทก.	1	289.0000
สทป.4	6	28.0121	สทอ.	8	44.3101
สทป.5	15	209.8499	สทญ.	55	2,538.4875
สทป.6	8	41.6752	ททท.	35	835.3518
สทป.7	3	6.7158	สทก.	1	0.6167
สทป.8	27	218.3321	สทบ.	45	292.3952
สทป.9	14	205.0199	สทพ.	1	0.8239
สทป.10	9	99.5988	สทส.	1	15.4409
สทป.11	12	210.9976	สทด.	4	0.9212
สทป.12	3	61.7397	สจต.	2	13.2027
สทป.13	4	23.0269	ททท.	2	2.4571
สทป.14	20	275.6399			

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
2. มีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และต้องการของราษฎรในพื้นที่
3. ผู้รับจ้างออกเอกสารสัญญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผู้รับจ้างรายใหม่ และบางรายการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีงบประมาณคงเหลือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอสลาย PO



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

4. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 15 เม.ย. 63)

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบกลาง ทั้งสิ้น 5

ประเภท 7 โครงการ โดยดำเนินการตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 รายละเอียด ดังนี้

งบประมาณรวมปี พ.ศ. 2559 - 2563

ล้านบาท



งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,017.08 ล้านบาท
ผลเบิกจ่ายรวม 9,626.22 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวมปี พ.ศ. 2559 - 2563



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 305 รายการ



งานแล้วเสร็จ 1,293 รายการ

ยกเลิก 6 รายการ

ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 1,618 รายการ

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมชลประทาน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ผลการดำเนินงานรวมปี พ.ศ. 2559 - 2563 รายละเอียดดังนี้

1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทยตามแนวทางการปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาวัยแล้ง และอุทกภัย (ระยะเวลา ค.ศ. 59 - ก.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการปฏิรูปในการสร้างความ เข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

จำนวน 1,050 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ
งานแล้วเสร็จ 1,044 รายการ
ยกเลิก 5 รายการ

เงิน งบ. 5,765,591.8 ล้านบาท
เบิก 5,014,523.1 ล้านบาท (87.11%)

2 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล (ระยะเวลา ก.ย. 60 - มิ.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างระบบผันน้ำ และค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดิน

จำนวน 58 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ
งานแล้วเสร็จ 54 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

เงิน งบ. 1,590,443 ล้านบาท
เบิก 1,407,016.8 ล้านบาท (88.46%)

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) ประจำปี 2561 (ระยะเวลา ค.ศ. 60 - ก.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดทำแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน 76 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 รายการ
งานแล้วเสร็จ 1 รายการ

เงิน งบ. 1,613,034.3 ล้านบาท
เบิก 1,350,183.4 ล้านบาท (83.70%)

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) ประจำปี 2562 (ระยะเวลา ค.ศ. 60 - ก.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดทำแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน 70 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ
งานแล้วเสร็จ 56 รายการ

เงิน งบ. 1,653,731.1 ล้านบาท
เบิก 1,373,343.1 ล้านบาท (83.03%)

5 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากการอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

ลักษณะการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดทำแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน 64 รายการ
งานแล้วเสร็จ 64 รายการ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

เงิน งบ. 188,799.6 ล้านบาท
เบิก 166,205.3 ล้านบาท (88.03%)

4. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานงบกลาง ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

กรมชลประทาน



ปี
2563

- งบกลางปี 2563 ลักษณะการดำเนินงาน 2 โครงการ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2563
 2. งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เงิน งบ. 3,214,383 ลบ.
เบิก 314,9470 ลบ.
(9.80%)

จำนวน = 300 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 286 รายการ
งานแล้วเสร็จ - รายการ

6

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2563

(ระยะเวลา ต.ค. 63 - ก.ย. 63)

ลักษณะการดำเนินงาน : การก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาล จัดหาแหล่งสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เงิน งบ. 653,5145 ลบ.
เบิก 73,5252 ลบ.
(11.25%)

จำนวน = 34 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ
งานแล้วเสร็จ - รายการ

7

งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง

(ระยะเวลา ต.ค. 60 - ก.ย. 63)

เมื่อ
แล้วเสร็จ

เป้าหมาย
GOALS



พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่



พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่



ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม.

ครัวเรือนรับประโยชน์ 79,624 ครัวเรือน



การจัดจ้างงานชลประทาน 7,300 คน

ลักษณะการดำเนินงาน : กักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน โดยแบ่งเป็น

น้ำฝน 83 รายการ
ชลลือกคลอง 36 รายการ



เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 116 รายการ
ฝาย/อาคารบังคับน้ำ 31 รายการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เงิน งบ. 2,560,8638 ลบ.
เบิก 241,4218 ลบ.
(9.43%)

จำนวน = 266 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 รายการ
งานแล้วเสร็จ - รายการ

จ้างแรงงานชลประทาน

แผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน
ผลจ้างแรงงานแล้ว 1,431 คน
เบิกจ่าย 13,3853 ล้านบาท

จังหวัดที่มีการจ้างแรงงาน มากที่สุด 3 ลำดับ คือ

- 1 อุบลราชธานี = 542 คน
- 2 อำนาจเจริญ = 226 คน
- 3 เชียงใหม่ = 178 คน

5. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

ประเภท	รายละเอียด	การเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	697.8861	513.4164	73.57	1,328	15	99	1,214	
งานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	เป็นเงินทุนสนับสนุนงานของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไข ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	935.0000	230.7343	24.68	78	-	78	-	

เป็นเงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินใหม่มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางน้ำเลี้ยงไม่รบกวนระดับพื้นที่ดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางแผนจัดรูปที่ดินใหม่

