



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) สำนักงานชลประทานที่ ๑ โทร.๑๓๘

ที่ สชป ๑.๐๑/๒๗๖

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน รอง ผส.ชป.๑ ผศร. ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.๑ ผสญ.๑ ผสภ.๑ ผบค.๑ คก. ผจจ.๑
ผอช.ภาคเหนือตอนบน และ ผอ./หน.หน่วยงานฝาก

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้มีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (ห้อง SWOC) สำนักงานชลประทานที่ ๑ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วได้บรรจุขึ้นเว็บไซต์ สชป.๑ (www.rid-1.com) เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายบจूम สุริยกานต์)
ผบท.ชป.๑

ร่าง
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) สชล.๑

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุตชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ชล.๑	ประธาน
๒.	นายวุฒิชัย	รักษาสุข	ผคป.ลำพูน รก. รอง ผส.ชล.๑	
๓.	นายอภิววัฒน์	ภูมิไธสง	ผจบ.ชล.๑	
๔.	นายนิธิ	วรมงคล	ผผง.ชล.๑	
๕.	นายณัฐวุฒิ	นากสุก	ผวศ.ชล.๑	
๖.	นายวิชัย	ชัยเจริญชาติ	ผคก.ชล.๑	
๗.	นายปฐม	สุรียกานต์	ผบท.ชล.๑	
๘.	นายจรินทร์	คงศรีเจริญ	ผคป.เชียงใหม่	(Conference)
๙.	นายกตัญญู	ใจชื่น	ผคป.แม่ฮ่องสอน	(Conference)
๑๐.	นายศักดิ์ชัย	दानบุญเรือน	ผคบ.แม่แตง	(Conference)
๑๑.	นายเจนศักดิ์	ลิ้มปิติ	ผคบ.แม่กวางอุดมธารา	
๑๒.	นายเฉลิมเกียรติ	อินทกนก	ผคบ.แม่แฝก-แม่จันทะ	(Conference)
๑๓.	นายพิทยา	อิมเอม	ผคส.๑	
๑๔.	นายไพรัตน์	หับประเสริฐ	ผสร.ห้วยฮ่องไคร้ฯ	
๑๕.	นายจิตะพล	รอดพลอย	ผสญ.๑	(Conference)
๑๖.	นายอัฐวิชัย	นาควัชร	ผสก.๑	(Conference)
๑๗.	นายสมคิด	สะเภาคำ	ผอช.ภาคเหนือตอนบน	
๑๘.	นายอุบลศักดิ์	ชัยวัง	วศ.๑ กก. แทน ผบค.๑ กก.	
๑๙.	นายวรเดช	ชินพงศ์วิวัฒน์	ทน.๑ บอ.	
๒๐.	นายสุขสวัสดิ์	นวลจันทร์	จด.๑/๑ มด.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายธีรพันธุ์	เต็ดขาด	วศ.คบ.แม่กวางอุดมธารา
๒.	นายจักรกฤษณ์	ชมภูบาง	ผง.ชล.๑
๓.	นายราชรัฐ	สัตถาผล	ยศ.ชล.๑
๔.	นายวชิรวิทย์	กันกา	กพ.ชล.๑
๕.	นายก่อพงศ์	เจษฎาพันธ์	ตป.ชล.๑
๖.	นายชัชชัย	เพชรอักษร	อบ.ชล.๑
๗.	นายจิรัชย์	พัฒนพงศา	พค.ชล.๑
๘.	นายมนูญ	สุขศิริพัฒน์	สป.ชล.๑
๙.	นายธนิต	จำภา	บน.ชล.๑
๑๐.	นายศุภมิตร	กฤษณมิตร	ปช.ชล.๑
๑๑.	นายสันหพจน์	นันทิทรภ	ปบ.ชล.๑
๑๒.	นายปราณต์	จรมาศ	ปน.ชล.๑

๑๓.นายณอมศักดิ์...

๑๓. นายถนอมศักดิ์	แก้วดุ่ยพันธ์	วค.ขป.๑
๑๔. นายสุพรรณดี	รักชื่น	พท.ขป.๑
๑๕. นายพงศ์สวัสดิ์	มังคละ	ปย.ขป.๑
๑๖. นายสุรพงศ์	เพ็ญประไพ	ชบ.ขป.๑
๑๗. นางสาวลินจง	คงตั้งมั่น	จก.ขป.๑
๑๘. นางกัลยารัตน์	ลิ้มเสรี	บส.ขป.๑
๑๙. นางนภัสวรรณ	คำศรี	งบ.ขป.๑
๒๐. นางสาวณัฐริกา	เจตีย์หน่อ	ปท.ขป.๑ และ พต.ขป.๑
๒๑. นายนิรุตติ์	คำชัยวงศ์	นิติกรประจำ สขป.๑
๒๒. นายปรีชา	แย้มเย็น	วป.อช.
๒๓. นายธีรพงศ์	พรหมนิมิต	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
๒๔. นายพัชรพงษ์	สาเขตร์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๕. นายณัฐพล	สารถ้อย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๖. นายพิพัฒน์	ปฏิพัทธ์ปถวี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๗. นางสาวทิพรดา	แก้วประเสริฐ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๘. นายวงศกร	ขัดทะเสมา	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๒๙. ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบ	Video Conference	

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑ มีคำสั่ง ที่ ข ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ รอง ผส.ขป.๑ ผผง.ขป.๑ ผวศ.ขป.๑ และ ผจบ.ขป.๑ ปฏิบัติหน้าที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ ดังนี้

- รอง ผส.ขป.๑ ติดตามงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างและศูนย์ศึกษาฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
- ผผง.ขป.๑ ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ เขียงใหม่และโครงการฯ แม่แตง
- ผวศ.ขป.๑ ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่ฮ่องสอนและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา
- ผจบ.ขป.๑ ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ ลำพูนและโครงการฯ แม่กวงฯ

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และขอให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอ ผส.ขป.๑ ตามแบบรายงานที่แนบ



สำนักงานชลประทานที่ ๑
๕ ข ๑ / ๒๕๖๓
วัน... พฤษภาคม ๒๕๖๓

เพื่อทราบและดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ ดังนี้

๑. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ เขียงใหม่และโครงการฯ แม่แตง

๒. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่ฮ่องสอนและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๓. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ ลำพูนและโครงการฯ แม่กวงฯ

๔. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๕. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๖. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๗. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๘. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๙. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๑๐. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๑๑. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๑๒. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

๑๓. ติดตามงานก่อสร้างของโครงการฯ แม่จันทาและโครงการฯ แม่แฝก-แม่จันทา

บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการชลประทานที่ ๑									
๕ ข ๑ / ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓ - ๒๕๖๓									
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง / หน้าที่	ส่วนงาน	ระดับ	ส่วนงาน	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง / หน้าที่	ส่วนงาน	ระดับ
๑	นายสุพรรณดี รักชื่น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายสุพรรณดี รักชื่น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๒	นายสุรพงศ์ เพ็ญประไพ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายสุรพงศ์ เพ็ญประไพ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๓	นางสาวลินจง คงตั้งมั่น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นางสาวลินจง คงตั้งมั่น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๔	นางกัลยารัตน์ ลิ้มเสรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นางกัลยารัตน์ ลิ้มเสรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๕	นางนภัสวรรณ คำศรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นางนภัสวรรณ คำศรี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๖	นางสาวณัฐริกา เจตีย์หน่อ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นางสาวณัฐริกา เจตีย์หน่อ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๗	นายนิรุตติ์ คำชัยวงศ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายนิรุตติ์ คำชัยวงศ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๘	นายปรีชา แย้มเย็น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายปรีชา แย้มเย็น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๙	นายธีรพงศ์ พรหมนิมิต	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายธีรพงศ์ พรหมนิมิต	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๑๐	นายพัชรพงษ์ สาเขตร์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายพัชรพงษ์ สาเขตร์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๑๑	นายณัฐพล สารถ้อย	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายณัฐพล สารถ้อย	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๑๒	นายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๑๓	นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ
๑๔	นายวงศกร ขัดทะเสมา	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ	ผอ.	นายวงศกร ขัดทะเสมา	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	สำนักงานชลประทานที่ ๑	ผู้อำนวยการ

คำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ ที่ ข ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผล...

๑.๒ กรมมีมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนปี ๒๕๖๓ และเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
 - ๒) ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
 - ๓) บริหารจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน
 - ๔) กักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดตามช่วงเวลา
- เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์
- ๕) วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย



ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายปฐม สุริยกานต์ ผบท.ชป.๑ : ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนร่างรายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยท่าน ผส.ชป.๑ ได้แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขหน้า ๓๔ ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีผู้ใดแก้ไขเพิ่มเติม ขออนุญาตที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ฝบท.ชป.๑...

ผบ.ท.ชป.๑ : ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน ขอให้ติดรูปถ่ายผู้สมัครที่เป็นปัจจุบันในใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และได้รับแจ้งจาก กบ.ชป.๑ ว่าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างชั่วคราวบางคนไม่มีการเคลื่อนไหว ขอให้หน่วยงานตรวจสอบด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ สภาพภูมิอากาศ

นายสมคิด สะเภาคำ ผอ.ช.ภาคเหนือตอนบน รายงานสภาพภูมิอากาศโดยสรุป ดังนี้

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ตาก พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนล่างในระยะต่อไป

สำหรับพายุโซนร้อน “หว่องฟ่ง” (VONGFONG) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

พยากรณ์อากาศประจำวัน

พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๘-๔๑ องศาเซลเซียส



พยากรณ์อากาศ...

พยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ และ ๑๘-๑๙ พ.ค. ๖๓ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๔๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๖-๔๑ องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๗ พ.ค. ๖๓ อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐-๒๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๗-๔๒ องศาเซลเซียส

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย ๓ เดือน

เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ออกประกาศ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและบางครั้งอาจเกิดลูกเห็บตกจากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำ ส่วนครึ่งหลังของเดือน เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิจะลดลงมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น

เดือนมิถุนายน จะมีฝนตกชุกระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้ประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน

เดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนมากมีกำลังอ่อน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อย ส่วนช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้นจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง

รายงานสภาพน้ำฝน

กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนที่สถานี สขป.๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานี สขป.๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณฝน...


กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนสถานีอุตุลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน



กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานีอุตุลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน



กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนสถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

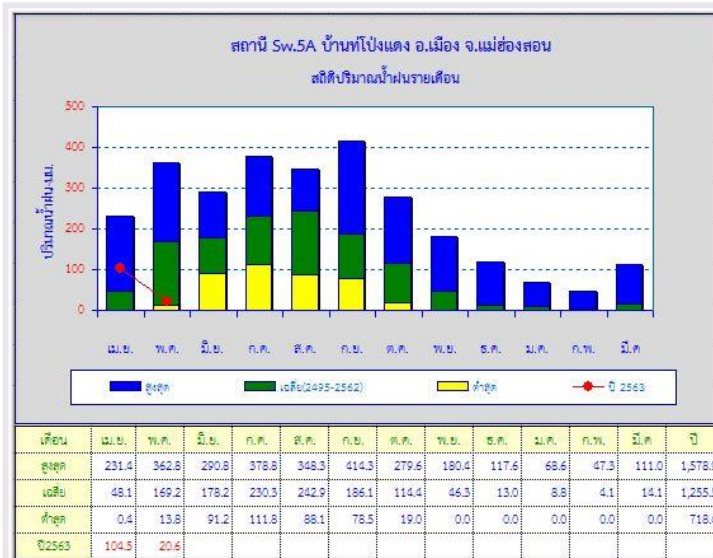


กราฟแสดงปริมาณฝน...

กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สภาพน้ำท่า
สถานการณ์น้ำ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

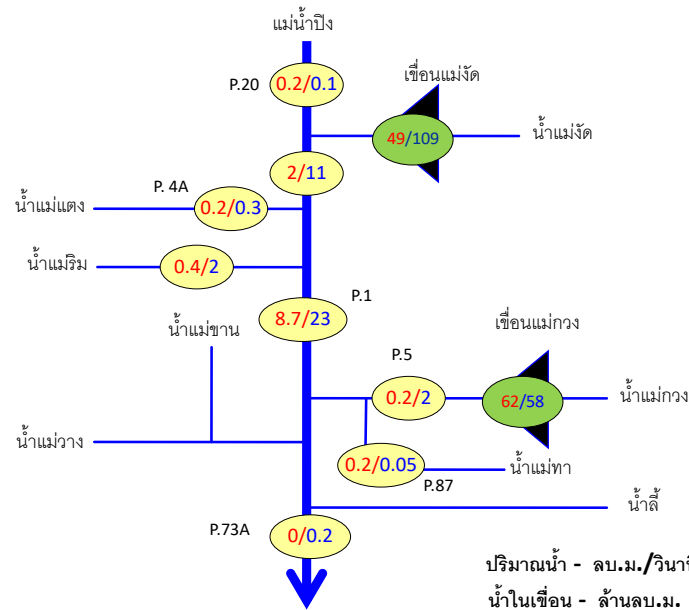


กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือนสถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนาครี อ.เมือง จ.เชียงใหม่




กราฟแสดงปริมาณ...


กราฟแสดงปริมาณน้ำทำรายเดือนสถานี P.5 น้ำกวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

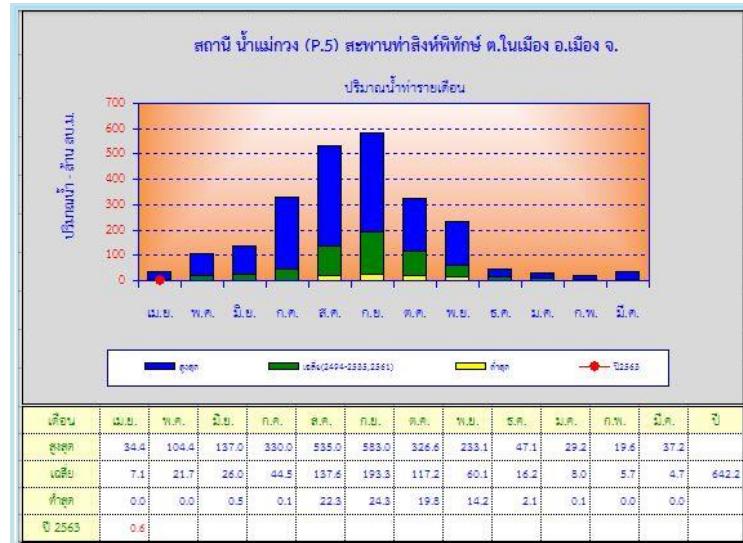


กราฟแสดงปริมาณน้ำทำรายเดือนสถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

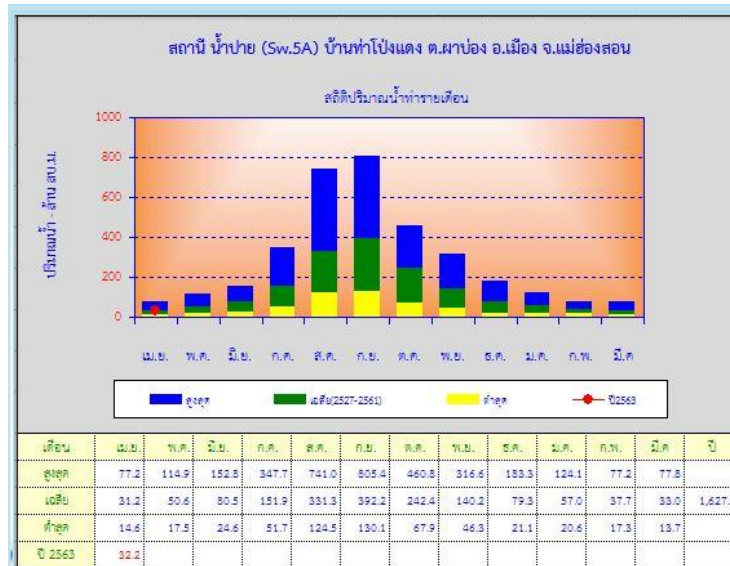


กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้ำทำรายปี
สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนารัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

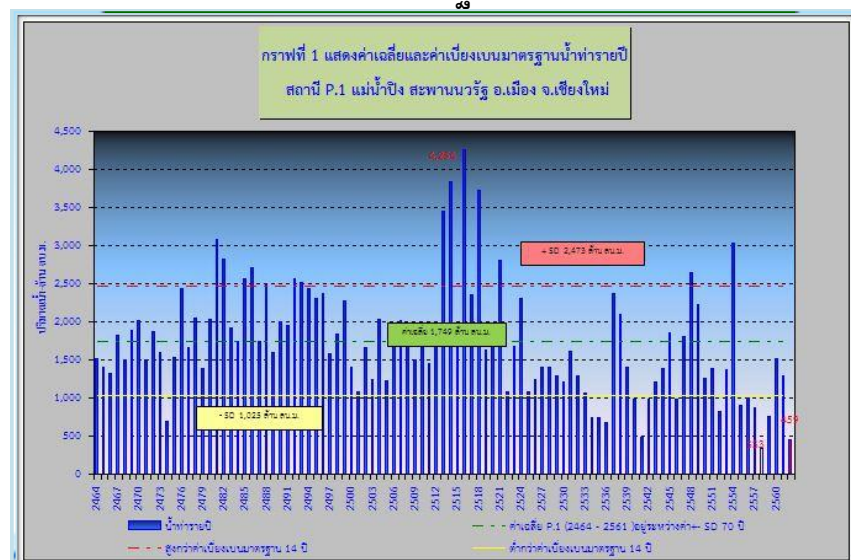

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้ำทำรายปี
สถานี P.5 น้ำกวาง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน

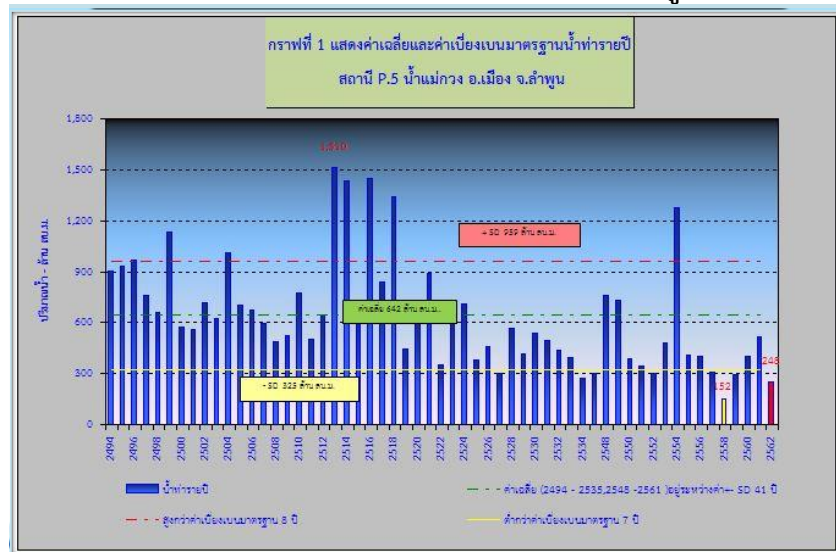

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้ำทำรายปี
สถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

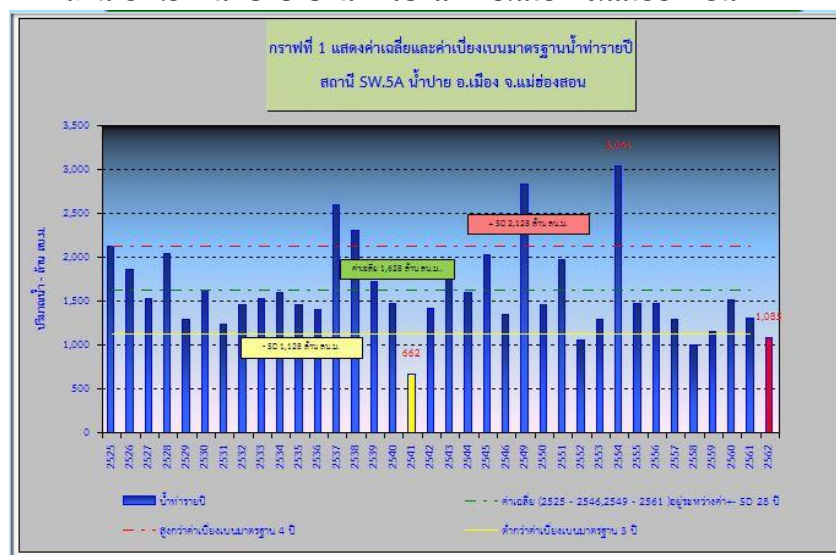

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผจบ.ขป.๑ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
ในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ดังนี้

สถานการณ์แหล่งน้ำชลประทาน (สขป.1)		วันที่ 14 พ.ค.63	
ขนาดเล็ก ความจุตั้งแต่ 1 แสน ม. ³ จำนวน 191 แห่ง	ขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง	ขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง	
- น้อยกว่า 20% จำนวน 67 แห่ง - ช่วง 20-30% จำนวน 21 แห่ง - ช่วง 30-80% จำนวน 92 แห่ง - ช่วง 80-100% จำนวน 10 แห่ง - มากกว่า 100% จำนวน 1 แห่ง	- น้อยกว่า 20% จำนวน 5 แห่ง - ช่วง 20-30% จำนวน 4 แห่ง - ช่วง 30-80% จำนวน 8 แห่ง - ช่วง 80-100% จำนวน 1 แห่ง - มากกว่า 100% จำนวน 0 แห่ง	เขื่อนแม่งัดตา	เขื่อนแม่งาวงา
		ปัจจุบัน 48.85 ล้าน ม.³ (18.43%) ปี 62 110.47 ล้าน ม.³ (42%)	ปัจจุบัน 62.40 ล้าน ม.³ (23.72%) ปี 62 59.33 ล้าน ม.³ (23%)
ภาพรวม 33%	ภาพรวม 23%	ภาพรวม 111.243 ล้าน ลบ.ม. (22.17%)	
เก็บกักน้ำได้อีก 66.93 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้อีก 94.92 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้อีก 216.15 ล้าน ลบ.ม.	เก็บกักน้ำได้อีก 200.61 ล้าน ลบ.ม.
		ภาพรวม เก็บกักน้ำได้อีก 416.76 ล้าน ลบ.ม.	

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563)	ความจุที่ ระดับเก็บ กัก รน. (ล้าน ม ³)	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปี 2562		ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน	
		ปริมาณน้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.	ปริมาณ น้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.
โครงการชลประทานเชียงใหม่		(ต่ำกว่า 50 % - 6 แห่ง)		(ต่ำกว่า 50 % - 8 แห่ง)	
อ่างฯ แม่ฮอน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน	4.53	1.13	24.90%	0.93	20.62%
อ่างฯ แม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน	0.85	0.71	83.06%	0.59	68.94%
อ่างฯ แม่จอหลวง ต.คอนแก้ว อ.แม่วิม	1.10	1.00	91.09%	0.65	59.18%
อ่างฯ แม่โก้น ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว	5.53	1.18	21.25%	3.17	57.23%
อ่างฯ ห้วยมะนาว ต.บ้านกาด อ.สันป่าตอง	4.30	1.55	35.93%	1.03	24.00%
อ่างฯ ไปง้อ ต.สันติสุข อ.คอยหล่อ	2.60	0.65	25.00%	0.46	17.50%
อ่างฯ ห้วยเตือ ต.แม่มอน อ.ฝาง	4.27	2.73	63.82%	0.92	21.49%
อ่างฯ แม่หลวงหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย	3.64	1.97	54.11%	1.30	35.68%
อ่างฯ แม่ตูป ต.โป่งทุ่ง อ.คอยเต่า	39.00	14.60	37.44%	4.62	11.85%
อ่างฯ สันหนอง ต.ช้างเคือง อ.แม่แจ่ม	1.45	0.74	50.83%	0.52	35.52%
อ่างฯ แม่ซ้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว	4.08	2.45	60.15%	2.45	60.02%
อ่างฯ แม่ทะลบหลวง	15.30	4.92	32.18%	6.46	42.22%
รวม จำนวน 12 แห่ง	86.657	33.619	38.80%	23.09	26.64%

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดลำพูน (เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.rid-๑.com)

ที่	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563)	ความจุที่ระดับเก็บ กัก รน. (ล้าน ม ³)	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปี 2562		ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน	
			ปริมาณน้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.
1	อ่างฯ แม่ธิ อ.เมือง	5.500	4.830	87.82%	1.12	20.40%
2	อ่างฯ แม่ตีบ อ.เมือง	10.000	5.100	51.00%	1.23	12.28%
3	อ่างฯ แม่สาม อ.เมือง	16.000	3.430	21.44%	1.18	7.36%
4	อ่างฯ แม่เมย อ.แม่ทา	3.600	3.200	88.89%	0.53	14.78%
	รวมจำนวน 4 แห่ง	35.100	16.560	47.18%	4.06	11.56%

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563)	ความจุที่ ระดับเก็บกัก รณ. (ล้าน ม ³)	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปี 2562		ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน	
			ปริมาณน้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.	ปริมาณน้ำ (ล้าน ม ³)	% เทียบกับ ความจุ รณ.
1	อ่างฯ ห้วยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง	0.834	0.557	66.79%	0.79	95.20%
2	อ่างฯ แม่สะกิด อ.เมือง	0.540	0.334	61.85%	0.32	58.70%
	รวมจำนวน 2 แห่ง	1.374	0.891	64.85%	1.11	80.86%

แผน/ผล การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑

(จ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปี ๒๕๖๒

แผน/ผล การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563				แผน 202,756 ไร่ / ผล 240,472 ไร่ คิดเป็น 119% เกือบเกี่ยวแล้ว 213,052 ไร่ (89%)													
โครงการ	ข้าวนาปรัง (ไร่)			พืชไร่-พืชผัก (ไร่)			ไม้ผล-ไม้ยืนต้น (ไร่)		ปอปล่า (ไร่)		อื่นๆ (ไร่)		รวม (ไร่)			% ผล เทียบแผน	% เกือบ เกี่ยวเทียบ ผล
	แผน	ผล	เกิน/ต่ำกว่า	แผน	ผล	เกิน/ต่ำกว่า	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	เกิน/ต่ำกว่า				
โครงการชลประทานเชียงใหม่	3,665	13,712	5,340	2,185	2,532	2,532	35,606	28,510	364	348	-	360	41,820	45,462	37,090	109%	82%
โครงการชลประทานลำพูน	-	7,812	7,812	-	240	240	54,374	53,207	115	115	-	-	54,489	61,374	61,374	113%	100%
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	-	-	-	9,089	9,298	9,298	1,617	1,493	157	157	107	107	10,970	11,055	11,055	101%	100%
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่มด - แม่ใจ	13,286	13,286	9,808	6,814	6,701	6,701	19,781	19,781	405	187	-	113	40,286	40,068	36,590	99%	91%
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะแม่วาง	-	11,953	-	-	-	-	25,055	25,055	-	3,212	-	-	25,055	40,220	28,267	161%	70%
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	-	13,306	9,891	3,200	1,276	1,074	26,208	26,912	713	736	15	63	30,136	42,293	38,676	140%	91%
รวม	16,951	60,069	32,851	21,288	20,047	19,845	162,641	154,958	1,754	4,755	122	643	202,756	240,472	213,052	119%	89%

แผน/ผล การส่งน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563

แผน 406.34 ล้าน ลบ.ม. /ผล 368.41 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91% น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้

สรุปการให้...

สรุปการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2562/63

โครงการ	เครื่องสูบน้ำ 8"-12"			พื้นที่ช่วยเหลือ (ไร่)	ปริมาณน้ำ ที่สูบสะสม (ลบ.ม.)
	แผน	ผล	คงเหลือ		
โครงการชลประทานเชียงใหม่	17	5	12	1,296	262,500
โครงการชลประทานลำพูน	14	0	14	-	-
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	4	1	3	329	305,000
โครงการส่งน้ำ แม่แตง	24	3	21	1,680	484,500
โครงการส่งน้ำ แม่แจ่ม-แม่จัน	0	0	0	-	-
โครงการส่งน้ำ แม่กวธา	20	8	12	2,916	2,172,000
รวม	79	17	62	6,221	3,224,000

รถบรรทุกน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน 854,000 ลิตร
เพื่อการเกษตร จำนวน 236,500 ลิตร
รวม จำนวน 1,090,500 ลิตร

รถบรรทุกน้ำและเฮลิคอปเตอร์
เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า จำนวน 51,000 ลิตร

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2562/63

- จำนวน 13 อำเภอ 49 ตำบล 550 หมู่บ้าน
- ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 131,534ครัวเรือน 336,684 ราย
- พื้นที่การเกษตรเสียหาย 42,202 ไร่
- ปศุสัตว์ 17,445 ตัว ประมง 78 กระชัง

ข้อมูล จาก ปก.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563



การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๓และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๓

แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน

พื้นที่เพาะปลูกในเขต สขป.1

- สนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
- สนับสนุนการเพาะปลูกในแต่ละโครงการตามฤดูกาลปกติ และกรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

แผนการป้องกันอุทกภัย

มาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง

- เชื่อมโยงข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
- ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
- คณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน
- คาดการณ์และติดตามสถานการณ์ทางอุทกวิทยา
- บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดย Reservoir Operation Simulation และ Reservoir Operation Rule Curve
- เตรียมอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
- ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกพืช เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำหลาก
- เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่
- ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำ

มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารชลประทาน
- ใช้อาคารชลประทานและระบบชลประทานดักน้ำหลาก เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและควบคุมปริมาณน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร



แผนการจัดสรรน้ำ...

ข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานหลักในการระบายนํ้าปี 2563

สำนักงานชลประทานที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63

ลำดับที่	โครงการชลประทาน,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	อาคารชลประทานหลักที่รับผิดชอบ (แห่ง)	สภาพพร้อมใช้งาน		ชำรุดบางส่วน (สามารถใช้งานได้)		ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้		หมายเหตุ
			แห่ง	%	แห่ง	%	แห่ง	%	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	4	4	100	0	0	0	0	
2	โครงการชลประทานลำพูน	11	11	100	0	0	0	0	
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0	0	0	
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่ใจ สมบูรณ์	5	5	100	0	0	0	0	
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่ใจ	30	30	100	0	0	0	0	
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กาอุดมธารา	27	27	100	0	0	0	0	
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		77	77	100	0	0	0	0	

ข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานปี 2563

สำนักงานชลประทานที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63

ลำดับที่	โครงการชลประทาน,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	อาคารชลประทานหลักที่รับผิดชอบ (แห่ง)	สภาพพร้อมใช้งาน		ชำรุดบางส่วน (สามารถใช้งานได้)		ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้		หมายเหตุ
			แห่ง	%	แห่ง	%	แห่ง	%	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	377	281	74.54	87	23.08	9	2.39	
2	โครงการชลประทานลำพูน	9	8	88.89	1	11.11	0	0.00	
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	12	12	100.00	0	0.00	0	0.00	
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่ใจ สมบูรณ์	30	26	86.67	4	13.33	0	0.00	
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่ใจ	31	31	100.00	0	0.00	0	0.00	
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กาอุดมธารา	245	217	88.57	27	11.02	1	0.41	
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	25	25	100.00	0	0.00	0	0.00	
รวม		729	600	82.30	119	16.32	10	1.37	

สรุป ข้อมูลตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานที่ชำรุด (ไม่สามารถใช้งานได้) ปี 2563 จำนวน 10 แห่ง

สำนักงานชลประทานที่ 1

ลำดับ ที่	ชื่ออาคารชลประทานหลัก	(หน่วย)	พิกัดจุดที่ตั้ง		ชำรุด (ไม่สามารถใช้งานได้)	ระบุความเสียหาย	แผนการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง (ปี พ.ศ.)	หมายเหตุ	
			Lat.	Long					
โครงการชลประทานเชียงใหม่									
1	อ่างเก็บน้ำแม่อาย	แห่ง	19.3353	99.1375	✓	ประตูน้ำไม่สามารถควบคุมการเปิด- ปิดได้	ปรับปรุง ปี 2564	อยู่ระหว่างการสำรวจ	สน.3
2	อ่างเก็บน้ำแม่กวาว	แห่ง	19.97765	99.34742	✓	-	-	อ่างฯ เสียหายจากอุทกภัยปี 2537 อยู่ใน แผนงาน 5 ปีของโครงการก่อสร้างขนาดกลาง	สน.4
3	อ่างเก็บน้ำคลองสามพัน	แห่ง	19.4384	98.6084	✓	อ่างฯชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้	ปรับปรุง ปี 2567 สปปคต/ยชชช	ผู้รับผิดชอบ สปป.1	สน.5
4	ฝายต้นน้ำแม่วก 2 แห่ง	แห่ง	18.9238	98.8396	✓	ตะกอนดินทับถม ไม่สามารถเก็บน้ำได้	ขุดลอก ปี 2564	อยู่ระหว่างการสำรวจ	สน.3
5	ฝาย คตล.และระบบน้ำ (จัดหาน้ำป้อนสู่การเพาะ ปลูกปรการ)	แห่ง	19.70834	99.0604	✓			ไม่ได้ใช้งาน อุทกภัยปี 2559 อยู่ในแผน ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ 1 ส่วนน้ำ่าง	สน.4
6	ฝายเชียงดาว	แห่ง	19.4013	98.9879	✓	ฝายพร้อมระบบชำรุดเสียหาย	ปรับปรุง ปี 2567	ผู้รับผิดชอบ ศป.ชน.	สน.5
7	ฝายแม่ป๋าน้อย	แห่ง	19.6996	98.7880	✓	ฝายชำรุดเสียหาย	ปรับปรุง ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ ศป.ชน.	สน.5
8	ฝายห้วยแม่นกและระบบ	แห่ง	19.6546	98.8075	✓	ฝายชำรุดเสียหาย	ปรับปรุง ปี 2565	ผู้รับผิดชอบ ศป.ชน.	สน.5
9	ฝายแม่อัง	แห่ง	18.2102	98.6161	✓	90%	ปรับปรุงปี 2563,2564	(1) มอเตอร์ใช้คอนกรีตชนิด-ปีเตอร์ประตุน้ำ เสีย (2) สายส่งประตุน้ำ 3 ชุด (3) สายไฟ ใต้ดินเพราะถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถ ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดได้	สน.7
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่กาอุดมธารา									
10	ฝายห้วยใจ ลำน้ำห้วยใจ	แห่ง	18.6631	99.1656	✓	ฝายชำรุด เป็นรูโหว่	แผนซ่อมแซมปี 2564		

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 9 แห่ง และโครงการส่งน้ำแม่อายอุดมธารา 1 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 63

การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขต สป.1



สป.เชียงใหม่

กำจัดวัชพืชหน้า ประตูหัวตลาดด้วยแรงงานคน ปริมาณ 1,045 ต้น ผลงานร้อยละ 17



สป.แม่กา

กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำกวางและอ่างฯห้วยหลวงปริมาณ 17,250 ต้น ผลงานร้อยละ 69



สป.แม่กา

กำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำกวางและอ่างฯห้วยหลวงปริมาณ 17,250 ต้น ผลงานร้อยละ 69

แผนของงบประมาณกำจัดวัชพืชเพิ่มเติม ปี 2563
ตามข้อสรุปผลการประชุมคณะทำงานภายใต้
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7/25630

ที่	โครงการ	จำนวน (แห่ง)	วงเงินที่เสนอขอตั้ง (บาท) เฉพาะปี 2563	ปริมาณงาน (ตัน)
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	3	1,250,000	29,822
2	โครงการชลประทานลำพูน	3	708,518	6,946
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก	2	460,000	5,850
4	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	3	1,120,000	17,700
รวม		11	3,538,518	60,318

มาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย



การวิเคราะห์...



การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย (น้ำท่วมซ้ำซาก)

สภาพการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่ มี ๓ ลักษณะ ดังนี้

กรณีที่ ๑ พายุหมุนเขตร้อนหรือร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่าน ภาคเหนือทำให้เกิดฝนตกหนัก เป็นบริเวณกว้าง (น้ำปิงล้นตลิ่ง)

กรณีที่ ๒ เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตอยสุเทพ-ปุยและตัวเมืองเชียงใหม่

กรณีที่ ๓ น้ำล้นตลิ่งลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง (พื้นที่เสี่ยงที่สำคัญ ๑๒ แห่ง)

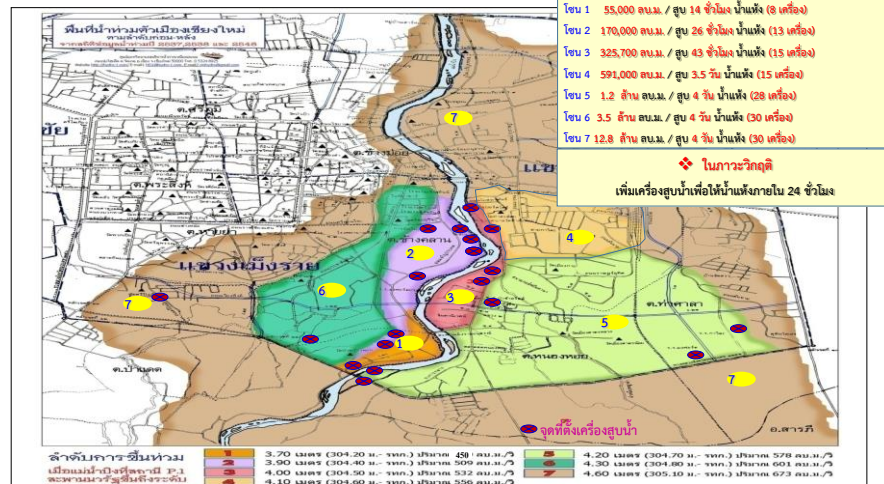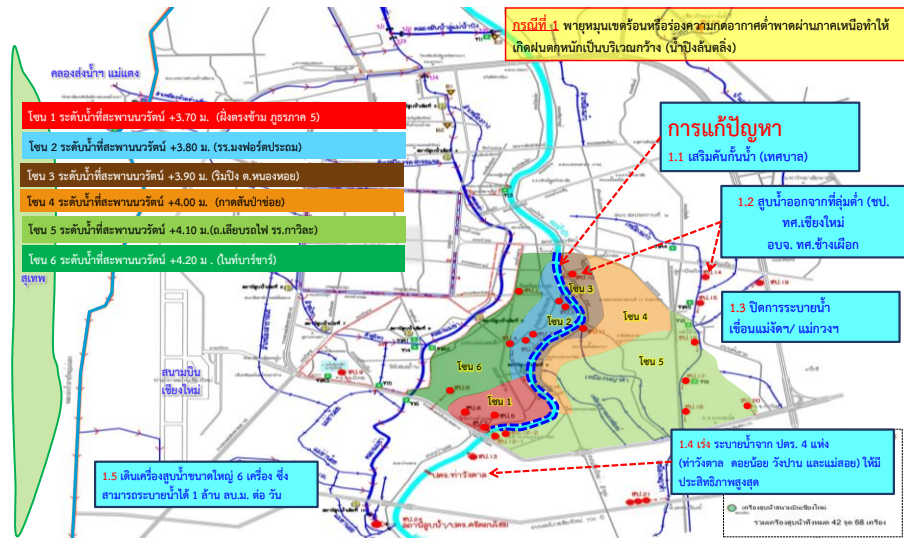

กรณีที่ 2 เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตอยสุเทพ-ปุยและตัวเมืองเชียงใหม่



กรณีที่ ๓...

ข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน ในเขต สขป.1

รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ แยกตามโครงการ
ข้อมูล เดือนเมษายน 2563

ลำดับที่	โครงการ	ผู้บุกรุกเดิม					ผู้บุกรุกใหม่					รวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	แจ้งความ ดำเนินคดี	ศาล พิพากษา	รื้อถอน	คงเหลือ	จำนวน	แจ้งความ ดำเนินคดี	ศาล พิพากษา	รื้อถอน	คงเหลือ		
		ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย	ราย		
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	โครงการชลประทานลำพูน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	โครงการส่งน้ำแม่แตง	369	0	0	369	0	1060	21	2	326	734	734	
5	โครงการส่งน้ำแม่แฝก-แม่รัด	7	0	0	7	0	14	0	2	7	7	7	
6	โครงการส่งน้ำแม่แกวลงอุโมงค์	0	0	0	0	0	22	20	0	2	20	20	
	รวม	376	0	0	376	0	1096	41	4	335	761	761	

สำนักงานชลประทานที่ 1 มีผู้บุกรุกทั้งหมด 1,472 ราย แบ่งเป็น

ผู้บุกรุกเดิม 376 ราย ดำเนินการรื้อถอน 376 ราย คงเหลือ 0 ราย

ผู้บุกรุกใหม่ 1,094 ราย ศาลพิพากษาแล้ว 4 ราย รื้อถอน 335 ราย คงเหลือ 761 ราย

ผู้บุกรุกคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 761 ราย

หมายเหตุ : บุกรุกเดิม หมายถึง การบุกรุกตั้งแต่ปี 2546 ถัดลงไป, บุกรุกใหม่ หมายถึง การบุกรุกตั้งแต่ปี 2546 ขึ้นไปจนถึงปัจจุบัน)
บันทึกข้อความที่ สมต 9.1/110/2563 ขอให้ส่งรายงานประจำเดือนและผลการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินในความครอบครองของชลประทาน
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (**หมายเหตุ) สำนักให้กำหนดส่ง ส่วนบริหารจัดการน้ำ สขป.1 ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน)

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายนิธิ วรมงคล ผมง.ขป.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินกันเหลือปี ๖๒)

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการ/แผนงาน	(รายการ)	กันเหลือปี 62 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น (%)	แล้วเสร็จ (รายการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (รายการ)
โครงการชลประทานเชียงใหม่	10	4,899,228.72	4,899,228.72	100.00	10	
โครงการชลประทานลำพูน	4	1,229,825.90	1,229,825.90	100.00	4	
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	2	2,726,821.33	2,177,652.13	79.86	1	1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวาง	3	11,862,446.20	3,950,118.98	33.30	2	1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	3	10,142,000.00	1,726,007.01	17.02	2	1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่รัด	2	2,490,109.33	2,489,297.38	99.97	2	
โครงการก่อสร้าง สขป.1	1	21,056,579.12	18,531,661.80	88.01		1
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.1	1	1,267,800.00	1,267,800.00	100.00	1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ สขป.1	1	1,627,117.00	1,573,641.87	96.71	1	
สขป.1 (งบดำเนินงาน หมวด 300)	1	139,932.00	58,305.00	41.67		1
รวมทั้งสิ้น	28	57,441,859.60	37,903,538.79	65.99	23	5

ข้อสังเกต ผ.ขป.1 โครงการที่มีงานอยู่ระหว่างดำเนินงาน 4 รายการ ให้ยืนยันว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 63

รายการงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ชื่องาน	กันเหลือปี 62	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ผลงาน สะสม	คงเหลือ เงินกันเหลือปี	หมายเหตุ
		งบ พรบ.62	21,056,579.12	18,531,661.80	88.01		2,524,917.32	
1	โครงการก่อสร้าง สขป.1	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อูคอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	21,056,579.12	18,531,661.80	88.01	80	2,524,917.32	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563
		งบลงทุน เติบโต 62	16,245,901.20	93,853.70	0.58		16,152,047.50	
1	ค.บ.แม่กวาง	อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวาง อุ้มผาง	8,005,901.20	93,853.70	1.17	35	7,912,047.50	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่าแล้วเสร็จแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563
2	ค.บ.แม่แตง	ถนนคั่นคลองส่งน้ำสายซอย 71 ลีชวา ตำบลเชิงลึก อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม.	8,240,000.00	-	-	-	8,240,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก ตามบันทึก สขป.1/174 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
		งบกลาง กปร.62	1,065,954.95	516,785.75	48.48		549,169.20	
1	ค.บ.แม่ฮ่องสอน	โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บริเวณป่าต้นน้ำของ - กลุ่มน้ำป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,065,954.95	516,785.75	48.48	80	549,169.20	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563 (ติดปัญหาพื้นที่ป่า)
		งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ให้ออและวัสดุ	139,932.00	58,305.00	41.67		81,627.00	
1	สขป.1	จ้างเหมาจ้างจัดปรก (ค่าตอบแทน ให้ออและวัสดุ)	139,932.00	58,305.00	41.67	42	81,627.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ วางแผนการใช้เงินสิ้นเดือนกันยายน 2563
		รวมทั้งสิ้น 5 รายการ	38,508,367.27	19,200,606.25	49.86		19,307,761.02	

ผค.บ.แม่กวางฯ : อาคารที่ทำการโครงการฯ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผค.บ.แม่ฮ่องสอน : โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า หากได้รับอนุญาต จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ เดือน

ผค.ส.๑ : อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า หากยังไม่ได้รับอนุญาต จะคืนเงินงบประมาณต่อไป

รายงานผล...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับ	หน่วยงาน	รวมที่จัดดำเนินการในปีงบประมาณ2563		ยกเลิก		ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผนแล้วเสร็จ		ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (ดำเนินการแล้ว 319 รายการ วงเงิน 1,173.25 ล้านบาท)								
										รับราคา		ลงนาม		สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
		จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (งาน)	วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น (%)	วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น (%)		
1	คป.เชียงใหม่	71	285.24	1	18.00			70	267.24			70	267.24	70	100.00	267.24	100.00	
2	คป.แม่ฮ่องสอน	25	132.75	2	17.00			23	115.75			23	115.75	23	100.00	115.75	100.00	
3	คป.ลำพูน	31	88.87	1	20.00			30	68.87			30	68.87	30	100.00	68.87	100.00	
4	คป.แม่ฮ่องฯ	53	130.40					53	130.40			53	130.40	53	100.00	130.40	100.00	
5	คป.แม่ฮ่อง	68	189.81			1	3.50	67	186.31			67	186.31	67	100.00	186.31	100.00	
6	คป.แม่ฮ่อง-แม่โจ้	51	107.49					51	107.49			51	107.49	51	100.00	107.49	100.00	
7	ศูนย์วิจัยห้องครัว	12	49.11					12	49.11			12	49.11	12	100.00	49.11	100.00	
8	โครงการก่อสร้าง สป.1	5	186.24					5	186.24	1	69.34	4	116.90	5	100.00	186.24	100.00	
9	สป.1	8	61.84					8	61.84			8	61.84	8	100.00	61.84	100.00	
	รวม	324	1,231.75	4	55.00	1	3.50	319	1,173.25	1	69.34	318	1,103.91	319	100.00	1,173.25	100.00	

รายงานงานที่ขอยกเลิก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ชื่องาน	ความคืบหน้า	งบประมาณ (บาท)
1	คป.แม่ฮ่องสอน	อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยห้อมระบบส่งน้ำและป้องกันน้ำ คสล. โครงการพัฒนาศูนย์ที่สูงแบบโครงการหลวงสมอ พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลสมอ อำเภอสมอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขอยกเลิกรายการ ตามบันทึก สป.๑/๓๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากผลการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งว่า โครงการดังกล่าว หากจะดำเนินการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านฉันทนาการใช้พื้นที่ส่วนน้ำชั้นที่ 1A ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนและใช้เวลานานในการจัดทำรายงานฯ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2563	9,000,000
2	คป.แม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงฝายห้วยฮั่น โครงการรักษาน้ำเพื่อระบบชลประทานฝายฝายน้ำแม่ละงา พื้นที่ 80 ไร่ ตำบลป่าหญา อำเภอสมบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขอยกเลิกรายการ ตามบันทึก สป.๑/๕๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก มีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามตรา 19 โดยดำเนินการลักษณะโครงการร่วม ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุมัติเข้าใช้พื้นที่ จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้	8,000,000
3	คป.เชียงใหม่	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านแม่แอน ตำบลห้วยทราย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ขอยกเลิกรายการ ตามบันทึก สป.๑/๓๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการคัดค้านจากคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านหนองปลาน้ำ หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ขอให้ระงับโครงการก่อสร้างไว้ก่อน เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และประชาชนบ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์จะได้ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการไปยังจุดที่เหมาะสมต่อไป	18,000,000
4	คป.ลำพูน	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 3,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านใหม่ท่าจักร ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	ขอยกเลิกรายการ ตามบันทึก สป.๑/๓๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก พื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของ บริษัทเอกชน (บริษัท เอส ที แอสเซท จำกัด) และบริษัทฯ ไม่ยินยอมให้แนวท่อส่งน้ำผ่านพื้นที่ ปัจจุบันกำลังพิจารณาหาแนวท่อส่งน้ำใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2563	20,000,000
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ				55,000,000

รายการที่ยังไม่ดำเนินการ/ไม่ลงนาม

ลำดับ	โครงการ	ชื่องาน / งบประมาณ	จ้างเหมา/ทำเอง	งบประมาณ (บาท)	วันที่โอนจัดสรร	ขึ้นงมผลการดำเนินงานปัจจุบัน
รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวม 1 รายการ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)				3,500,000		
1	คป.แม่ฮ่อง	ปรับปรุงสะพานคสล.ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.17+300 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลคองแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)	ดำเนินการเอง	3,500,000	27 มี.ค. 63	อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ	โครงการ	ชื่องาน / งบประมาณ	จ้างเหมา/ทำเอง	งบประมาณ (บาท)	วันที่โอนจัดสรร	ขึ้นงมผลการดำเนินงานปัจจุบัน
รายการที่ยังไม่ลงนาม รวม 1 รายการ				69,340,000		
1	โครงการก่อสร้าง 1	(51) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าดง (อ่างเก็บน้ำห้วยกอล) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตะเคียนปม อำเภอกู่หวี จังหวัดลำพูน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	69,340,000	23 เม.ย. 63	คาดว่าจะลงนาม 15 พ.ค. 63

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.2563		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										รวมทั้งสิ้น	
		รายการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ร.บ.2563		งบเพิ่มเติม 63 (โอนเปลี่ยนแปลง)		งบเพิ่มเติม 63 (งบอุดหนุน)		งบกลาง Covid-19		งบกลาง พ.ร.บ.2563		รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ ปีงบประมาณ (บาท)
				รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
1	คป.เชียงใหม่	64	272,838,500	63	225,901,619	7	12,400,000	1	430,000	-	-	2	6,046,555	73	244,778,174
2	คป.ลำพูน	31	88,873,000	30	63,851,771	-	-	-	-	-	-	-	-	30	63,851,771
3	คป.แม่ฮ่องสอน	25	132,750,000	23	91,424,125	-	-	-	-	-	-	1	6,500,000	24	97,924,125
4	คป.แม่ฮ่อง-แม่โจ้	48	101,501,700	48	96,427,135	2	5,870,000	-	-	-	-	-	-	50	102,297,135
5	คป.แม่ฮ่อง	67	186,312,000	67	176,528,966	1	3,500,000	-	-	-	-	-	-	68	180,028,966
6	คป.แม่ฮ่อง	53	130,395,000	53	121,194,006	-	-	-	-	-	-	-	-	53	121,194,006
7	ศูนย์ วิจัยห้องครัว	12	49,112,000	12	44,579,970	-	-	-	-	-	-	7	62,470,142	19	107,050,112
8	โครงการก่อสร้าง สป.1	5	186,240,000	5	162,947,701	-	-	-	-	2	62,141,700	1	48,456,500	8	273,545,901
9	ส่วนห้องจัดการ	1	1,465,000	1	1,435,700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,435,700
10	ส่วนแผนงาน	3	2,350,000	3	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,350,000
11	ส่วนบริหารทรัพยากร	1	14,520,000	1	8,302,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,302,400
12	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	3	43,500,000	3	43,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43,500,000
13	คำอำนาจการ สป.1	-	-	-	24,880,390	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	24,900,390
	รวมทั้งสิ้น	313	1,209,837,200	309	1,063,323,783	10	21,770,000	1	450,000	2	62,141,700	11	123,473,197	333	1,271,158,680

สรุปผลการจัดสรร...

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	จำนวน (รายการ)	พรบ.63 (บาท)	ได้รับจัดสรร		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละผลการเบิกจ่าย		ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
				จำนวนรายการ	(บาท)		เทียบ จัดสรร	เทียบ พรบ.	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	64	272,838,500	63	225,901,619	52,224,986	23.12	19.34	20.50
2	โครงการชลประทานลำพูน	31	88,873,000	30	63,851,771	20,390,120	31.93	23.35	31.22
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	25	132,750,000	23	91,424,125	21,619,845	23.65	16.40	19.60
4	โครงการฯ แม่แจ่ม-แม่จัต	48	101,501,700	48	96,427,135	19,609,703	20.34	20.30	28.13
5	โครงการฯ แม่แตง	67	186,312,000	67	176,528,966	13,040,459	7.39	7.71	4.96
6	โครงการฯ แม่กวง	53	130,395,000	53	121,194,006	27,754,200	22.90	22.10	21.56
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	12	49,112,000	12	44,579,970	5,545,282	12.44	11.29	4.62
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	5	186,240,000	5	162,947,701	21,595,086	13.25	11.60	2.34
9	สขป.1	8	86,715,390	8	80,468,490	9,349,588	11.62	5.66	2.98
รวมทั้งสิ้น		313	1,209,857,200	309	1,063,323,783	191,129,270	17.97	15.80	18.72

เป้าหมายเบิกจ่าย	มิ.ค. 63 ไตรมาส 2	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63 ไตรมาส 3	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63 ไตรมาส 4
เป้าหมาย กรมฯ	40.00	48.33	56.67	65.00	76.67	88.33	100.00
เป้าหมาย สำนัก	15.88	34.46	51.83	67.52	81.14	92.23	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ : ดำเนินการสรุปผลการเบิกจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น.

ผผง.ขป.๑ : เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งไว้ที่ร้อยละ ๕๖ ขอให้โครงการยืนยันเป้าหมายการเบิกจ่ายสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ผคป.เชียงใหม่ : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐

ผคป.ลำพูน : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕๐

ผคป.แม่ฮ่องสอน : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐

ผศร.ห้วยฮ่องไคร้ : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐

ผคบ.แม่แจ่ม-แม่จัต : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐


ผคบ.แม่แตง : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๐

ผคบ.แม่กวงฯ : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐

ผคส.๑ : ยืนยันการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐

ประธานฯ : เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ กรมตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่ร้อยละ ๖๕.๐๐ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามที่กรมกำหนด

กราฟผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

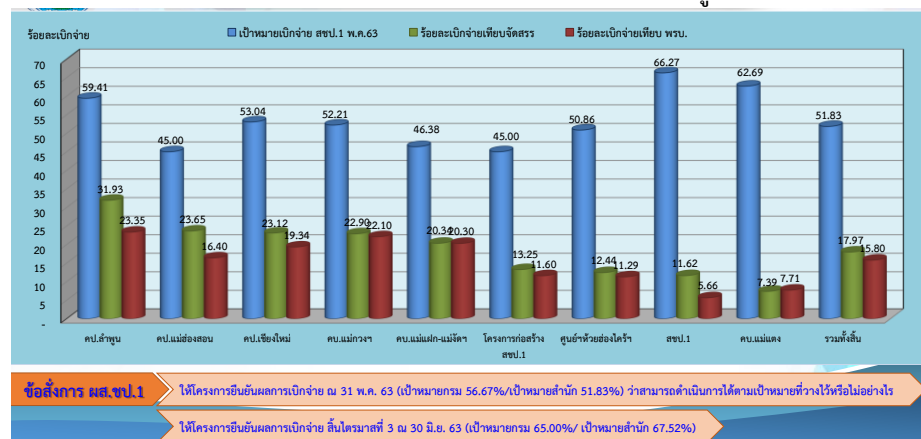

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบเพิ่มเติม๖๓ (โอนเปลี่ยนแปลง) ข้อมูลวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	%	หมายเหตุ
1	คป.เชียงใหม่	7	12,400,000	7	12,400,000	1,105,254	8.91	
2	คป.แม่แจ่ม-แม่จัต	2	5,870,000	2	5,870,000	-	-	
3	คป.แม่แตง	1	3,500,000	1	3,500,000	-	-	
งบลงทุน เพิ่มเติม 63		10	21,770,000	10	21,770,000	1,105,254	5.08	

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบเพิ่มเติม๖๓ (ไม่อยู่ในระบบติดตาม)

ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	%	หมายเหตุ
1	คป.เชียงใหม่	2	5,450,000	1	430,000	-	-	
2	คป.ลำพูน	2	12,056,000	-	-	-	-	
3	คป.แม่ฮ่องสอน	1	4,350,000	-	-	-	-	
4	คป.แม่แตง	1	6,000,000	-	-	-	-	
5	คป.แม่อาย	1	9,500,000	-	-	-	-	
6	โครงการก่อสร้าง สขป.1	1	40,000,000	-	-	-	-	
7	คำอำนวยการ สขป.1	-	-	-	20,000	-	-	
	งบลงทุน เพิ่มเติม 63	8	77,356,000	1	450,000	-	-	

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่าย งบกลาง Covid-๑๙ ปี ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	%	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง สขป.1	2	65,000,000	2	62,141,700	7,024,806	11	
	งบกลาง Covid-19 ปี 2563	2	65,000,000	2	62,141,700	7,024,806	11	

สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ก.ป.ร. ปี ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	รายการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	%	หมายเหตุ
1	คป.เชียงใหม่	6	40,500,000	2	6,046,555	5,074,188	83.92	
2	คป.แม่ฮ่องสอน	5	76,321,000	1	6,500,000	1,661,431	25.56	
3	โครงการก่อสร้าง สขป.1	1	48,800,000	1	48,456,500	-	-	
4	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	7	139,233,286	7	62,470,142	21,565,260	34.52	ได้รับการจัดสรรเพิ่มอีก 3 รายการ วงเงิน 44,855,019 บาท แต่ยังไม่ขึ้นในระบบ
	งบกลาง กปร.63	19	304,854,286	11	123,473,197	28,300,880	22.92	

สรุปผลมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนการจ้างแรงงาน		ผลการจ้างแรงงาน		ร้อยละผลการจ้างแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง (บาท)	จำนวนแรงงาน (%)	ค่าจ้างแรงงาน (%)	
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	1,290	91,332,437	923	15,991,752	71.55	17.51	
2	โครงการชลประทานลำพูน	573	24,011,600	327	6,572,707	57.07	27.37	
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	513	25,372,619	346	5,915,216	67.45	23.31	
4	โครงการฯ แม่ฮ่องสอน-แม่แจ่ม	467	45,399,500	402	10,001,423	86.08	22.03	
5	โครงการฯ แม่แตง	1,051	62,071,976	543	10,093,938	51.67	16.26	
6	โครงการฯ แม่ทา	771	48,595,496	452	9,527,481	58.63	19.61	
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	263	10,430,600	284	2,305,160	107.98	22.10	
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	483	39,184,272	130	3,243,888	26.92	8.28	
9	ส่วนแผนงาน	16	470,000	-	-	-	-	เริ่มจ้างแรงงานเดือน พ.ค. 63
10	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สขป.1	30	6,545,000	20	220,445	66.67	3.37	
	รวมทั้งสิ้น	5,457	353,413,500	3,427	63,872,010	62.80	18.07	

ประธานฯ : ตามสรุปผลมาตรการจ้างแรงงานฯ แผนการจ้างแรงงาน ๕,๔๕๗ อัตรา ผลการจ้างแรงงาน ๓,๔๒๗ อัตรา สามารถจ้างเพิ่มได้อีก ๒,๐๓๐ อัตรา ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจ้างแรงงานเพิ่มเติมด้วย

รายละเอียดโครงการที่เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูลวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564							
		*คำขอตั้งงบประมาณ		ว่าง พรบ. (10 พ.ค.63)		โครงการส่งยกลูก		ส่งกลับของแผนงาน (10 พ.ค.63)	
		รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	92	487,120,000	75	307,792,000	9	20,533,000	66	287,259,000
2	โครงการชลประทานลำพูน	61	236,301,000	46	197,152,000	1	65,000,000	45	132,152,000
3	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	22	96,372,000	21	74,700,000	1	9,000,000	20	65,700,000
4	โครงการฯ แม่แตง	63	156,234,000	60	102,734,000	1	3,500,000	59	99,234,000
5	โครงการฯ แม่งวงอุบลราชธานี	72	177,585,300	64	142,004,000			64	142,004,000
6	โครงการฯ แม่แจ่ม-แม่จัน	59	128,717,200	50	92,882,200			50	92,882,200
7	ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้	81	135,208,000	13	55,135,000			13	55,135,000
8	โครงการก่อสร้าง สขป.1	20	540,900,000	5	174,000,000			5	174,000,000
9	สำนักงานชลประทานที่ 1	13	89,152,000	10	82,970,000			10	82,970,000
	รวม	483	2,047,589,500	344	1,229,369,200	12	98,033,000	332	1,131,336,200

หมายเหตุ

๑. งบประมาณของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ยังไม่ได้รวมงบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณ ๓๗,๓๘๘,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ ๑ ยังไม่ได้รวมค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท

ข้อสั่งการ...

ข้อสั่งการ ผส.ขป.๑

งป พ.ร.บ. ๖๓

- ขอให้ตรวจสอบและคืนเงินเหลือจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้าย
- ให้โครงการตรวจสอบงานปี ๒๕๖๓ ทุกแหล่งงบประมาณ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งานดำเนินการเอง หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สามารถกันเงินค่าแรงและล่วงเวลาได้ โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เหลือด้วย

งปกลาง

งปกลาง กปร. ขอให้ดำเนินการลักษณะเดียวกับงบดำเนินการเอง.

งปกลาง ของสหพช. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

งป พ.ร.บ. ๖๔

- ขอให้โครงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบซึ่งงานให้ถูกต้องเพื่อลดภาระในการแก้ไขชื่อและประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ก็จะต้องเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นขอให้โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วย
- ขอให้โครงการ Revise ประมาณการ ปี ๒๕๖๔ ส่งส่วนแผนงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ปรับลดลง และเตรียมความพร้อมในทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๖๔

พ.ร.บ. ๒๕๖๔ จะเข้าวาระ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วาระ ๒ - ๓ วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศใช้ พ.ร.บ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประธานฯ : เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

๓.๔ การเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นายณัฐวุฒิ นากสุก ผวศ.ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสรุป ดังนี้

เสนอขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ

- ค่าศึกษาพิจารณาโครงการ
- ค่าสำรวจภูมิประเทศ
- ค่าออกแบบ
- ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา
- ค่าศึกษารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อน

กรอบวงเงิน งบ. ปี ๒๕๖๓

สขป.๑	วงเงิน	กรอบปี ๒๕๖๓	
ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ	๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๘๐ %	๒๐ %
		๑๑,๖๑๖,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐

จำนวน ๑๙๔ โครงการ ๓๑๔ รายการ

กรมฯอนุมัติ

	วงเงิน	กรอบปี ๒๕๖๓	
สขป.๑	๑๗,๒๑๐,๐๐๐	ศึกษา สำรวจ ออกแบบ	สำรวจปฐพีและธรณีวิทยา
		๑๓,๔๗๕,๔๐๐	๓,๗๓๔,๐๐๐

จำนวน ๒๒๔ โครงการ ๓๒๖ รายการ

วงเงินที่ได้รับ...

วงเงินที่ได้รับจัดสรร ณ 14 เม.ย.2563					
ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับปัจจุบัน	วงเงินคงค้าง	หมายเหตุ
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๒๐,๐๐๐	๐	
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕,๔๔๐,๔๐๐	๔,๓๘๗,๖๐๐	๑,๐๕๒,๘๐๐	
๓	ฝ่ายปฏิบัติการและธรณีวิทยา	๐	๓,๗๓๔,๖๐๐	๐	
๔	ฝ่ายออกแบบ	๖,๑๘๕,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑,๔๓๕,๐๐๐	
๕	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม	-	-	-	
๖	ฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๐	ยกเลิก ๑ งาน
	รวมทั้งสิ้น	๑๓,๕๗๕,๔๐๐	๑๑,๒๓๗,๖๐๐ (๘๓.๔๐) (๑๒,๙๖๖,๔๗๕)	๒,๔๘๗,๘๐๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๒	%	หมายเหตุ
๑	ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๑,๕๒๐,๐๐๐	๕๓๓,๕๘๓.๔๐	๓๕.๑๐	
๒	ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๕,๓๘๗,๖๐๐	๔๑๖,๘๗๕	๒๐.๙๐	
๓	ฝ่ายปฏิบัติการและธรณีวิทยา	๓,๗๓๔,๖๐๐	๔๒๓,๔๑๒.๓๕	๒๔.๗๓	
๔	ฝ่ายออกแบบ	๔,๗๕๐,๐๐๐	๒,๖๐๒,๐๔๖	๕๔.๘๐	
๕	ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม	-	ทดสอบเอง ๒๑๙ ตัวอย่าง ส่ง สวท. - ตัวอย่าง ทดสอบในสนาม ๔ โครงการ		
	รวม	๑๔,๓๙๒,๒๐๐	๔,๔๗๘,๙๑๖.๗๕	๓๑.๑๐	

๓.๕ การมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นายนิรุทธิ์ คำชัยวงศ์ นิติกรชำนาญการ รายงานการมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปได้ ดังนี้

การมอบอำนาจ

- มอบอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 - ตัวการ/ตัวแทน
 - สมัครใจทั้งสองฝ่าย
 - ประสงค์เพื่อประโยชน์ของผู้มอบ (ตัวการ)
- มอบอำนาจในการบริหารงานภาครัฐ
 - มอบอำนาจโดยผู้ที่มีอำนาจปฏิบัติ
 - ผู้รับมอบไม่สามารถปฏิเสธไม่ยอมรับการมอบอำนาจได้
 - ประสงค์เพื่อปฏิบัติให้ผูกพันตามอำนาจรัฐ

การมอบอำนาจในการบริหารงานภาครัฐ คือ การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ มีหลักกฎหมายในการมอบอำนาจ ๒ กลุ่ม

๑. กฎหมายทั่วไป

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐

๒. กฎหมายเฉพาะ

กฎ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดเรื่องการมอบอำนาจเฉพาะ

หลักเกณฑ์การมอบอำนาจของอธิบดี (กฎหมายหลัก)

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.๓๘
- พรฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๑๔
- หนังสือสำนักงาน กพร.ที่ นร ๑๒๐๐/ว.๔๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

หลักเกณฑ์การมอบ...

หลักเกณฑ์การมอบอำนาจของอธิบดี (กฎหมายเฉพาะ)

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 - ส่วนที่ ๓ ผู้มีอำนาจและการมอบอำนาจ
 - ข้อ ๖ ให้อำนาจในการมอบอำนาจกำหนดแล้ว แจ้งผู้รักษาการราชการตามระเบียบและแจ้ง สตง.
 - ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้รับมอบอำนาจมอบต่อ
 - ข้อยกเว้น ตามวรรค ๒
 - * มอบผู้ว่าราชการจังหวัด
 - * มอบอำนาจตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานอื่นตามข้อ ๖

ประธานฯ : ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกรณีการมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบว่าได้ดำเนินการไม่สอดคล้องกับระเบียบ ขอให้แก้ไขด้วย

ผศ.ห้วยฮ่องไคร้ : กรณีการลงนามในตราประมาณการ หาก ผอ.ศูนย์ ผอ.โครงการไปติดต่อราชการหรือลา ผู้รักษาการสามารถลงนามได้หรือไม่

ผบท.ขป.๑ : ฝ่ายบริหารฯ จะไปหาข้อมูลและทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติกรณีดังกล่าวต่อไป

๓.๖ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน

นายปฐม สุริยกานต์ ผบท.ขป.๑ รายงานการบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน สรุปได้ ดังนี้ กรมโดยกองพัสดุได้ดำเนินการโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจัดประชุมชี้แจง ผ่าน VDO Conference ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ถาวรที่มีใช้ครุภัณฑ์ พร้อมภาพถ่าย และมีบันทึกลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งกำหนดการให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานสำรวจสินทรัพย์ของ สขป.๑ และหน่วยงานในสังกัดและเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ และระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากติดโรคระบาดโควิด-๑๙ ต่อมา จึงมีบันทึกลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ และหน่วยงานในสังกัดส่งข้อมูลเอกสารเพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนการนำเข้าระบบสินทรัพย์ เช่น แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ (AC๑) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงาน สท.๓ รูปภาพสินทรัพย์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ตามกำหนดการจัดส่งเอกสาร โดย สขป.๑ มีบันทึกลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดส่งเอกสารตามกำหนดการ

ลำดับ ที่	วันที่	หน่วยงาน
1	30 มีนาคม 2563	สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง สขป.1
2	31 มีนาคม 2563	โครงการชลประทานเชียงใหม่
3	1 เมษายน 2563	โครงการชลประทานลำพูน
4	2 เมษายน 2563	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
5	3 เมษายน 2563	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
6	7 เมษายน 2563	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธาวา
7	8 เมษายน 2563	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัดสมบูรณ์ชล
8	9 เมษายน 2563	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

สขป.๑ ได้รับการประสานจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์ที่ ๓ ส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานการสำรวจสินทรัพย์ที่มีใช้ครุภัณฑ์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑ และหน่วยงานในสังกัด

การสำรวจสินทรัพย์ที่มีใช้ครุภัณฑ์ สขป.๑									
ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน สินทรัพย์	ผลการปฏิบัติงาน					กำหนดส่งเอกสาร	หมายเหตุ
			AC1	AC3	เพิ่มรูป ในระบบ asset	ส่งไฟล์ AC1	ส่งข้อมูล AC1 AC3 รูปสินทรัพย์		
1	สำนักงานเขตพื้นที่ 1		84	84	81	81		30-มี.ค.-63	รื้อถอน/ไม่มีรูปสินทรัพย์ 3 รายการ
2	โครงการชลประทานเชียงใหม่		56					31-มี.ค.-63	ยังไม่ส่งไฟล์ AC3
3	โครงการชลประทานลำพูน		10					1-เม.ย.-63	ทีมยังไม่ส่งเอกสารกลับ เนื่องจากหน่วยงานต้องส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมจึงได้รับการประสานจากหน่วยงานและส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
4	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน							2-เม.ย.-63	ได้รับเอกสารฉบับแก้ไขวันที่ 14 พ.ค. 63
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แตง							3-เม.ย.-63	ยังไม่ส่งเอกสาร
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่จางจุมธรา		13					7-เม.ย.-63	ได้รับเอกสารวันที่ 7 พ.ค. 63 มีหลายรายการที่รูปสินทรัพย์ไม่ครบ 4 รูป/ขาดเอกสารแนบที่แสดงวันที่ได้มา และมูลค่าของสินทรัพย์ยังไม่ได้ประสาน จนท.
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่ใจสมบุรณ์ชล		18					8-เม.ย.-63	ทีมยังไม่ส่งเอกสารกลับ เนื่องจากหน่วยงานต้องส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติม/ประสานเจ้าหน้าที่แล้ว/รอเอกสารเพิ่มเติม
8	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							9-เม.ย.-63	ยังไม่ส่งเอกสาร
9	โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่ 1							30-มี.ค.-63	รับเอกสารวันที่ 5 พ.ค. 63 ถึงที่ส่งมาไม่มีเพียง แบบฟอร์ม AC1 และรูปสินทรัพย์
	รวม	0	181	84	81	81		0	

ณ 14 พ.ค. 63

ในการนี้ สขป.๑ มีบันทึกลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดส่งเอกสารเนื่องจาก ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการจัดส่งเอกสารตามแผนที่กองพัสดุกำหนด และ สขป.๑ ร่วมกับกองพัสดุ จัดให้มีการประชุมผ่าน Video Conference การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารฯ จึงขอให้หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ และโครงการฯ แม่แตง) แจ้งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาแต่ละพื้นที่นำแบบ ACT ๑ ไปลงข้อมูลและส่งแบบข้อมูลทั้งหมดให้กองพัสดุโดยด่วนต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑. การบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

ประธานฯ : เนื่องจากมีการบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ แม่แตง โครงการฯ แม่จางฯ และโครงการฯ แม่แฝก-แม่ใจฯ โดยเฉพาะเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างถนนโดยโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินการเองหรือมอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมทางหลวงชนบทดำเนินการ

ผศบ.แม่จางฯ : โครงการฯ แม่จางฯ ได้ดำเนินการแก้ไขการบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการทำเสาปักป้ายแสดงเขตชลประทานความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร

ผศบ.แม่แฝก-แม่ใจฯ : เห็นด้วยกับ ผศบ.แม่จางฯ สำหรับการกำหนดมีความเห็นว่าการอุปท.อาจจะเล็งเห็นความสำคัญของถนนสายใหญ่มากกว่า

ประธานฯ : มอบแต่ละโครงการที่มีกรณีการบุกรุกที่ราชพัสดุ จัดทำประมาณการงานซ่อมแซมหลักเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยหลักเขตต้องมีขนาดใหญ่และเห็นเด่นชัด ทั้งนี้ หากบางพื้นที่สามารถสร้างเป็นถนนได้ ก็ให้สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การดำเนินงานงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๘

นายปฐม สุริยกานต์ ผบ.ท.ขป.๑ รายงานการดำเนินงานงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๘ โดยสรุป ดังนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา...

วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๘ ปี วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมจึงมีแนวคิดจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๘ ขึ้น โดยได้ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำบูธนิทรรศการเสมือนจริงเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ๑๑๘ ปี ในการนี้ สขป.๑ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๘ ประกอบด้วย ผส.ขป.๑ เป็นประธาน รอง ผส.ขป.๑ ผศร.หัวยฮ่องไคร้ ผคบ.แม่กวางฯ เป็น รองประธาน และ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน โดยได้เลือกบูธแบบ A ซึ่งประกอบด้วยโปสเตอร์ ๔ แผ่น และคลิปวิดีโอ ๑ เรื่อง ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานในสังกัดและฝ่ายบริหารฯ ได้ออกแบบจัดทำโปสเตอร์และคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตามแนวคิดของคณะทำงานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


โปสเตอร์ ๑



โปสเตอร์ ๒




โปสเตอร์ ๓

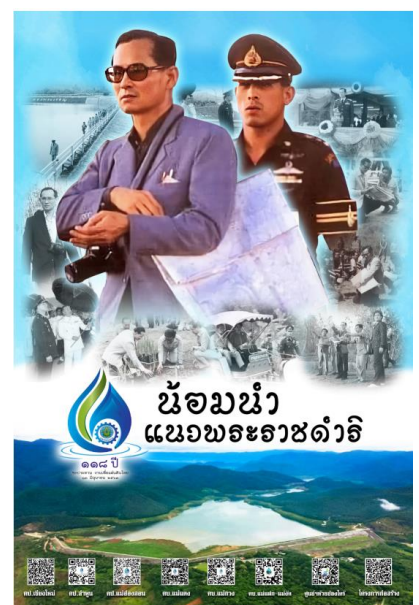

โปสเตอร์ ๔



คลิปวิดีโอ



รอง ผส.ขป.๑ : ขอให้เพิ่มเติมจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ในรูปมือนัดด้านซ้ายของคลิปวิดีโอ

ประธานฯ : ท่าน ธรรม.กำหนดเป้าหมายให้บุคลากรกรมชลประทานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทางเว็บไซต์ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป จึงขอให้ ผอ.ส่วน ผศร. ผอ.โครงการ ส่งการให้บุคลากรในสังกัดเข้าเยี่ยมชมให้ได้มากกว่า ๘๐% โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และมอบ ผบท.ขป.๑ ทำบันทึกขอความร่วมมือต่อไป

๕.๒ การลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Attendance System – DAS) สำหรับ บุคลากรกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home)

นายปฐม สุริยกานต์ ผบท.ขป.๑ รายงานการลงเวลาปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Attendance System – DAS) สำหรับบุคลากรกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) โดยสรุป ดังนี้ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สบค ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) ใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System -DAS) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งฝ่ายบริหารฯ ได้มีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการพร้อมแนบคู่มือการใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว

วศ.พก.๑ : สพก.๑ มีงานในความรับผิดชอบได้แก่ ๑) งานค้นหาน้ำประทุรกายน้ำแม่สอย ความก้าวหน้างาน ๘๘% ช้ากว่าแผน ๑% ๒) งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลม ความก้าวหน้างาน ๔๔.๑๖% ๓) งานอ่างเก็บน้ำแม่नावง ความก้าวหน้างาน ๑.๑๐% ช้ากว่าแผน ๗%

ผสญ.๑ : ความก้าวหน้าในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๔ สัญญา คิดเป็น ๕๐% ถ้าช้ากว่าแผน ๓๑% คาดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ จะดำเนินการได้ประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร สำหรับงานระบบระบายน้ำแม่แดง แม่ขาน เป็นงานจ้างเหมา ๒ ปี จะดำเนินการปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ประธานฯ : - หากไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙ แล้ว จะนัดประชุมประจำเดือน สัปดาห์แต่ละหน่วยงานในสังกัดต่อไป

- มอบหมายฝ่ายบริหารฯ หากมีประชุม Video Conference จากกรม ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังและบันทึกเทปด้วย

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.

(นางสาวลินจง คงตั้งมั่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม
